資料番号 3

令和 4 年 2 月 14 日 課 名 土木建築局技術企画課 担当者 課長 木村 内 線 3852

# 平成30年7月豪雨に係る災害復旧事業等の進捗状況について

#### 1 要旨・目的

平成30年7月豪雨により甚大な被害が発生した公共土木施設の災害復旧事業について,進捗状況と見通し等について報告する。

#### 2 現状・背景

平成30年7月豪雨災害からの復旧・復興については、被災された住民の皆様の日常が 一日も早く回復するよう、「平成30年7月豪雨災害からの復旧・復興プラン」に基づき、 最優先で取り組んでいる。

#### 3 概要

#### (1) 対象者

被災された県民・事業者等

## (2) 事業内容

平成30年7月豪雨により甚大な被害が発生した公共土木施設2,550箇所の災害復旧事業と、三篠川や主要地方道呉環状線などの改良復旧事業に取り組む。

#### (3) 進捗状況

#### ア 災害復旧事業

災害復旧事業については、改良復旧事業等により実施する箇所を除いた 2,523 箇所の令和4年1月末時点での進捗状況は表1のとおりである。

なお、建設事業者の手持ち工事量が増大している中、昨年の豪雨により早急に対応 が必要な箇所が生じたことなどから、今年度末までの完成は全体の約9割となる見 込みである。

#### イ 改良復旧事業

改良復旧事業については、令和5年度中の事業完了を目指しており、令和4年1 月末時点での進捗状況は表2のとおりである。

# 表 1 災害復旧事業の進捗状況

(単位:箇所)

<u></u>			(単位:箇所	
	災害復旧事業被災箇所数(査定決定ベース)			
建設事務所(支所)等		to (1 ) do		
		契約済	完成	
西部	462	462	342	
呉	219	219	166	
廿日市	11	11	11	
安芸太田	29	29	29	
東広島	515	515	340	
東部	450	450	442	
三原	457	457	417	
北部	141	141	139	
庄原	236	236	183	
広島水道	3	3	3	
全体	2,523	2,523	2,072	
(改良復旧事業等により実施する 箇所を除く)		(100%)	(82%)	
(全体) (改良復旧事業等を含む)	(2,550)	(2,544)	(2,084)	

<sup>(※1)</sup>公告または指名通知済のもの。

# 表 2 改良復旧事業の進捗状況

-	事業名	進捗状況(予定を含む)			
区分		用地	工事(工事数量に対する割合)		完了目標
71		ли	契約	完了	
道路	主要地方道 呉環状線 【災害関連事業】	境界立会: 100% 用地取得: 20% (工事施工承諾含み100%)	護 岸 工:100% 法 面 工:100% 橋梁下部工:100% 橋梁上部工:100% 舗 装 工: 0%	護 岸 工: 86%   法 面 工: 61%   橋梁下部工: 0%   橋梁上部工: 0%   舗 装 工: 0%	令和4年度中
河三	沼田川及びその支川 【河川激甚災害対策 特別緊急事業】	境界立会: 100% 用地取得: 100%	護 岸 工: 60% 掘 削 工: 82% 築 堤 工: 100% 堰改築工: 100%	護 岸 工: 46% 掘 削 工: 80% 築 堤 工: 72% 堰改築工: 0%	令和4年度中
	三篠川 【災害復旧助成事業】	境界立会: 99% 用地取得: 80%	護 岸 工: 61%	護 岸 工: 27%	令和5年度中
砂 防	ひよき川 【災害関連事業】	境界立会:100% 用地取得:100%	渓流保全工:100% 橋 梁 工:50%	渓流保全工: 38% 橋 梁 工: 0%	令和4年度中

#### (4) 予算(国庫)

災害復旧事業 : 21,935 百万円 (繰越予算)

5,695百万円(令和3年度9月補正)

改良復旧事業 【 具環状線】 : 608 百万円 ( 繰越予算 )

" 【三篠川】 : 3,490 百万円(令和3年度当初予算)" 【沼田川】 : 1,050 百万円(令和2年度2月補正)

" 【ひよき川】 : 178 百万円 (繰越予算)

#### (5) 今後の対応

完成が令和4年度にずれ込む見込みとなった箇所については、事業の進捗を図ることを目的に、事務所と連携して、工事の稼働状況を詳細に把握し、関係団体等を通じて手持ち工事量が比較的少ない地域から技能労働者や下請業者の確保が困難な地域への下請参加の協力要請を行うとともに、省力化が図られるコンクリート二次製品の更なる活用や工期短縮に資する工法への変更など、引き続き、必要な対策を講じながら早期完成に向けて取り組む。

#### 《令和4年1月に完成した災害復旧事業の一例》



(砂) 久筋川(呉市川尻町)



(一) 宇根川(府中市上下町)

#### (参考 改良復旧事業の進捗状況の詳細)


#### (1) 主要地方道 呉環状線 災害関連事業

主要地方道呉環状線については、現在、用地取得を積極的に進めるとともに、工事については令和4年1月末時点で護岸工が約9割、法面工が約6割完了している。

また,護岸工が完成した一部区間については,道路拡幅工事を完成させ部分供用を行っている。

現在進めている,法面や橋梁工事等については,引き続き,適切な工程管理等を行い,令和4年度中の完成を目指し事業執行を図る。

#### 《主要地方道 呉環状線【災害関連事業】の進捗状況》

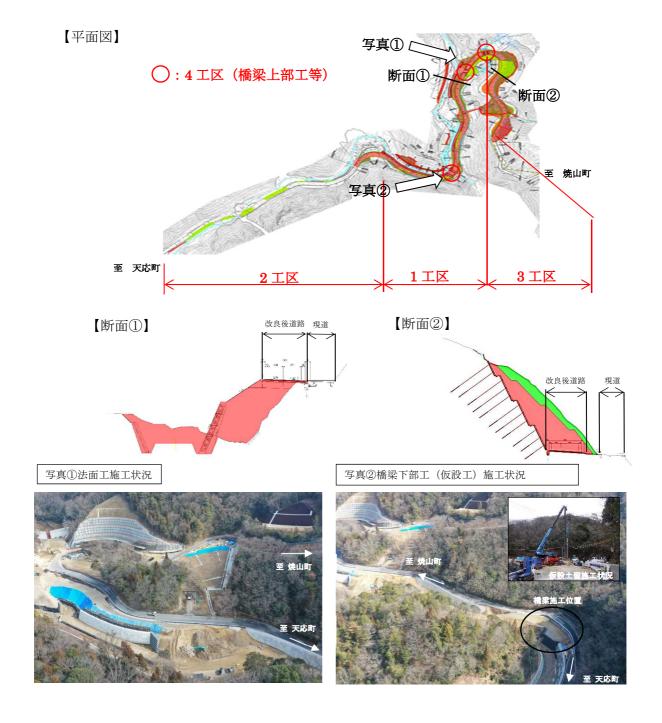

#### (2) 沼田川及びその支川 河川激甚災害対策特別緊急事業

沼田川及びその支川については、沼田川本川では茶山涯頭首工の堰改築や河道掘削、支川 の菅川及び仏通寺川では築堤、天井川では護岸のかさ上げなどの工事を順次進めており、令 和4年1月末で護岸工が約5割,築堤工が約7割完了している。

なお、令和4年出水期までに、菅川及び天井川の工事が完了見込であり、沼田川及び仏通 寺川については、引き続き、各工区の適切な工程管理等を行い、令和4年度中の完成を目指 し事業執行を図る。

沼田川 河川激甚災害対策特別緊急事業 事業延長 L=15.9km 沼田川 L=8.0km 沼田川 R3年度 工種 実施内容 護岸丁 20% 堰改築 8% 河道掘削 掘削工 79% 77% 菅川 L=0.8km 擁壁工 菅川 R3年度 工種 実施内容 契約 100% 75% 築堤 築堤工 築堤工 仏诵寺川 R3年度 実施内容 工種 河道掘削 契約 改築 護岸工 97% 97% 仏通寺川 L=4.8km 河道掘削 施設撤去 100% 掘削工 100% 築堤 擁壁工 / 河道掘削 築堤工 100% 71% 橋脚保護 天井川 梨和川 L=2.0km 築堤工 工種 Hongo 契約 完了 実施内容 護岸工 100% 51% 護岸かさ上げ 背割堤 **⟨**□2 改築 堰撤去 二原 河道掘削力 ◆→ 天井川 L=0.3km 取水工 Mihara 茶山涯堰改築 7(1) R3年度 擁壁工 実施内容 契約 河道掘削 掘削工 100% 100% 堰撤去 擁壁工 事業イメージ図 家屋浸水被害を解消 家屋浸水被害 ▽被災水位 築堤 1 擁壁工

(護岸かさ上げする場合を含む)

《沼田川【河川激甚災害対策特別緊急事業】の進捗状況》



🦶 河道掘削




#### (3) 三篠川 災害復旧助成事業

三篠川については、改良復旧を予定している全5区間において、用地取得を進めるとともに、築堤・護岸整備や河道拡幅、河道掘削などの工事を順次進めており、令和4年1月末で護岸工が約3割完了している。


引き続き,関係者に丁寧な説明を行うとともに,適切に工程管理等を行い,計画的に事業 執行を図る。

## 《三篠川【災害復旧助成事業】の進捗状況》

#### 【平面図】

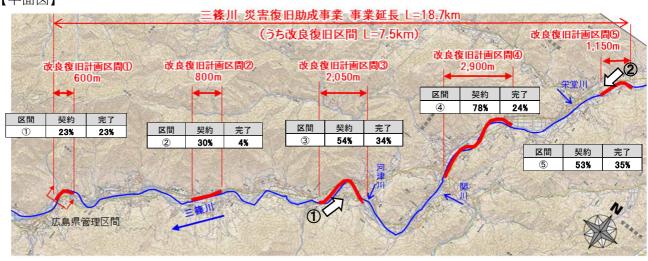

事業イメージ図





#### (4) ひよき川 砂防施設災害関連事業

ひよき川については、渓流保全工の契約を完了し、順次工事に着手しており、令和4年1 月末で約4割完了している。残る橋梁工の一部についても3月中の契約を予定している。 現在、他地域からの施工業者に加え、他県の下請け業者も活用しており、引き続き、各 工区の適切な工程管理等を行い、令和4年度中の完成を目指し事業執行を図る。

## 《ひよき川【災害関連事業】の進捗状況》

# 【平面図】 ひよき川 災害関連事業 L=770m 1工区 (工事着手済) 3 工区 (工事着手済) 2工区(工事着手済) 写真① 東広島バイパス 断而② 写真② 断面① 断面② 断面① 現河川 現河川 渓床勾配の緩和 - 河道の拡幅 写真② 写真(1)
