



庄原ダムニュース

VOL.10 平成27年6月
北部建設事務所庄原支所
庄原ダム建設事業課

コンクリート打設量が 7割に達しました

ダム本体工事のダム本体コンクリート打設量が、7割に達しました。

また、左の写真に掲げた関連工事も順調に進んでおります。今年度末の完成に向け、今後も安全第一で工事を継続してまいりますので、引き続きよろしくお願いたします。



平成27年5月26日撮影

①取水放流設備工事

- ・ダム湖の水を取水して放流する設備の工事です。
- ・取水ゲートの工事をしています。



平成27年6月4日撮影

②付替林道工事

- ・林道の付替工事です。
- ・掘削・法面工事をしています。



平成27年6月3日撮影

③監視制御設備工事

- ・ダムを監視するための機器を整備する工事です。
- ・今後、管理棟内に機器を搬入・設置します。



平成27年6月3日撮影

④多重無線工事

- ・無線設備を整備する工事です。
- ・今後、伐採箇所に鉄塔を建設します。




鉄塔のイメージ図

平成27年6月4日撮影


ダム本体コンクリート打設 進捗状況

堤体上流面図 (ダムを上流から見た図)

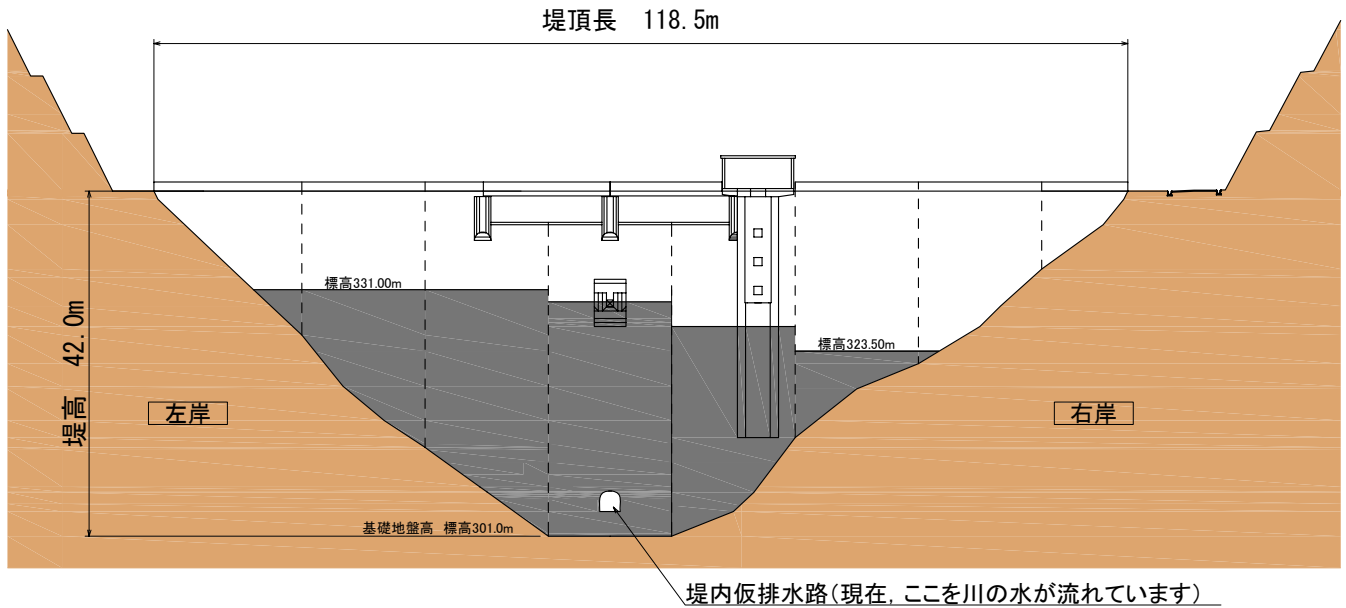

堤体断面図 (ダムの中央部を右岸から見た図)

凡例
打設済み範囲

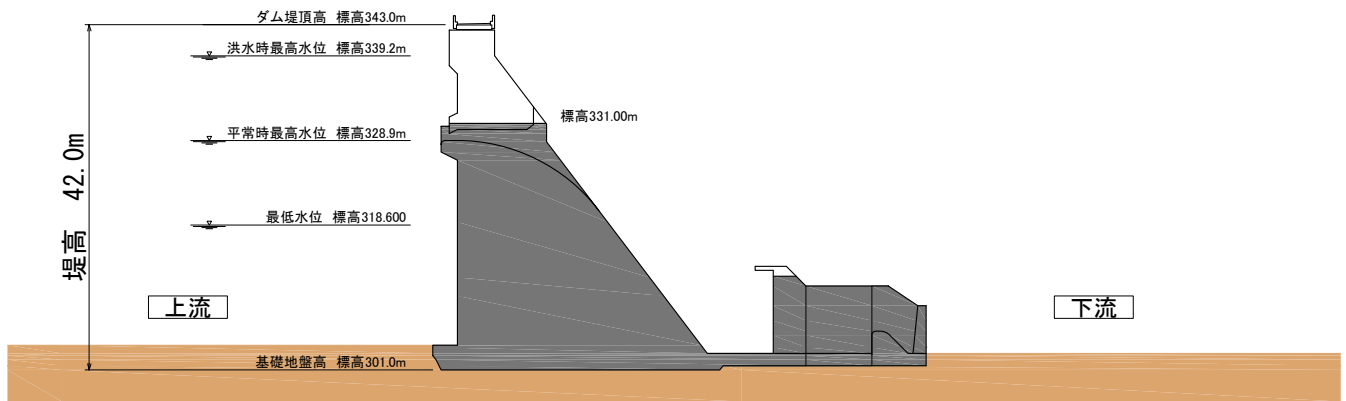

打設量と進捗率

	体積	進捗率
打設量	31,400m ³	73.4%
計画量	42,800m ³	

(備考) コンクリート打設の進捗率です。工事全体の進捗率ではありません。

平成27年6月11日
打設分まで
