



庄原ダムニュース

VOL.11 平成27年7月
北部建設事務所庄原支所
庄原ダム建設事業課



平成27年5月26日撮影

**付替林道 もう少しで
ダム本体に接続**

付替林道の工事が順調に進んでいます。
ダム本体との接続まで残り50mとなりました。今秋以降、
残りの区間の掘削工事と、全線の舗装を行います。
今年度末の完成に向け、今後も安全第一で工事を継続して
まいりますので、引き続きよろしくお願いたします。

工事進捗状況 ～展望台から見た林道～

平成27年2月23日撮影



平成27年3月13日撮影



5ヶ月後

4ヶ月後

平成27年7月10日撮影




平成27年7月10日撮影



ダム本体コンクリート打設 進捗状況

堤体上流面図

(ダムを上流から見た図)

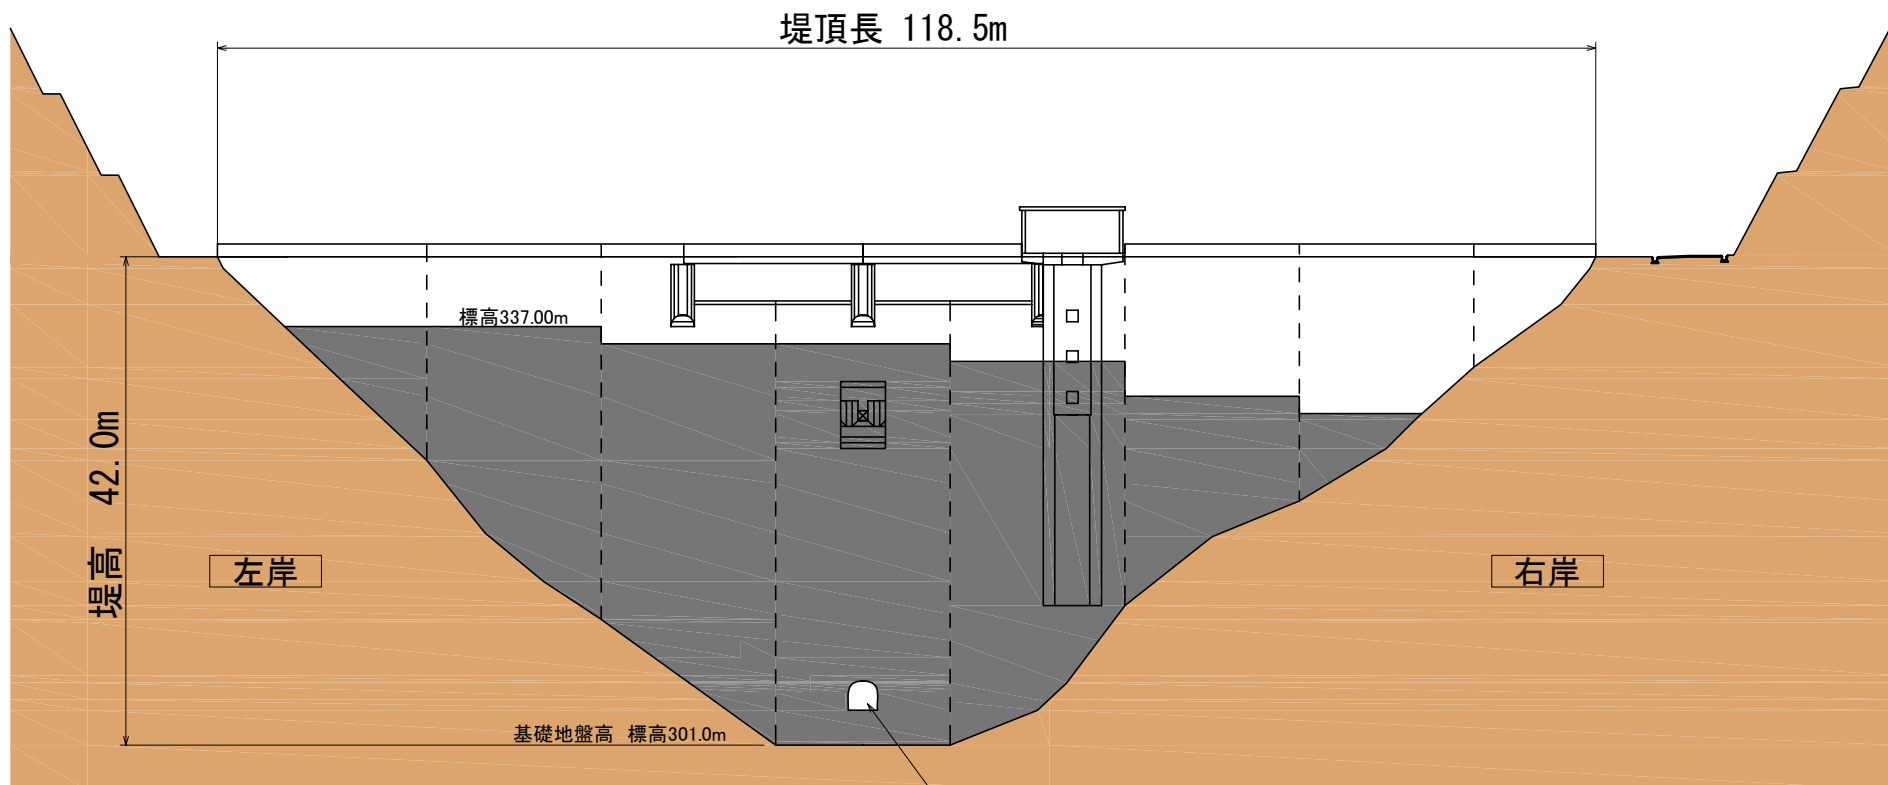


堤体断面図

(ダムの中央部を右岸から見た図)

凡例

打設済み範囲

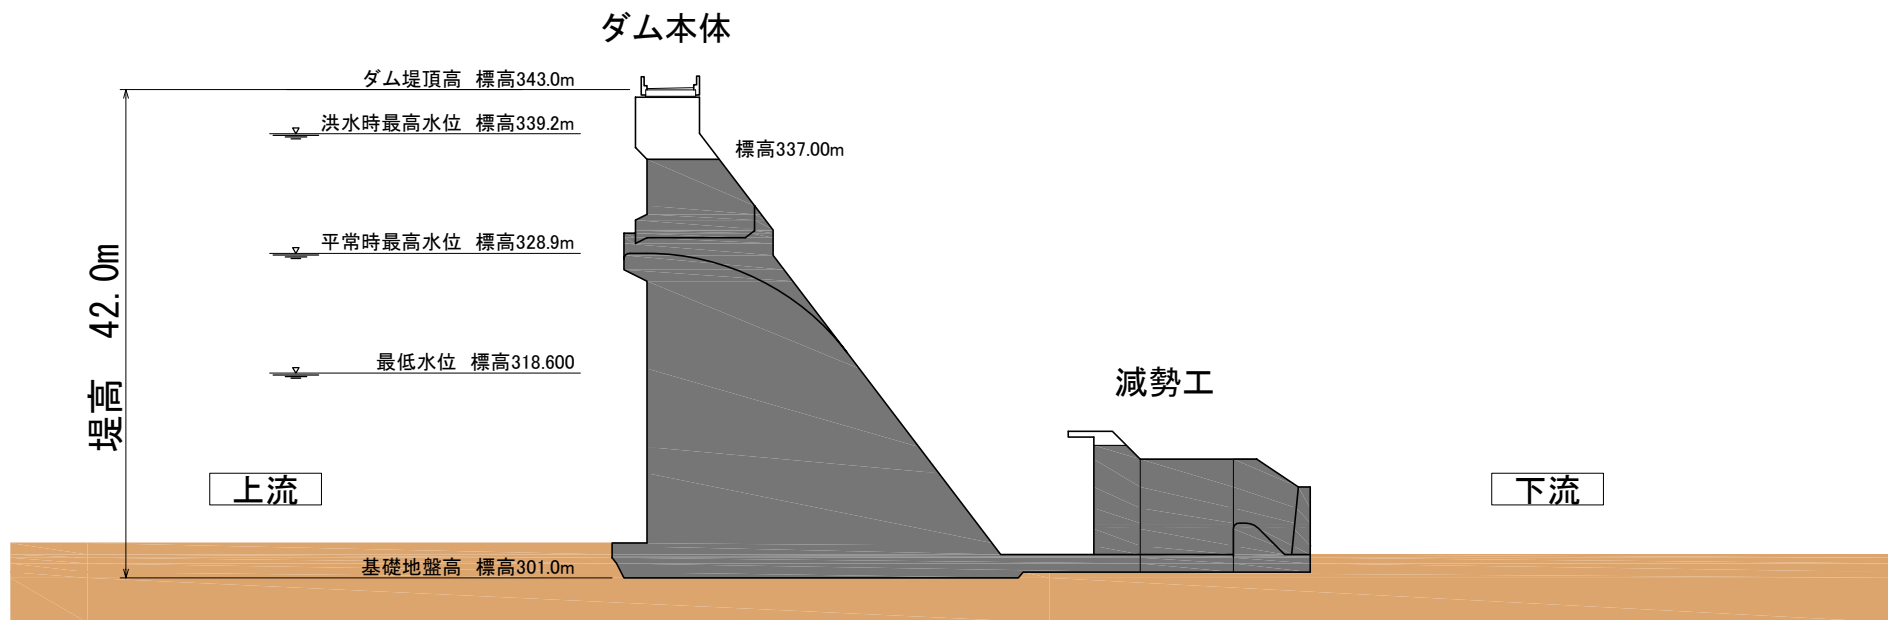

打設量と進捗率

	体積	進捗率
打設量	37,400m ³	87.4%
計画量	42,800m ³	

(備考) コンクリート打設の進捗率です。工事全体の進捗率ではありません。

平成27年7月27日
打設分まで
