



庄原ダムニュース

VOL.12 平成27年8月
北部建設事務所庄原支所
庄原ダム建設事業課



平成27年8月6日時点 **38,700m³ (90%) 打設**

コンクリート打設量が
90%に達しました

昨年8月から開始した、ダム本体コンクリート打設の打設量が8月6日で90%に達しました。

10月には、すべてのコンクリート打設が完了する見込みです。今年度末の完成に向け、今後も安全第一で工事を継続してまいりますので、引き続きよろしくお願いたします。

工事進捗状況 ～多重無線工事～


- ・ダムへの流入量等のデータを、庄原支所や県庁に送るための、無線設備を整備する工事です。
- ・ダム管理事務所敷地内に建設していた鉄塔が完成しました。
- ・鉄塔にはアンテナのほか、雨量計や風速計などが設置されます。



ダム本体コンクリート打設 進捗状況

堤体上流面図

(ダムを上流から見た図)

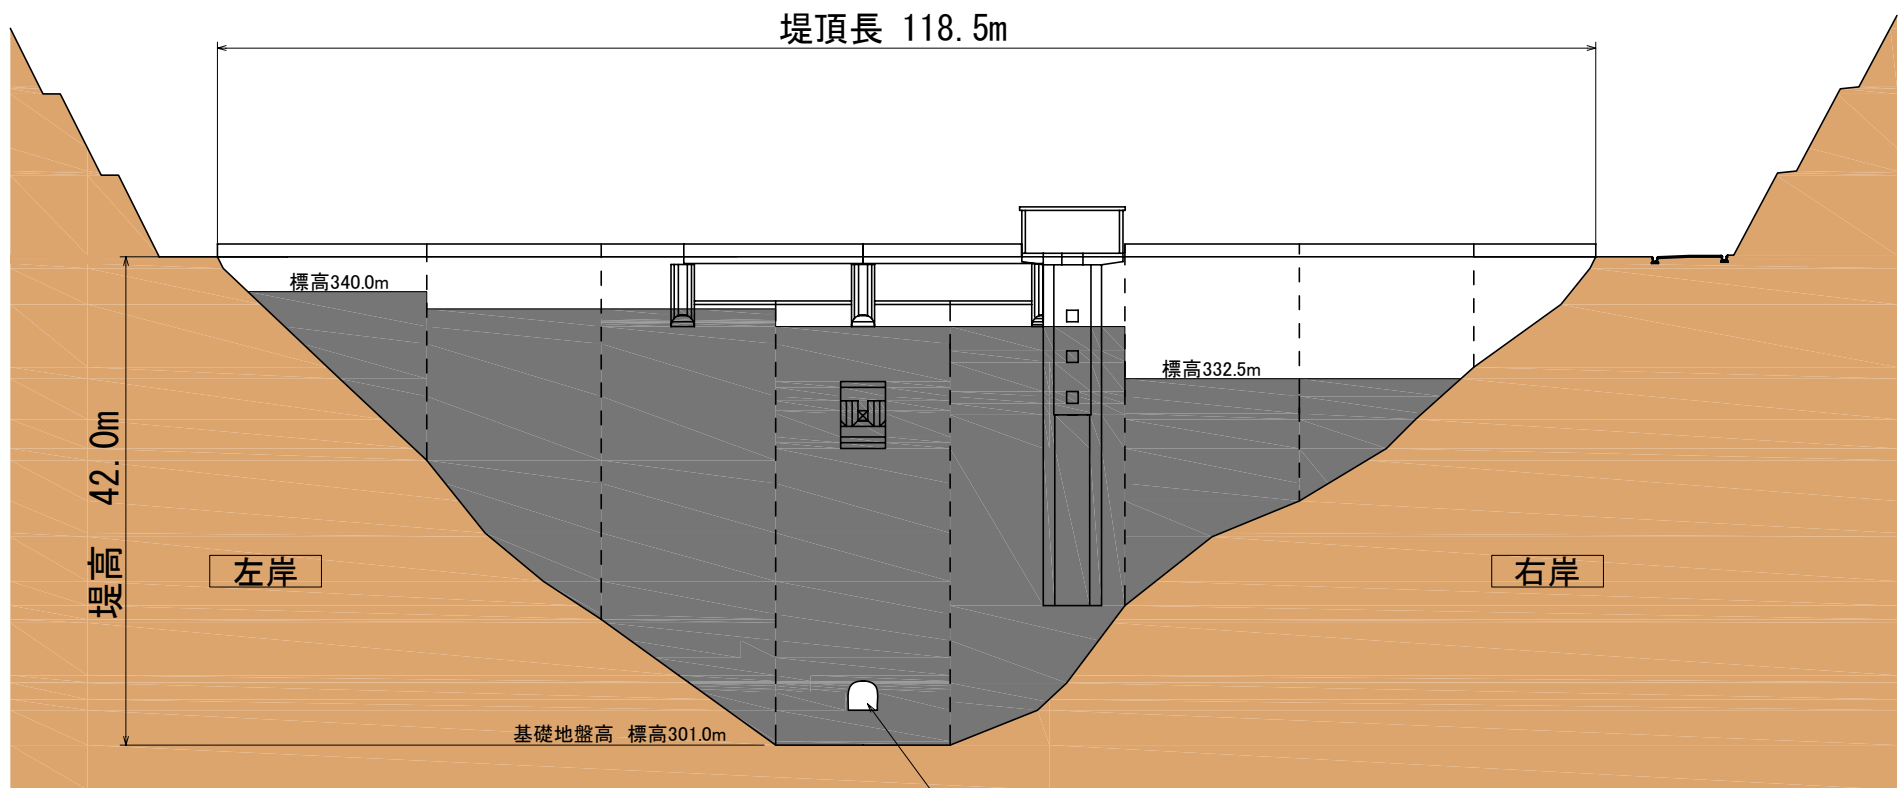


堤体断面図

(ダムの中央部を右岸から見た図)

凡例

打設済み範囲

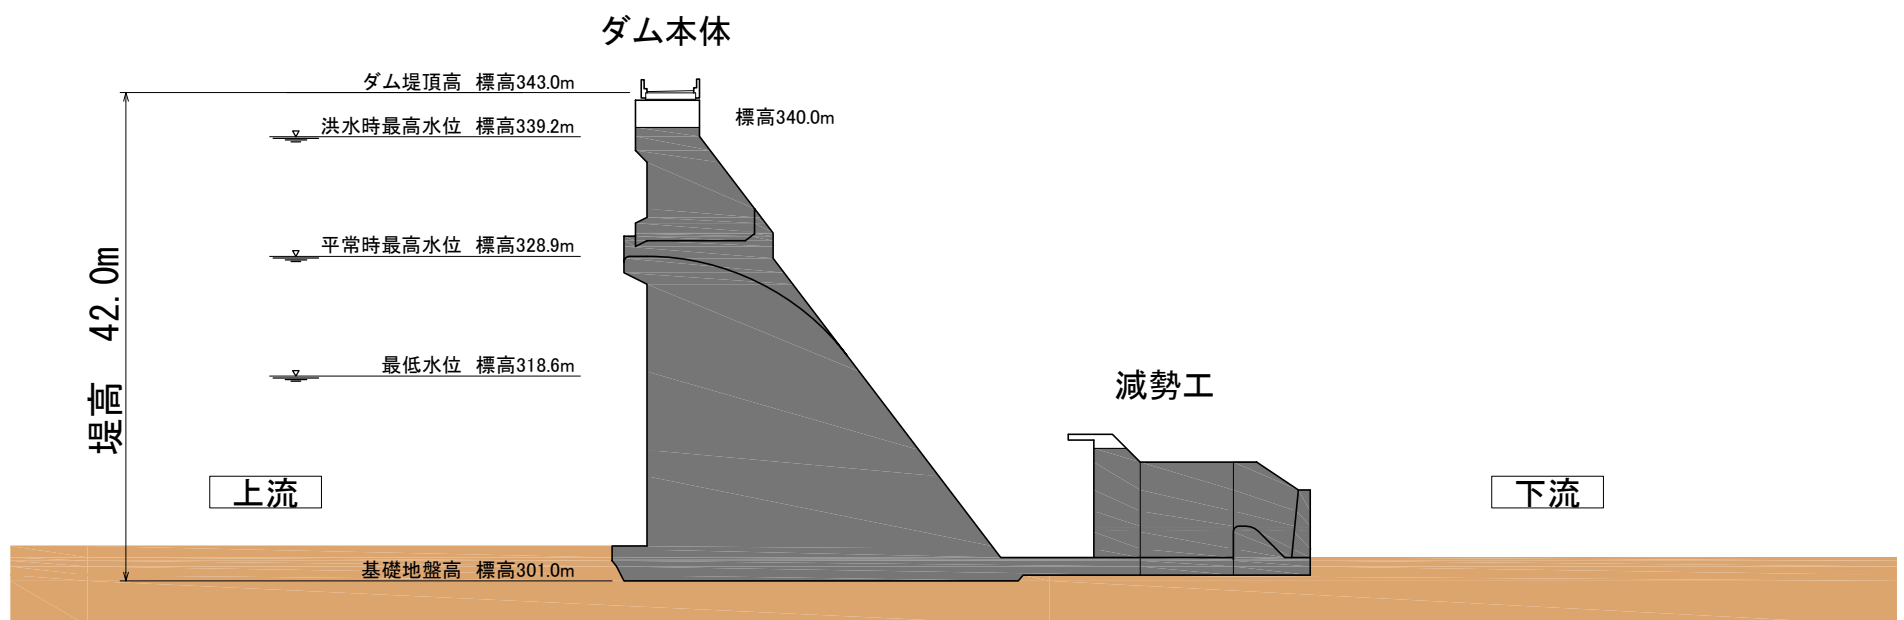

打設量と進捗率

	体積	進捗率
打設量	39,100m ³	91.4%
計画量	42,800m ³	

(備考) コンクリート打設の進捗率です。工事全体の進捗率ではありません。

平成27年8月17日
打設分まで
