

庄原ダムニュース

VOL.13 平成27年10月
北部建設事務所庄原支所
庄原ダム建設事業課

来週、コンクリート打設が完了します

いよいよダム本体コンクリートの打設作業が完了します。最終打設を10月19日に予定しています。
その後は、天端橋梁の架設や堤頂道路工を実施します。
今年度末の完成に向け、今後も安全第一で工事を継続してまいりますので、引き続きよろしくお願いたします。

▼右岸は残り1.5mです


▼左岸は9/28に標高343.0mに到達しました



平成27年10月9日撮影

平成27年10月7日時点 **42,400m³ (99%) 打設**


今後の工事内容

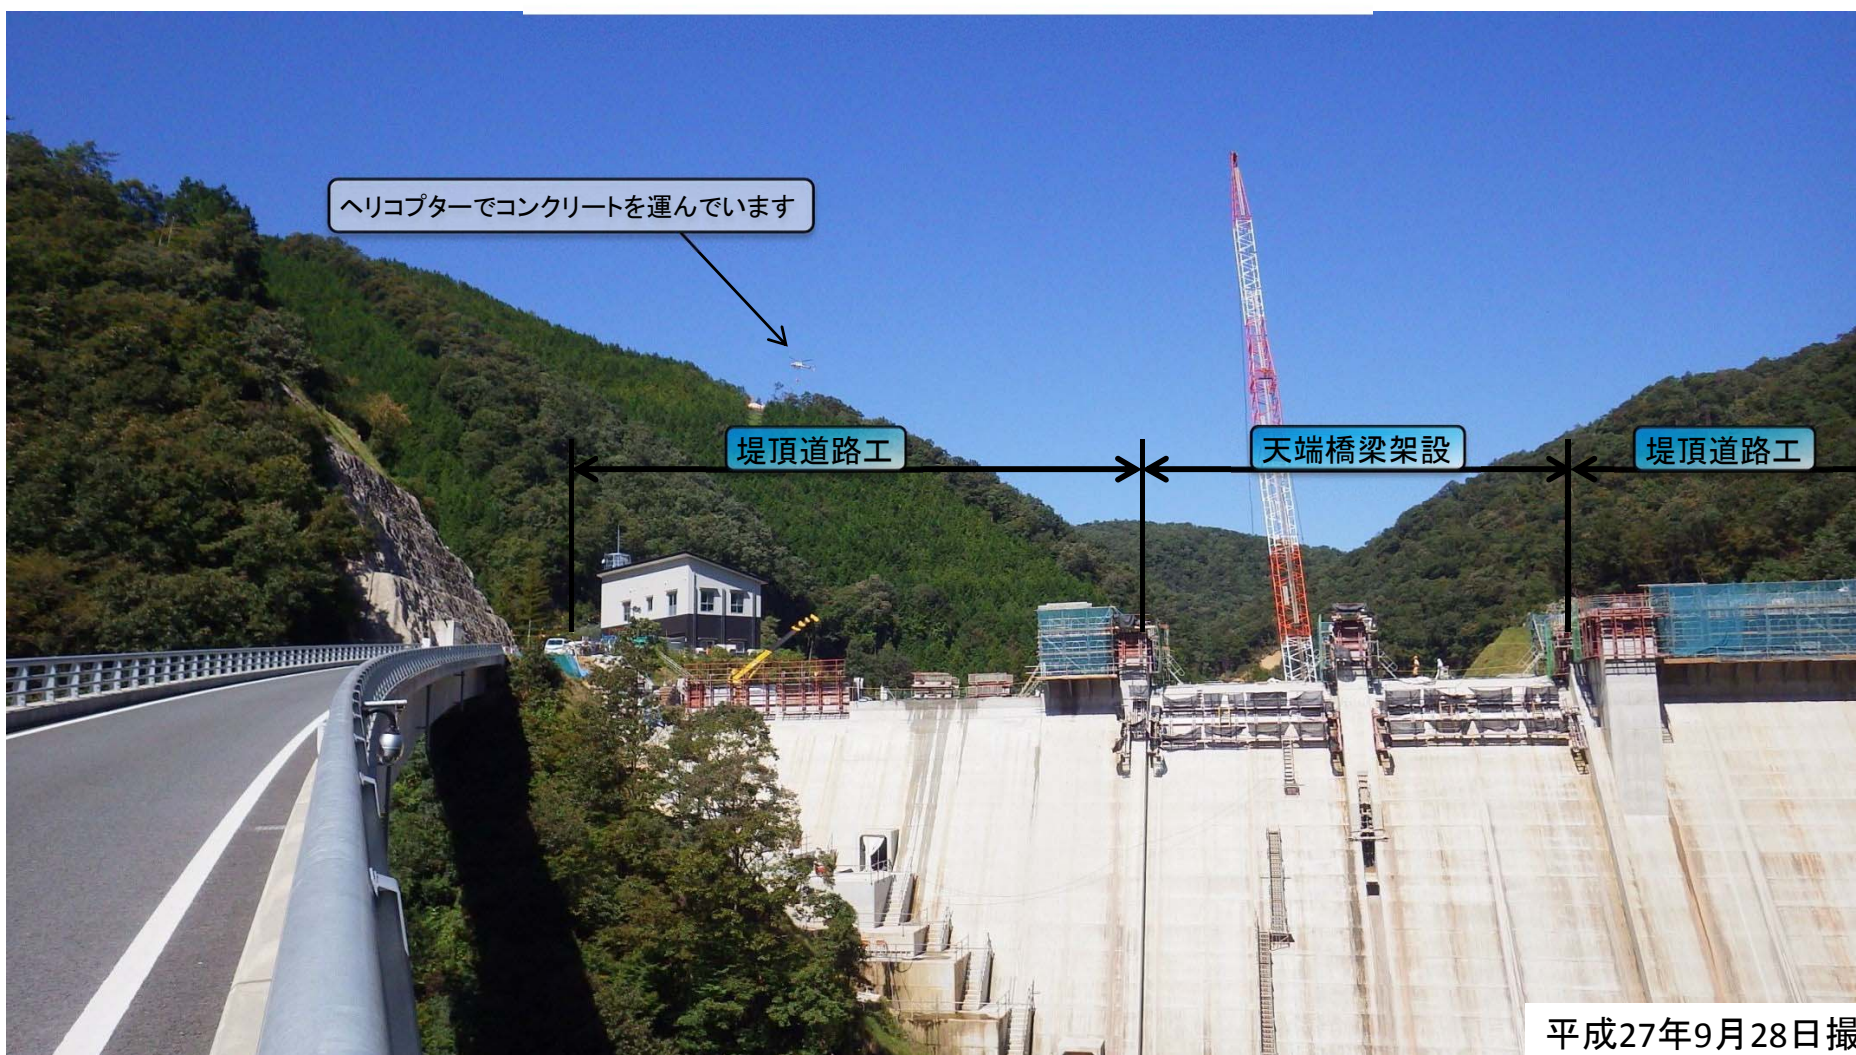

平成27年9月28日撮影

ダム本体コンクリート打設 進捗状況


堤体上流面図 (ダムを上流から見た図)

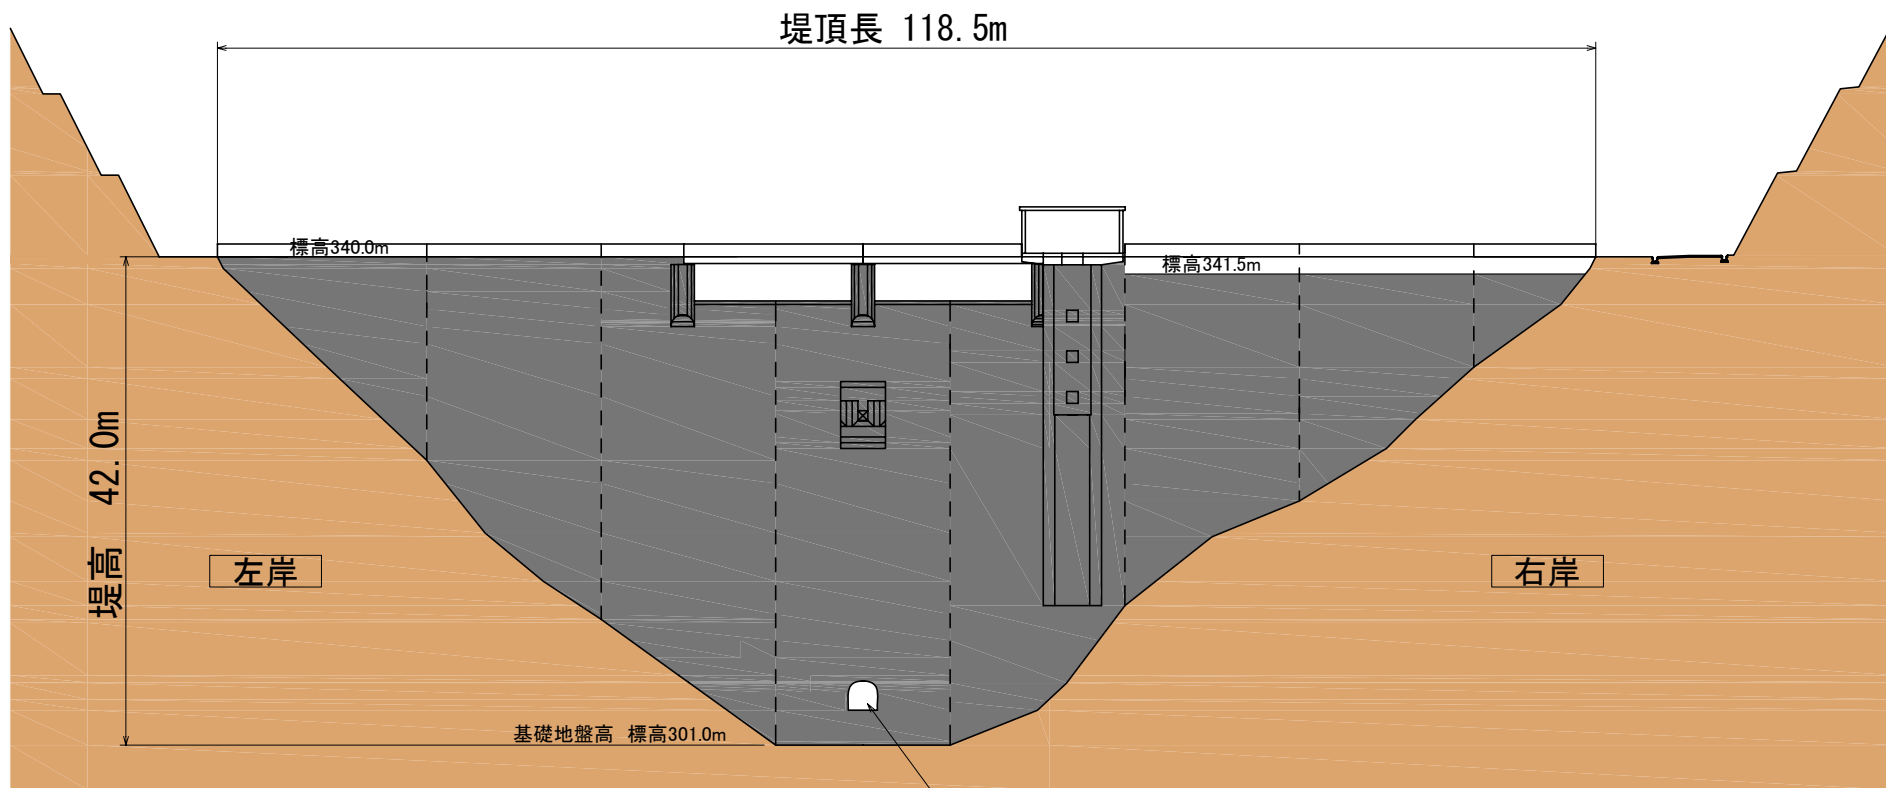

堤内仮排水路(現在, ここを川の水が流れています)

堤体断面図 (ダムの中央部を右岸から見た図)

凡例
■ 打設済み範囲

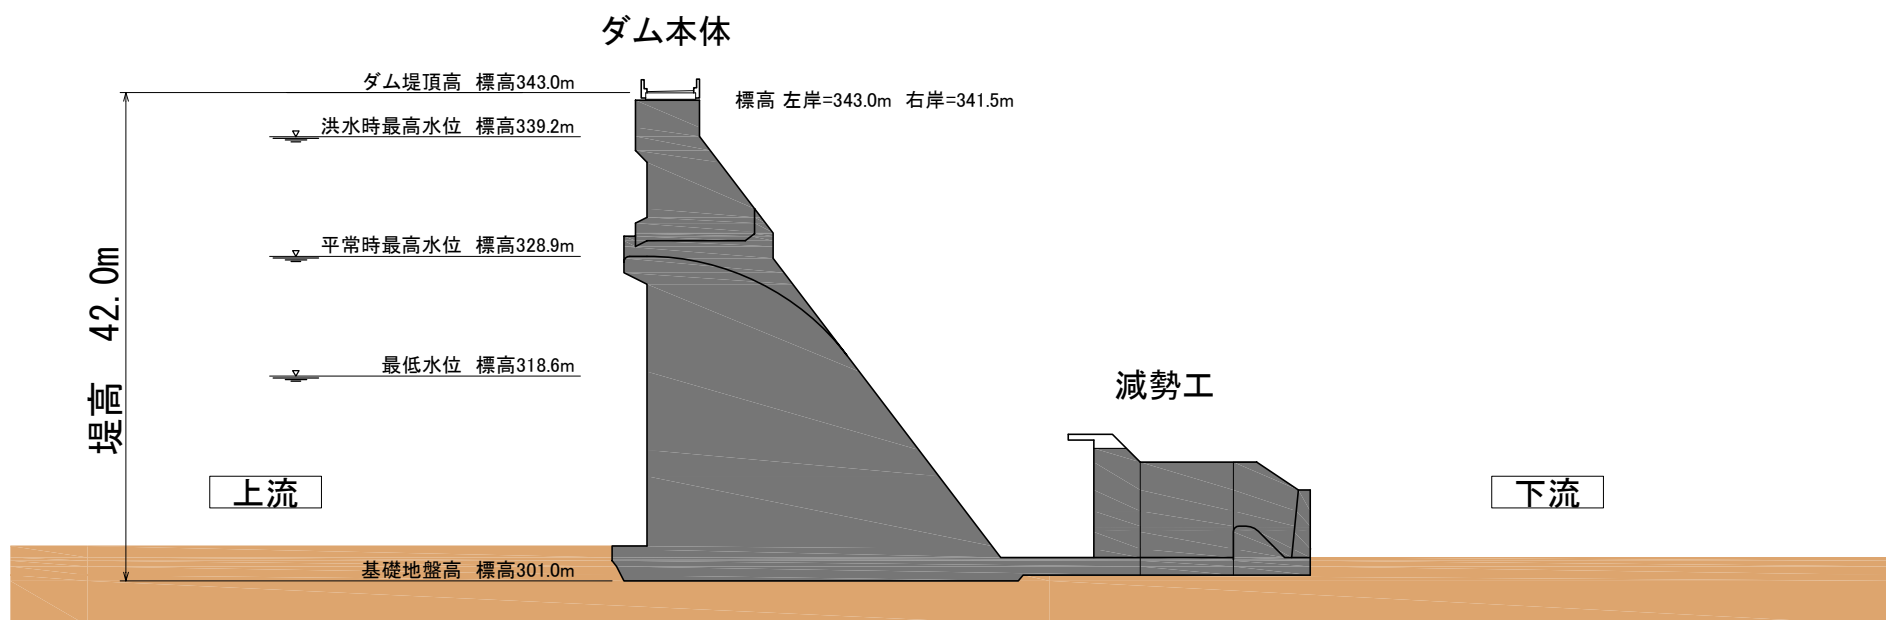

打設量と進捗率

	体積	進捗率
打設量	42,400m ³	99.1%
計画量	42,800m ³	

(備考) コンクリート打設の進捗率です。工事全体の進捗率ではありません。

平成27年10月7日
打設分まで
