

公共土木施設 災害復旧報告

広島県管理の道路・河川
砂防施設（大津恵・重行・篠堂・
大戸地区）の復旧状況報告です。

発行
広島県北部建設事務所
庄原支所

いよいよ篠堂川激特事業が

けきとく

始まります！

平成22年7月16日災害を受けて

篠堂地区では、平成二十二年七月十六日の豪雨により土石流が発生し、家屋七戸（うち、非住家二戸含む）が全壊、半壊二戸、一部損壊一戸の甚大な被害を受けました。

まず、緊急的な対策として、県道中迫川北線の安全な通過交通確保を目的として災害関連緊急砂防事業により砂防えん堤三基の新設が平成二十二年八月に国土交通省に採択され、現在、平成二十三年十二月末の完成を目指して鋭意工事を進めています。

依然として10万m³の土砂が堆積

また、篠堂川本川の流域内には、依然として川沿いの浸食箇所や山地部の崩壊地が多数あり、調査した結果、流域全体で約10万m³の土砂の流出が想定されることが判明しました。

これを受けて、下流域の人家の安全確保のため土砂災害を防止する砂防激甚災害対策特別緊急事業を、国土交通省に申請し、平成二十三年三月に採択されました。


具体的な事業内容は、九基の砂防えん堤と約三百mの溪流保全工及び約三百mの付替林道を整備します。

事業のスケジュール

現在、事業計画全ての詳細設計が完了し、地元の方々のご協力を得ながら鋭意用地買収を行っております。また、今年度から一部工事発注も行う予定としており、平成二十五年末の完成を目指して事業を推進してまいります。

今後も、進捗状況を皆様方にご報告してまいりますので、ご理解をいただいております。

篠堂川砂防えん堤 位置図

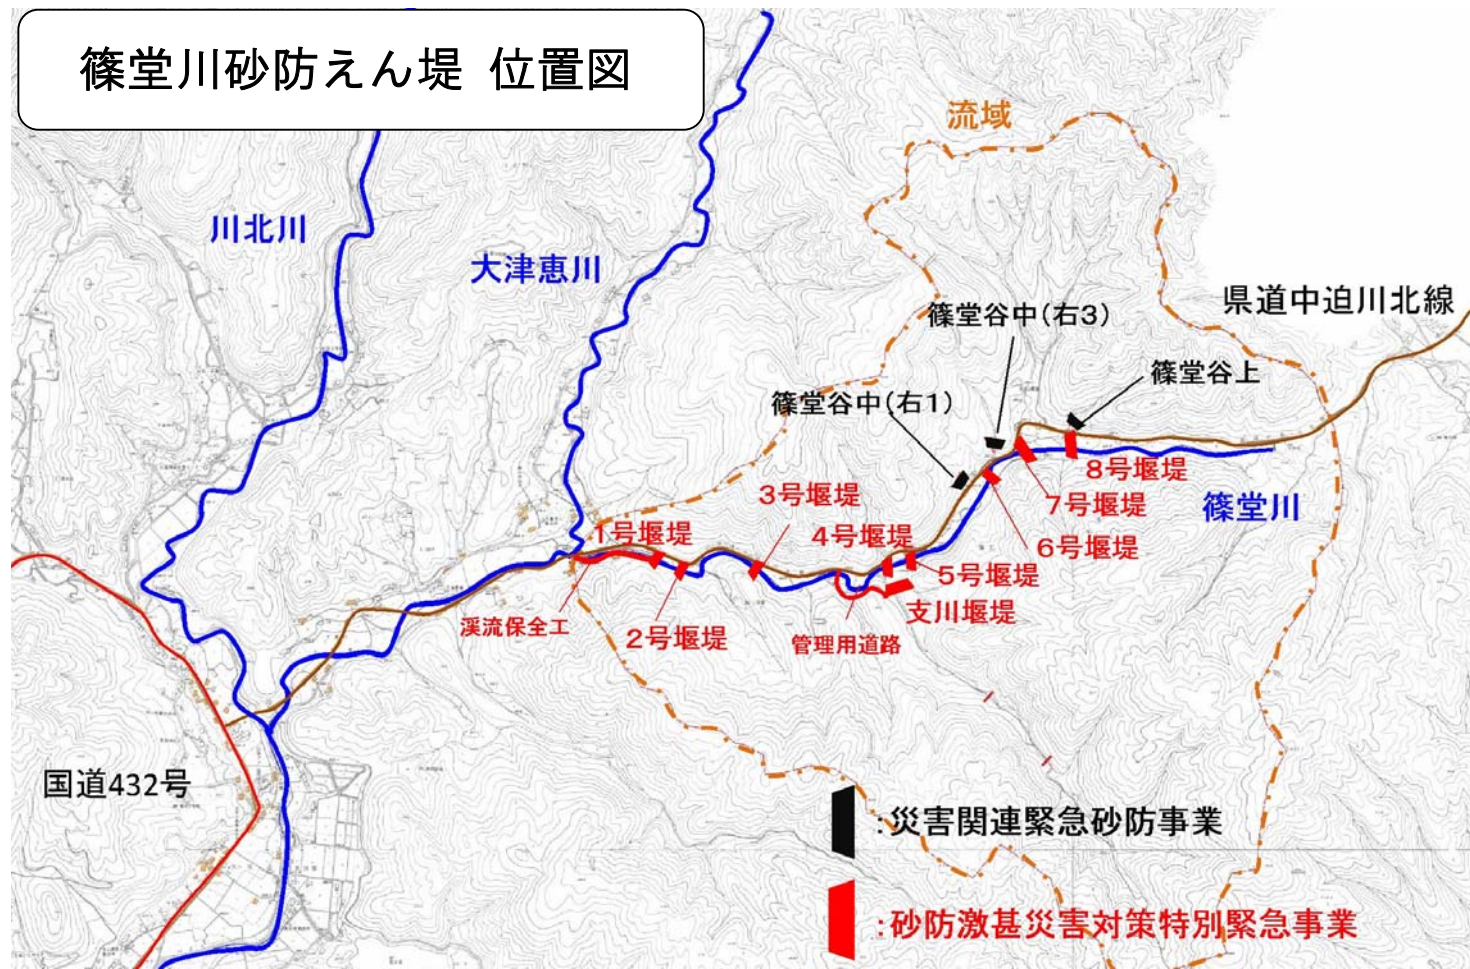

7号えん堤イメージ



支川えん堤イメージ

現場代理人のひとりごと

篠堂地区でコンクリートえん堤を施工されている3社の現場代理人（現場監督）さんから一言ずつ、ご挨拶をいただきました。

篠堂谷上 大歳組 岩木 和裕さん

この度被災された方々に対しまして、心よりお見舞い申し上げます。



当社は現在、庄原市川北町篠堂地区において、砂防工事（長さ66m・高さ9.5m）を施行させて頂いております。進捗率は9月末で90%となっております。道路の汚損、河川の濁水、ゴミの散乱等環境に配慮し、安全第一で1日も早い完成を目指し、全力で取り組んでいます。

地元の皆様には、工事車両の出入りや騒音等でご迷惑をおかけしておりますが、何卒ご理解を賜りますよう今後ともよろしくお願い申し上げます。

篠堂谷中（右1） 加島建設 松田 誠さん

いつも皆様方にはご迷惑おかけしております。

篠堂谷中（右1）作業所の現場代理人の松田です。現在の進捗状況は9月末で本堤がほぼ完成しました。



引き続き、副堤及び流路工を施工していきます。

災害より一年が過ぎ、多少は復旧工事が進んでいますが、未だ爪痕が残っており、被災者の方々を思うと胸が痛みます。この工事に携わる事で微力ではありますが、復興支援に協力できたらと思っております。

今後ともよろしく申し上げます。

篠堂谷中（右3） 中田建設 鉦谷 光男さん

去年の7月16日は、県の道路維持修繕工事の関係で中迫川北線の通行止め看板の設置を行い、交通規制をしていました。当時の状況は、豪雨でここまで悲惨な災害を起こすとは想像が付きませんでした。




その後、庄原市門田地区の橋台に流木が引っ掛かり河川が氾濫した箇所の土砂の撤去作業を朝方まで行っていました。

今現在は、篠堂谷中（右3）の砂防えん堤工事をさせて頂いております。進捗状況は、コンクリートえん堤本体部が完成し、流路工の掘削を行っております。一日でも早く復旧できるように、他業者又は関係者と協力して行きたいと思っておりますので、ご協力の方を宜しくお願い致します。

工事中箇所の進捗状況

【凡例】

- 災害関連緊急砂防事業 (砂防えん堤工事)
- 河川災害関連事業 (河川工事)
- 道路災害関連事業 (道路工事)
- 砂防激甚災害対策特別緊急事業 (砂防えん堤工事)

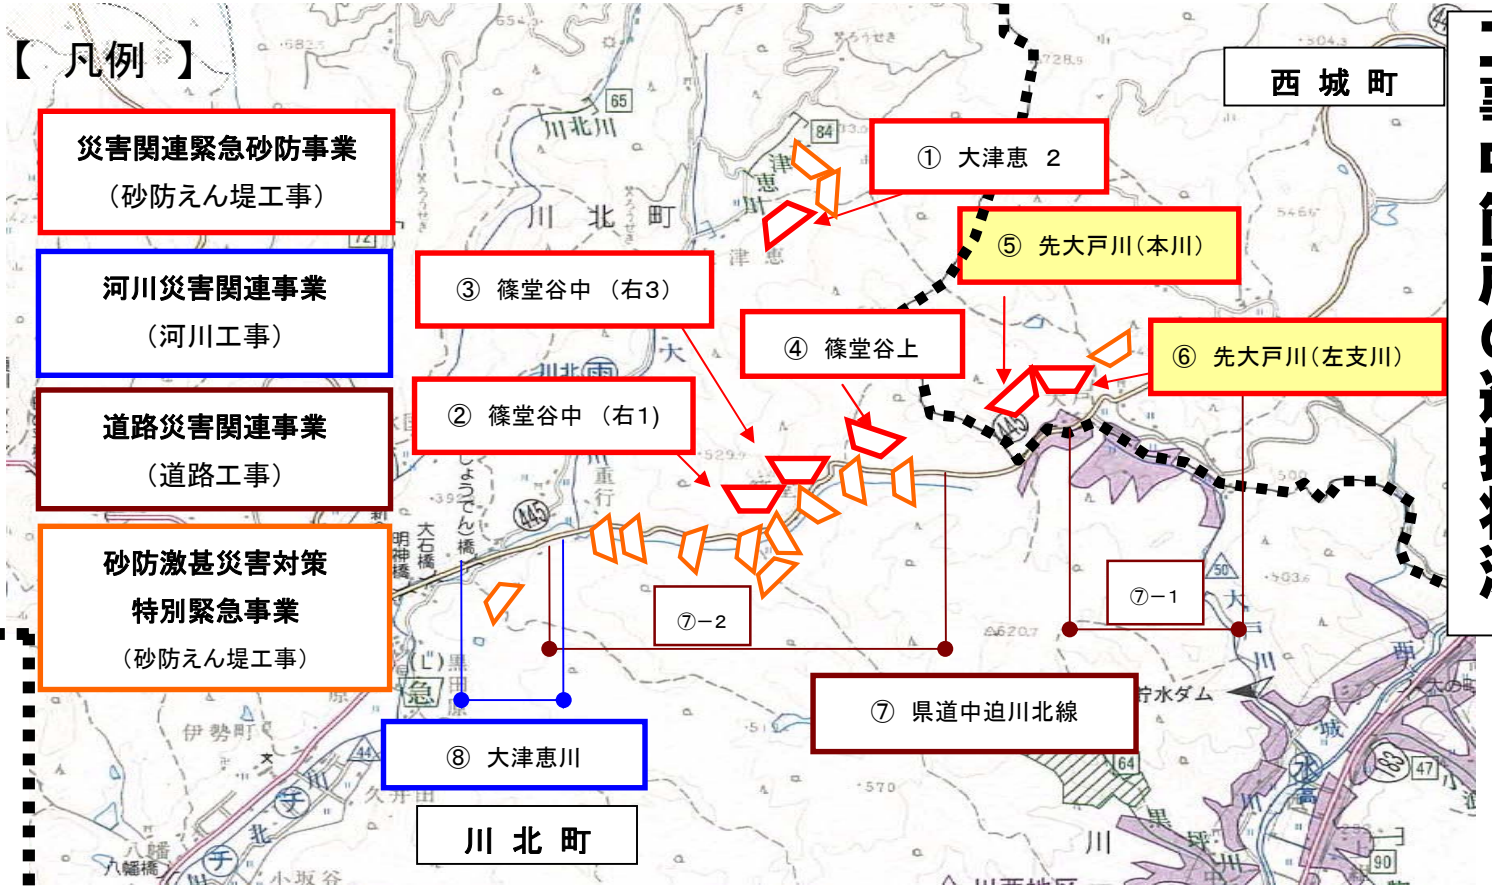


お知らせ

先大戸川(本川)(右図⑤)
先大戸川(左支川)(右図⑥)
に
工事着手しました。

※進捗率は平成二十三年九月末時点の
発注工事単位ごとの進捗率を示します。

↓ご質問はこちらまで↓


広島県北部建設事務所庄原支所
災害復旧チーム
TEL 72-2015 (代表)

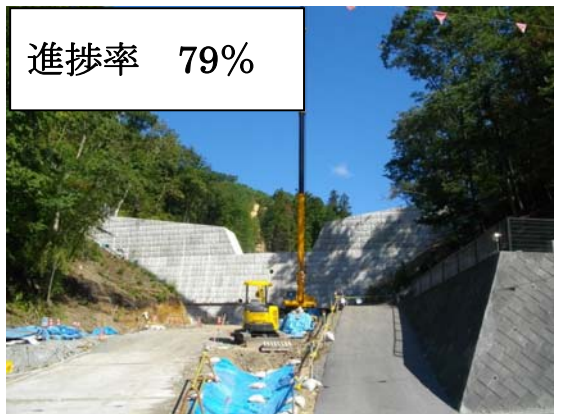

進捗率 79%

③ 篠堂谷中(右3)
しのどうたになか


工事内容: コンクリートえん堤 1基
施工: 中田建設
工期: H23.3~H23.12

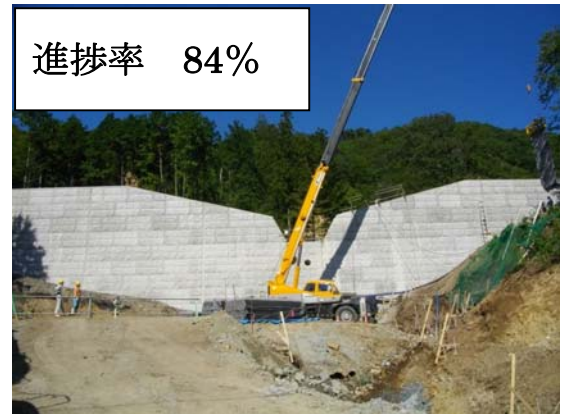

進捗率 84%

② 篠堂谷中(右1)
しのどうたになか

工事内容: コンクリートえん堤 1基
施工: 加島建設
工期: H23.3~H23.12

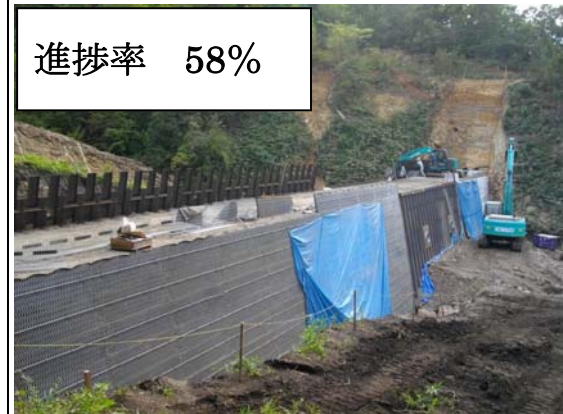

進捗率 58%

① 大津恵2
おおつえ

工事内容: 鋼製えん堤 1基
施工: 角栄組
工期: H23.4~H23.12



工事内容: コンクリートえん堤 1基
施工: 山陽工業
工期: H23.9~H24.3

⑥ 先大戸川(左支川)
さきおおとがわ



工事内容: コンクリートえん堤 1基
施工: 宮田建設
工期: H23.10~H24.3

⑤ 先大戸川(本川)
さきおおとがわ



進捗率 90%

④ 篠堂谷上
しのどうたにかみ

工事内容: コンクリートえん堤 1基
施工: 大歳組
工期: H23.3~H23.12



進捗率 67%

⑧ 大津恵川
おおつえかわ

工事延長: 603m
施工: 藤元建設工業
工期: H23.3~H23.12



進捗率 76%

工事延長: 1,800m
施工: 北備建設
工期: H23.3~H23.11



進捗率 85%

⑦ 県道中迫川北線
なかさこかわきたせん

工事延長: 1,081m
施工: 下田建設
工期: H23.3~H23.10
