

公共土木施設 災害復旧報告

広島県管理の道路・河川・砂防施設（大津恵・重行・篠堂・大戸地区）の復旧状況報告です。

発行
広島県
北部建設事務所
庄原支所

就任挨拶

広島県北部建設事務所庄原支所長 奥田 哲由



平成24年4月1日付で広島県北部建設事務所庄原支所長に就任しました奥田です。就任にあたり一言御挨拶を申し上げます。皆様方におかれましては平素より広島県土木行政の推進に格別の御理解と御協力を賜り、この場をお借りして御礼申し上げます。

さて、当事務所では、平成22年7月16日の豪雨災害で被災した大津恵地区、重行地区、篠堂地区、大戸地区の早期復興を目指し、鋭意、災害復旧事業を行っております。今年度は河川災害関連事業（大津恵川）及び道路災害関連事業（県道中迫川北線）が完了いたします。また、砂防激甚災害対策特別緊急事業（篠堂川・先大戸川）においては現在工事中のえん堤4基に加え、えん堤4基及び溪流保全工（えん堤から下流の水路工事）3箇所を工事発注し、本格的に工事を進め、篠堂川流域及び先大戸川流域の土砂流出防止に努めます。工事の進捗状況は、「公共土木施設災害復旧報告」により、引き続き、皆様方へお伝えして参ります。今後とも地元の皆様には大変ご迷惑をおかけしますが、引き続き災害復旧に御理解と御協力をいただきますようよろしくお願いいたします。

平成24年度 工事着手予定箇所

※溪流保全工とは、土砂を安全に流すための水路設置工事を、除石とは堆積土砂の撤去を表します。



現在工事中の箇所


【凡例】

災害関連緊急砂防事業
(砂防えん堤工事)

河川災害関連事業
(河川工事)

砂防激甚災害対策
特別緊急事業
(砂防えん堤工事)

完成済み

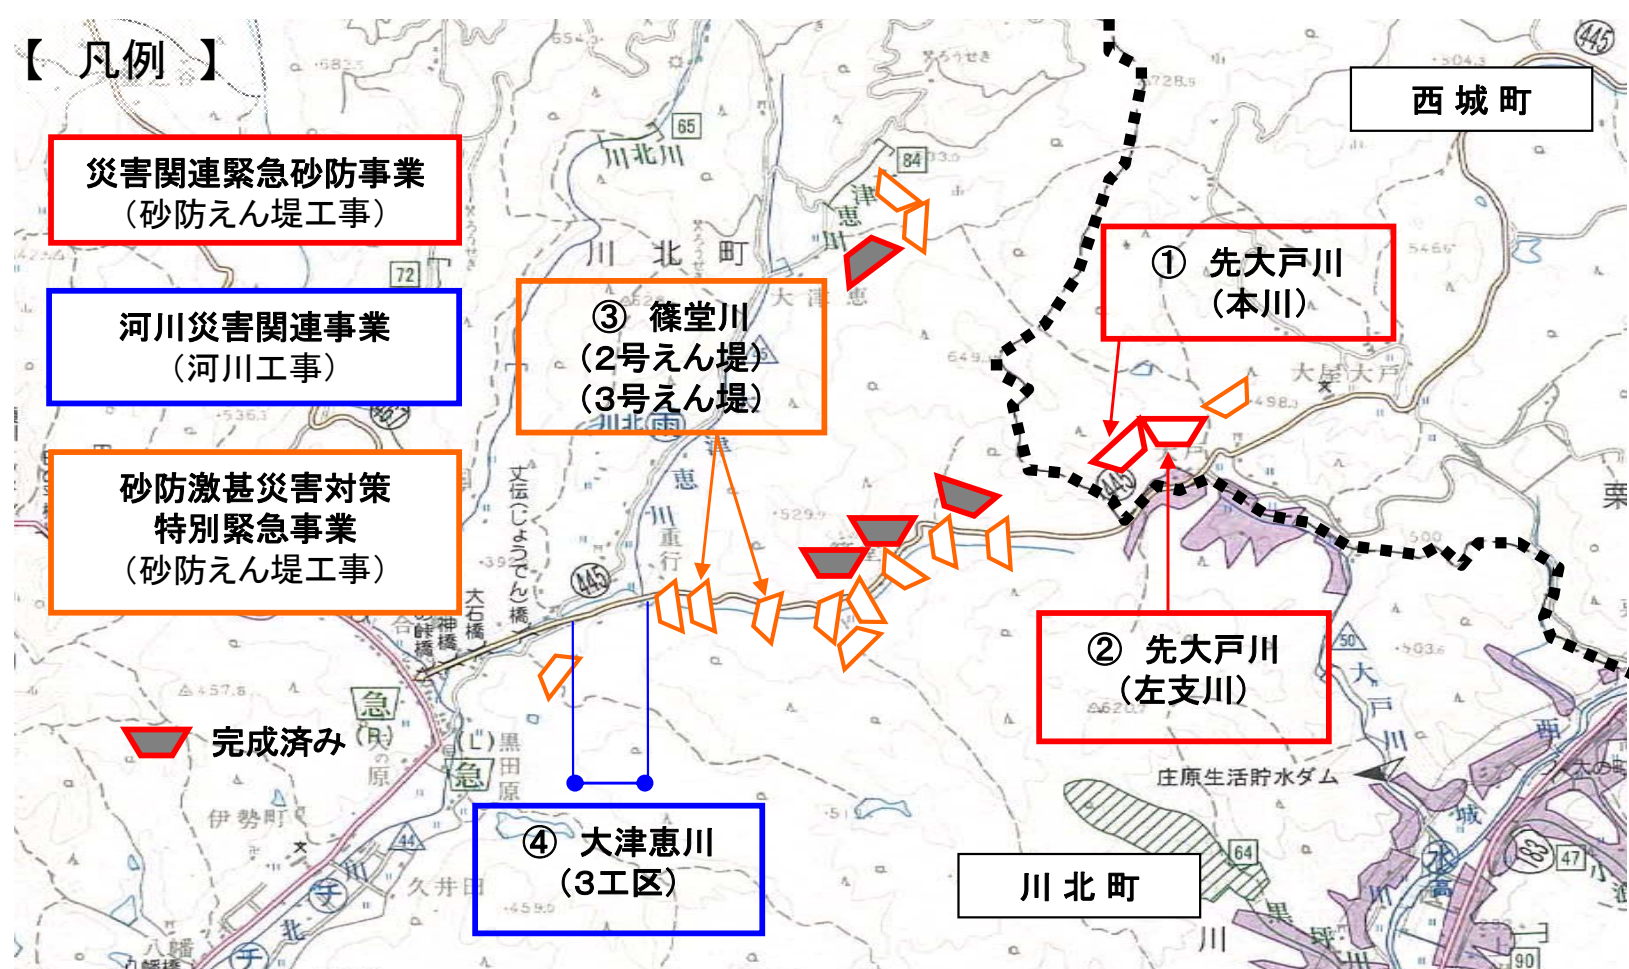

進捗率 50%



工事内容：コンクリートえん堤 1基
施工：山陽工業
工期：H23.9～H24.7(予定)

② 先大戸川(左支川)

進捗率 57%



工事内容：コンクリートえん堤 1基
施工：宮田建設
工期：H23.10～H24.7(予定)

① 先大戸川(本川)

進捗率 30%



工事内容：コンクリートえん堤 2基
施工：大歳組
工期：H23.12～H24.8(予定)



3号えん堤



2号えん堤

③ 篠堂川(2号・3号)

※ 進捗率は平成24年4月20日時点の発注工事単位の進捗率を示します。

↓ご質問はこちらまで↓
■ 広島県北部建設事務所
■ 庄原支所
■ 災害復旧チーム
■ TEL 72-2015(代表)

進捗率 71%



工事延長 L=380m
施工：加島建設
工期：H23.12～H24.6(予定)



④ 大津恵川(3工区)
