

主要地方道鞆松永線鞆未来トンネルの進捗状況について

1 要旨・目的

主要地方道鞆松永線鞆未来トンネルについて、現在の進捗状況を報告する。

2 現状・背景

令和5年8月10日現在の鞆未来トンネルの進捗状況は、東側からの掘削延長が537m、西側からの掘削延長が22mとなっており、掘削の進捗率は26%となっている。また、東側からは掘削作業と並行して覆工コンクリートの打設作業を開始したところである。

(参考) トンネルの掘削状況図及び坑口部の状況写真



3 概要

(1) 対象者

(2) 事業内容（工事概要）

ア 工事名：鞆松永線道路改良工事（(仮称) 鞆トンネル）


イ 工事場所：福山市鞆町後地

ウ 工事内容：工事延長L=2,300m、トンネル工（NATM）L=2,114m

エ 工期：令和3年12月22日から令和6年3月29日

(3) スケジュール

トンネル西側からの掘削については、接続道路及びトンネル工事に係る仮設備ヤード等の地盤が硬く、約1年遅れて開始したが、今後、トンネル東西からの掘削状況を踏まえ、全体工程の精査を進めていく。

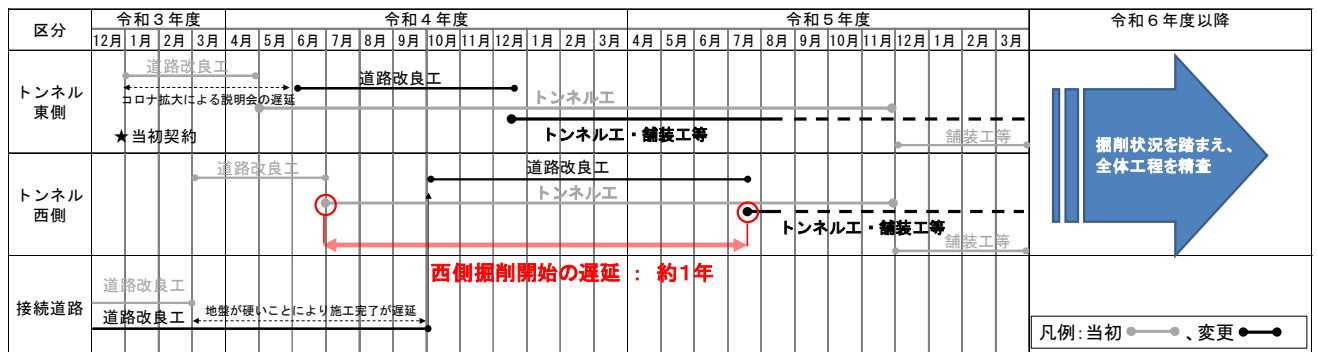

(4) 予算（国庫）

請負金額 6,292 百万円（税込）

4 その他（今後の予定）

引き続き、地域住民に対し丁寧な説明を行いながら、安全かつ着実に工事を進めるとともに、全体工程の精査結果については、確定次第速やかに報告する。
