


砂防激甚災害対策特別緊急事業(宇根川・笠岩川2)



広島県


【工事計画平面図】

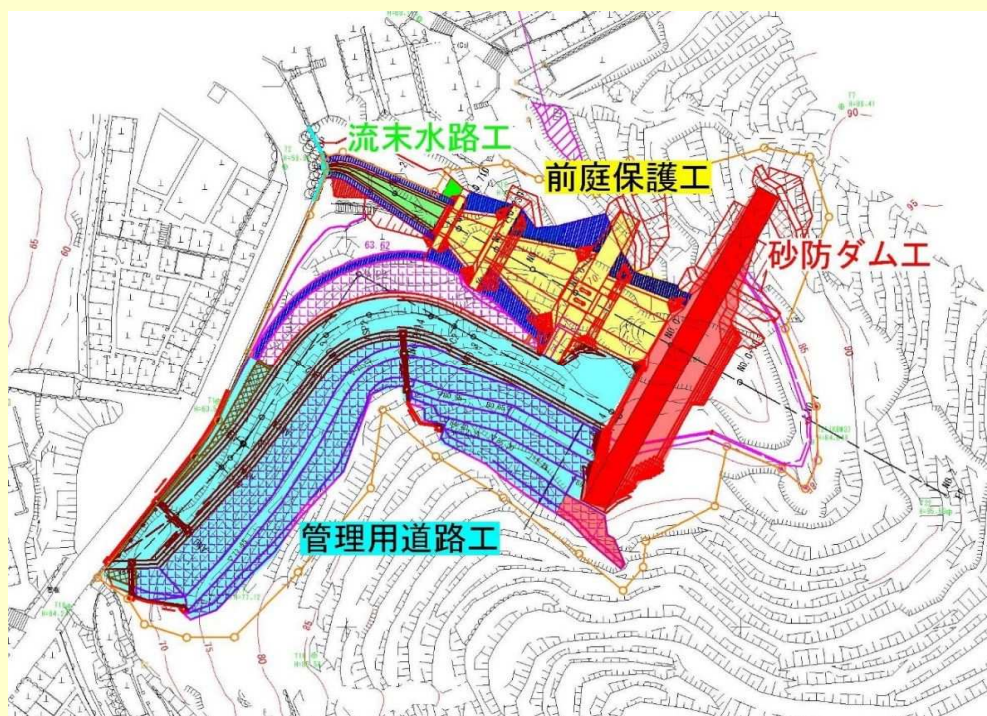

【現在の作業内容】

前庭保護工の側壁護岸工を進めています

【正面図】

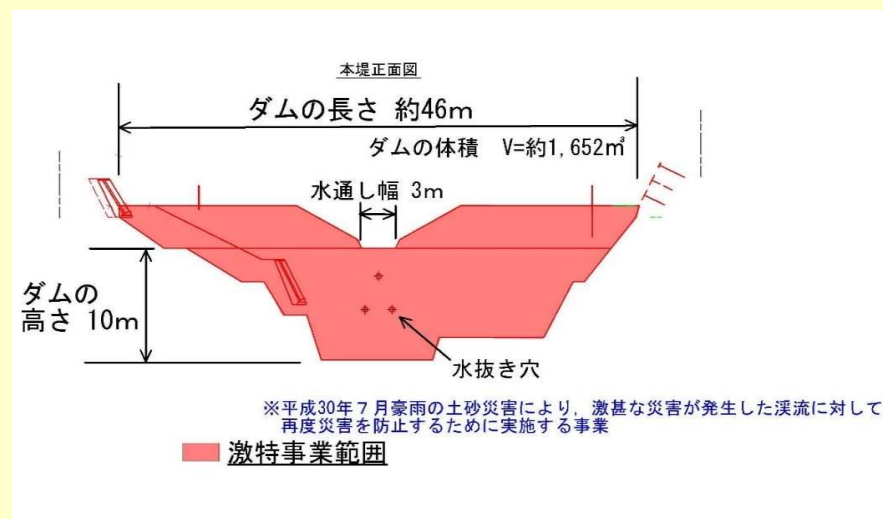

施工状況

2025年4月末現在

【全景】




【側壁護岸工】



被災状況

【土砂流出範囲】

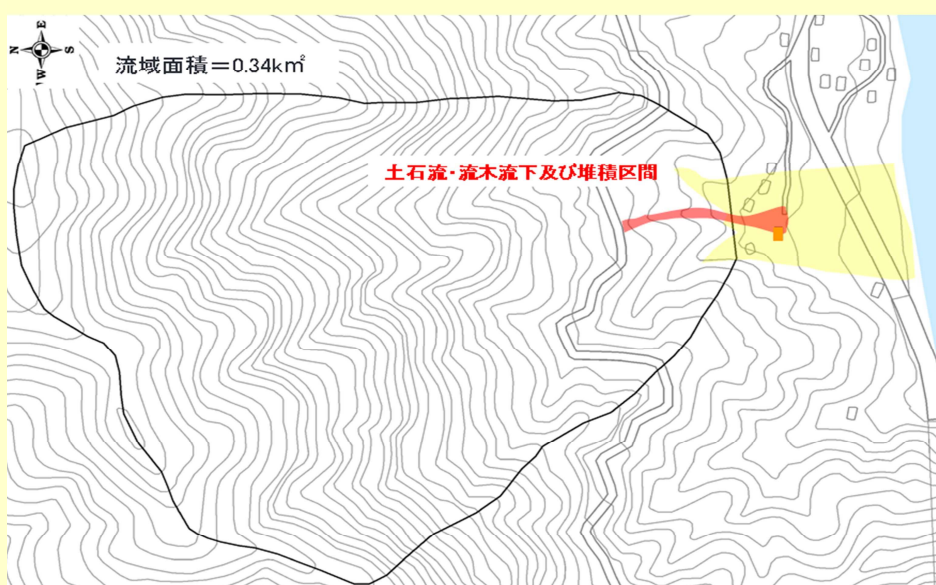

【航空写真】





令和4年度	12月	3月	6月
	伐採工	鉄筋挿入工	鉄筋挿入工
			
	8月	12月	3月
令和5年度	準備工	掘削工(本堤部)	本堤工
			
	4月	7月	10月
	本堤工	工事用道路撤去工	準備工
令和6年度			
	12月	3月	4月
	掘削工(副堤部)	前庭保護工(副堰堤部)	側壁護岸工
			

工種	作業内容
準備工	工事を行うに当たり事前に行う作業
伐採工	工事を行うに当たり支障となる木を切る作業
掘削工	地表面より下の構造物をつくるのに土を掘る作業
埋戻し工	構造物ができた後に土を掘った箇所を埋める作業
法面保護工	法面の風化や浸食を防止し、法面の安定を図るための作業
本堤工	砂防ダム本体をつくる作業
前庭保護工	砂防ダム本体が流水により破壊されることを防ぐ構造物をつくる作業
工事用道路工	工事現場まで行くのに必要な道路をつくる作業
管理用道路工	維持管理を行う上で必要な道路をつくる作業
付替え市道(里道)工	工事の影響を受ける市道(里道)を復旧する作業
流末水路工	砂防ダムから既設の水路まで水を導く構造物をつくる作業

