



# 庄原ダムニュース

VOL.4 平成26年11月  
北部建設事務所庄原支所  
庄原ダム建設事業課




## ダム本体工事 定礎式開催

ダムの永久堅固と安泰を祈願するとともに、地権者等多くの関係者の事業協力に対し、感謝の意を表することを目的として10月23日、定礎式が行われました。  
今後も安全第一で工事を継続してまいりますので、引き続きよろしくお願いいたします。

### ダム本体工事の進捗状況

【庄原ダム本体工事】 工期：H25.10～H28.3  
施工：大林・東洋・伏光庄原ダム本体特定工事共同企業体

(進捗率：H26.10月末時点)



平成26年11月6日の作業状況



見学会実施

11月7日、高小学校5、6年生の皆さんに、ダム現場を見学してもらいました。


- これまで川の水が流れていた赤線で囲った部分で今後、コンクリート打設を行います。写真は、掘削作業を行っているところです。
- 川の水は10月27日に転流を実施し現在は、堤体内の水路を通過して、緑線で囲った部分に流れ出ています。



# ダム本体コンクリート打設 進捗状況

## 堤体上流面図

(ダムを上流から見た図)

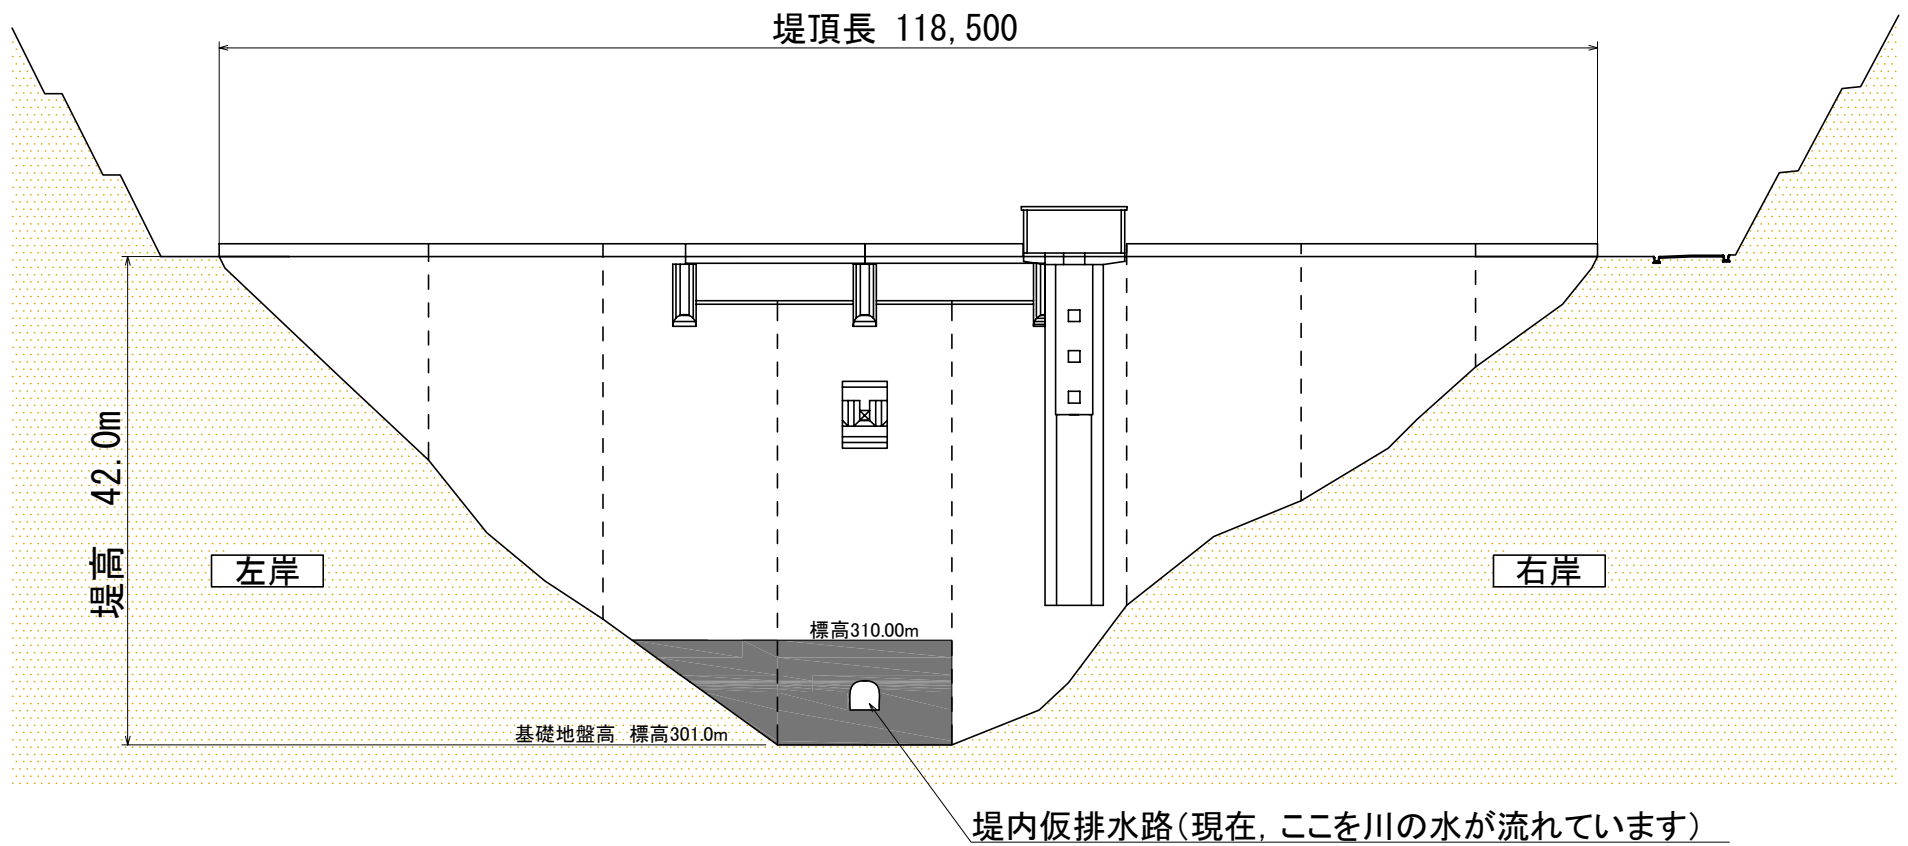


## 堤体断面図


(ダムの中央部を右岸から見た図)

凡例

■ 打設済み範囲

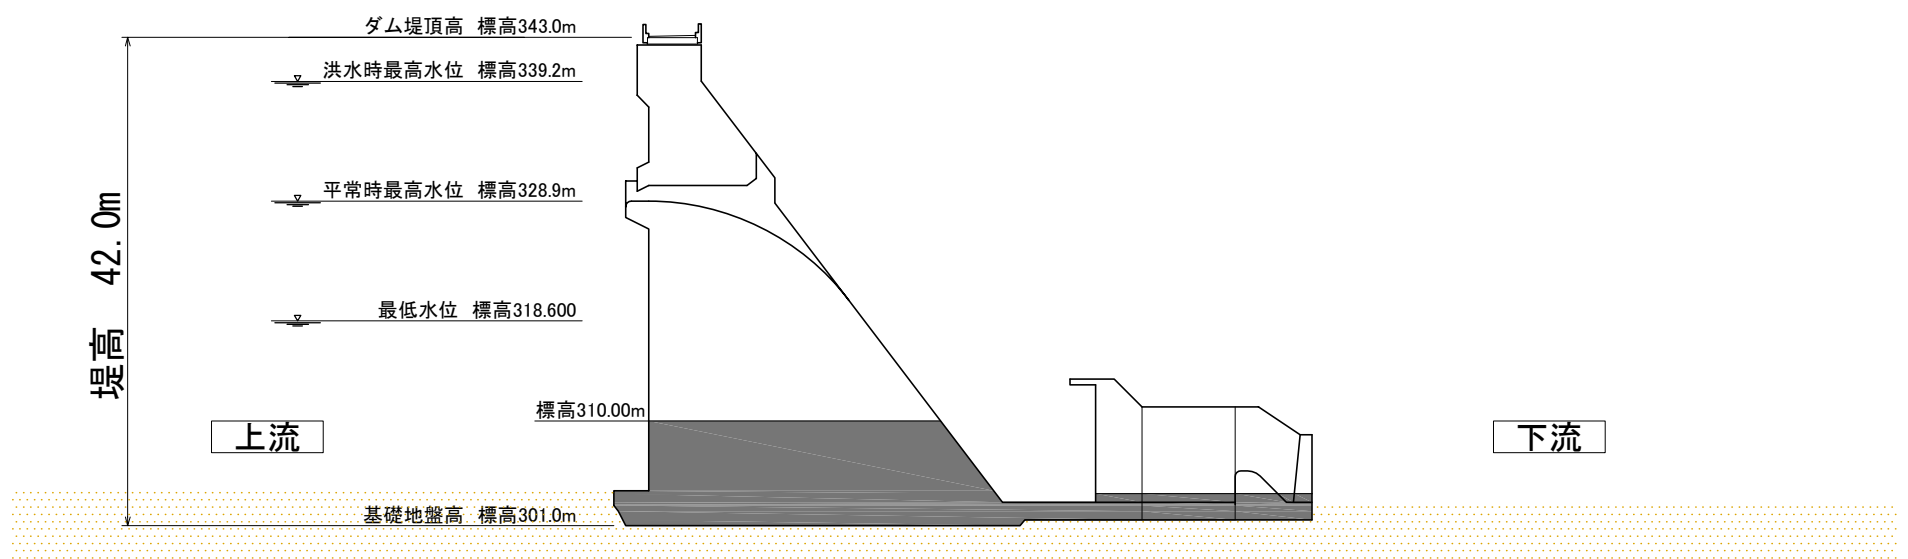

## コンクリート打設量の推移

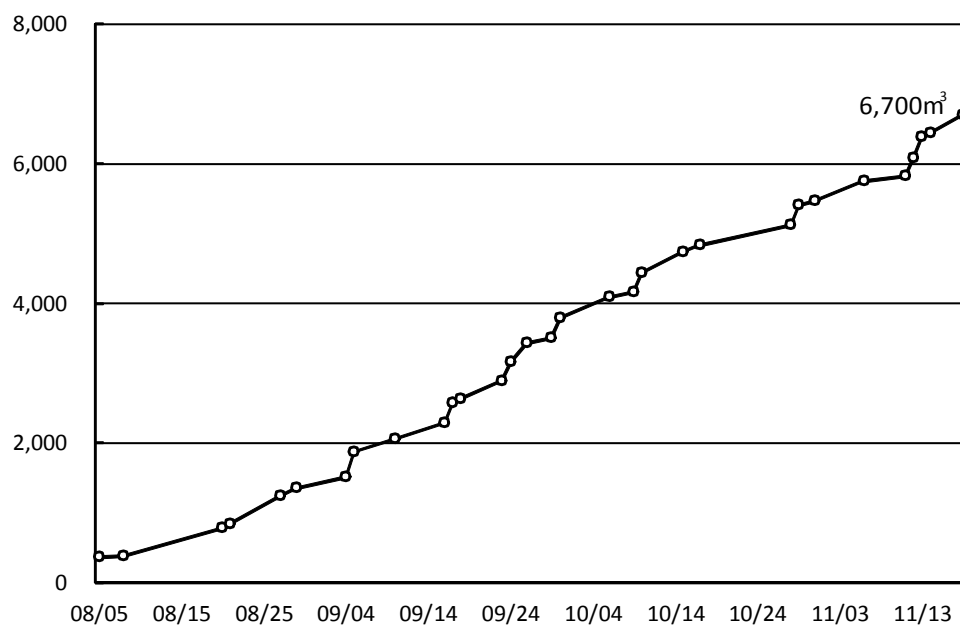

## 打設量と進捗率

	体積	進捗率
打設量	6,700m <sup>3</sup>	15.7%
計画量	42,800m <sup>3</sup>	

(備考) コンクリート打設の進捗率です。工事全体の進捗率ではありません。

平成26年11月18日  
打設分まで
