

大津恵川河川災害関連工事が完成しました！


公共土木施設 災害復旧報告

広島県管理の道路・河川
砂防施設（大津恵・重行・篠堂・
大戸地区）の復旧状況報告です。



発行
広島県北部建設事務所
庄原支所

皆様のご協力により、平成二十四年六月末をもちまして大津恵川河川災害関連工事が完成しました。
この河川工事では、一昨年七月の豪雨時、流木による河道埋塞の原因となった市道橋の撤去、大門橋（市道）の架け
替え、篠堂川合流点付近の屈曲部の是正や丈伝橋から上流の河川断面の拡幅を行いました。これにより、平成二十二
年七月十六日豪雨と同規模の大雨による増水は安全に流れるようになります。


断面障害していた橋の架け替え




屈曲部の是正

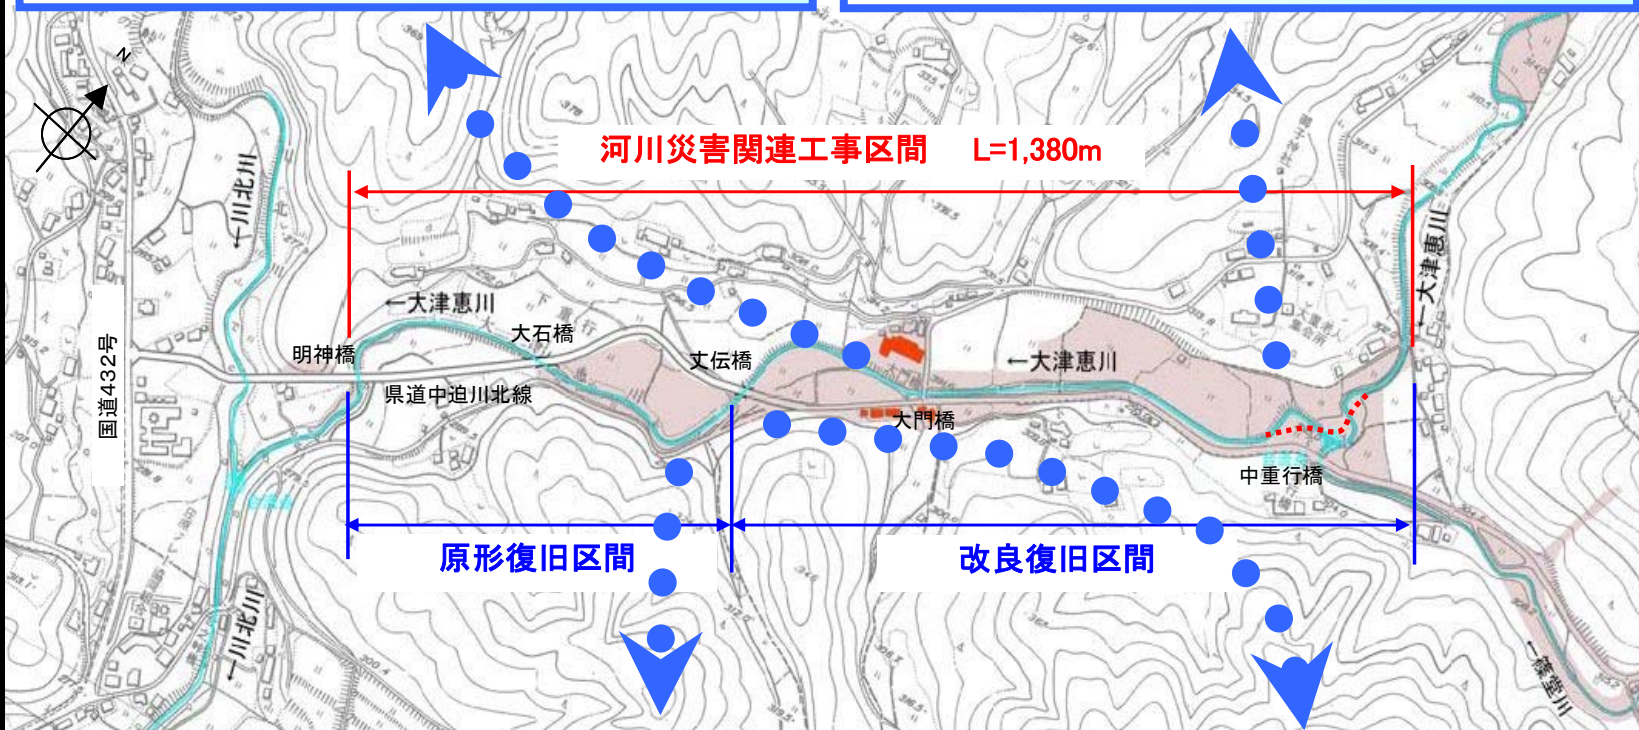


河川断面の拡幅



市道橋の撤去



工事中箇所の進捗状況

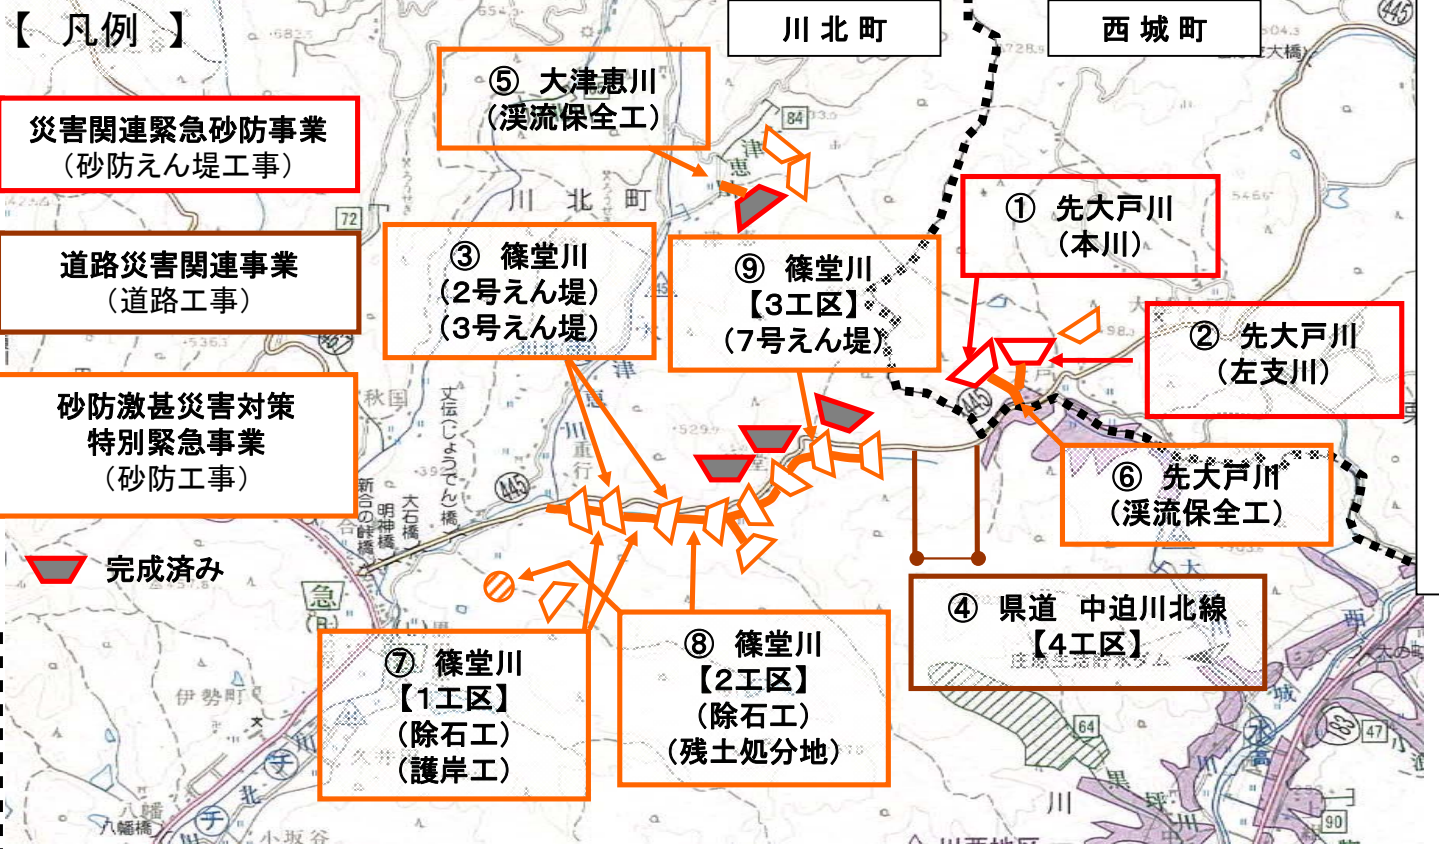

お知らせ

※ 進捗率は平成二十四年六月末時点の発注工事単位ごとの進捗率を示します。

④ 中迫川北線、⑤ 大津恵川、⑥ 先大戸川、⑦ 篠堂川 (1工区)、⑧ 篠堂川 (2工区)、⑨ 篠堂川 (3工区) (右図) に工事着手しました。

↓ ご質問はこちらまで ↓

広島県北部建設事務所庄原支所
災害復旧チーム
TEL 72-2015 (代表)

進捗率 70%

③ 篠堂川 (2号・3号えん堤)

工事内容: コンクリートえん堤 2基
施工: 大歳組
工期: H23.12~H24.8

進捗率 80%

② 先大戸川 (左支川)

工事内容: コンクリートえん堤 1基
施工: 山陽工業
工期: H23.9~H24.9

進捗率 95%

① 先大戸川 (本川)

工事内容: コンクリートえん堤 1基
施工: 宮田建設
工期: H23.10~H24.7

⑥ 先大戸川 (溪流保全工)

工事内容: 溪流保全工 375m
施工: 中田建設
工期: H24.6~H25.1 (予定)

⑤ 大津恵川 (溪流保全工)

工事内容: 溪流保全工 238m
施工: 中田建設
工期: H24.6~H25.1 (予定)

進捗率 13%

④ 県道 中迫川北線

工事延長: 636m
施工: 三宅建設
工期: H24.5~H24.12 (予定)

⑨ 篠堂川 (3工区)

工事内容: 砂防ソイルセメントえん堤 1基, 除石工
施工: 中田建設
工期: H24.6~H25.1 (予定)

残土処分地

⑧ 篠堂川 (2工区)

工事内容: 除石工, 残土処分地
施工: 加藤組
工期: H24.6~H25.5 (予定)

⑦ 篠堂川 (1工区)

工事内容: 護岸工, 除石工
施工: 角栄組
工期: H24.6~H25.1 (予定)
