

# 一般県道 中迫川北線 道路災害関連工事が完了しました！

## 公共土木施設 災害復旧報告

広島県管理の道路・河川  
砂防施設（大津恵・重行・篠堂・  
大戸地区）の復旧状況報告です。

発行  
広島県北部建設事務所  
庄原支所

二車線 改良区間


被災時



完成



①

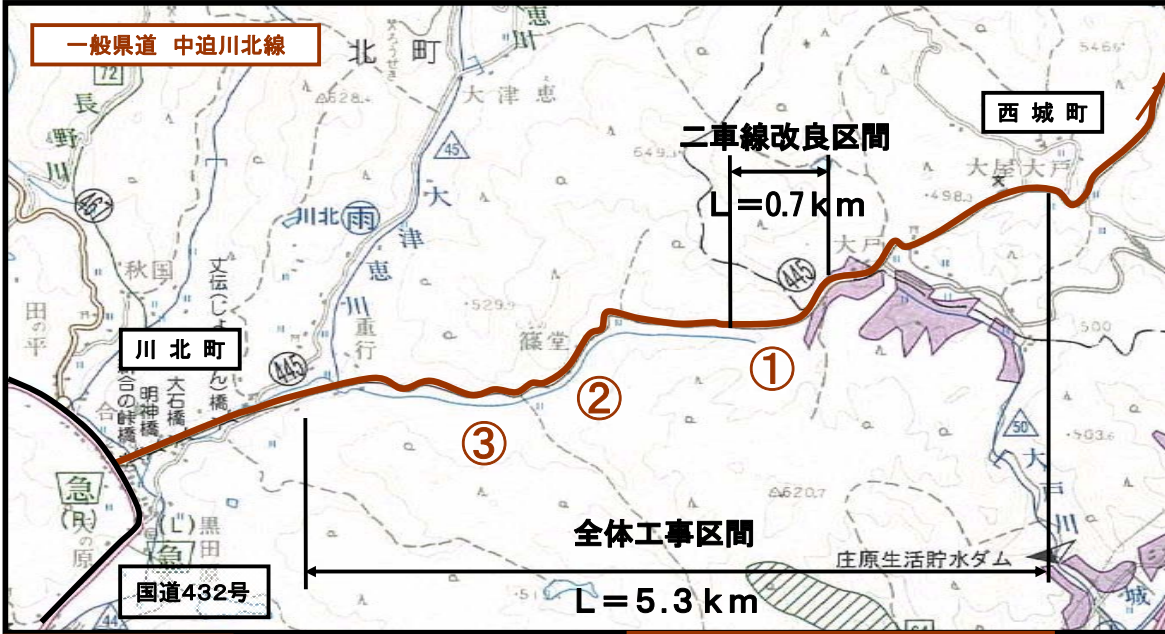

皆様のご協力により、平成二十四年十二月末をもちまして県道中迫川北線道路災害関連工事が完了しました。この道路工事では、平成二十二年七月の豪雨災害により崩壊した道路斜面の復旧や、今後、道路斜面が崩壊した際に落石を止めるための防止柵の新設といった災害対策工事とともに、これまで一車線しかなく、離合が困難であった箇所を二車線に拡げる道路改良工事を合わせて実施しました。これからは川北町と西城町を結ぶ中迫川北線を安心して通行いただけます。

落石対策工事

被災時

③



完成



流出した土砂撤去工事

被災時


②



完成



工事中箇所の進捗状況

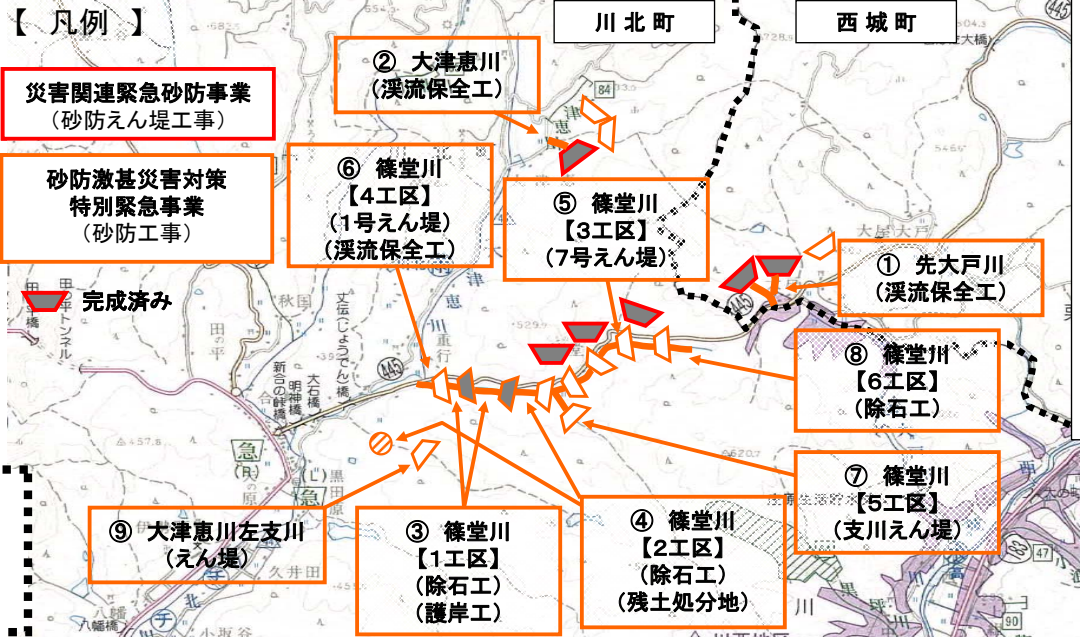

お知らせ

⑨大津恵川左支川 (右図) に  
工事着手します。

※ 進捗率は平成二十五年一月一八日時点の  
発注工事単位ごとの進捗率を示します。

↓ ご質問はこちらまで ↓

広島県北部建設事務所庄原支所  
災害復旧チーム  
TEL 72-2015 (代表)

<p>進捗率 96%</p> <p>③ 篠堂川 (1工区)</p> <p>工事内容: 護岸工, 除石工 施工: 角栄組 工期: H24.6~H25.2 (予定)</p>	<p>進捗率 79%</p> <p>② 大津恵川 (溪流保全工)</p> <p>工事内容: 溪流保全工 238m 施工: 中田建設 工期: H24.6~H25.3 (予定)</p>	<p>進捗率 88%</p> <p>① 先大戸川 (溪流保全工)</p> <p>工事内容: 溪流保全工 375m 施工: 中田建設 工期: H24.6~H25.3 (予定)</p>
<p>進捗率 57%</p> <p>⑥ 篠堂川 (4工区)</p> <p>工事内容: コンクリトえん堤 1基, 溪流保全工 施工: 宮田建設 工期: H24.8~H25.6 (予定)</p>	<p>進捗率 79%</p> <p>⑤ 篠堂川 (3工区)</p> <p>工事内容: 砂防ソイルセメントえん堤 1基, 除石工 施工: 中田建設 工期: H24.6~H25.3 (予定)</p>	<p>進捗率 32%</p> <p>④ 篠堂川 (2工区)</p> <p>工事内容: 除石工, 残土処分地 施工: 加藤組 工期: H24.7~H25.5 (予定)</p>
<p>進捗率 36%</p> <p>⑨ 大津恵川左支川</p> <p>工事内容: 砂防ソイルセメントえん堤 1基 施工: 宮田建設 工期: H25.1~H25.10 (予定)</p>	<p>進捗率 12%</p> <p>⑧ 篠堂川 (6工区)</p> <p>工事内容: 除石工 施工: 北備建設 工期: H24.10~H25.3 (予定)</p>	<p>進捗率 12%</p> <p>⑦ 篠堂川 (5工区)</p> <p>工事内容: 砂防ソイルセメントえん堤 1基, 除石工 施工: 広成建設 工期: H24.9~H25.7 (予定)</p>
