

公共土木施設 災害復旧報告

広島県管理の道路・河川
砂防施設（大津恵・重行・篠堂・
大戸地区）の復旧状況報告です。

発行
広島県北部建設事務所
庄原支所

激特事業完成に向けて

ラストスパートします

平成22年7月16日に発生した庄原豪雨災害から間もなく3年が経過します。この間、道路や河川といった土木施設の復旧や土砂災害を防止する砂防えん堤などの整備に取り組んで参りました。皆様方のご協力により、県道中迫川北線道路災害関連工事、大津恵川河川災害関連工事、災害関連緊急砂防工事などの大きな工事も無事に完了させることができました。この場をお借りしてお礼申し上げます。

さて、今年度は、砂防激甚災害対策特別緊急事業の最終年度であり、篠堂川や大津恵川左支川などの事業中の箇所について、早期完成を目指して鋭意取り組んで参ります。皆様方にはご迷惑をおかけいたしますが、引き続き、ご理解とご協力をいただきますよう、よろしく願いいたします。

今回の災害復旧報告では、今年3月に完成した先大戸川及び大津恵川の渓流保全工の紹介と、当事務所の平成25年度の事業予定を報告させていただきます。

大津恵地区

砂防えん堤に続き、L=216mの渓流保全工（土砂を安全に流すための水路）が完成しました。




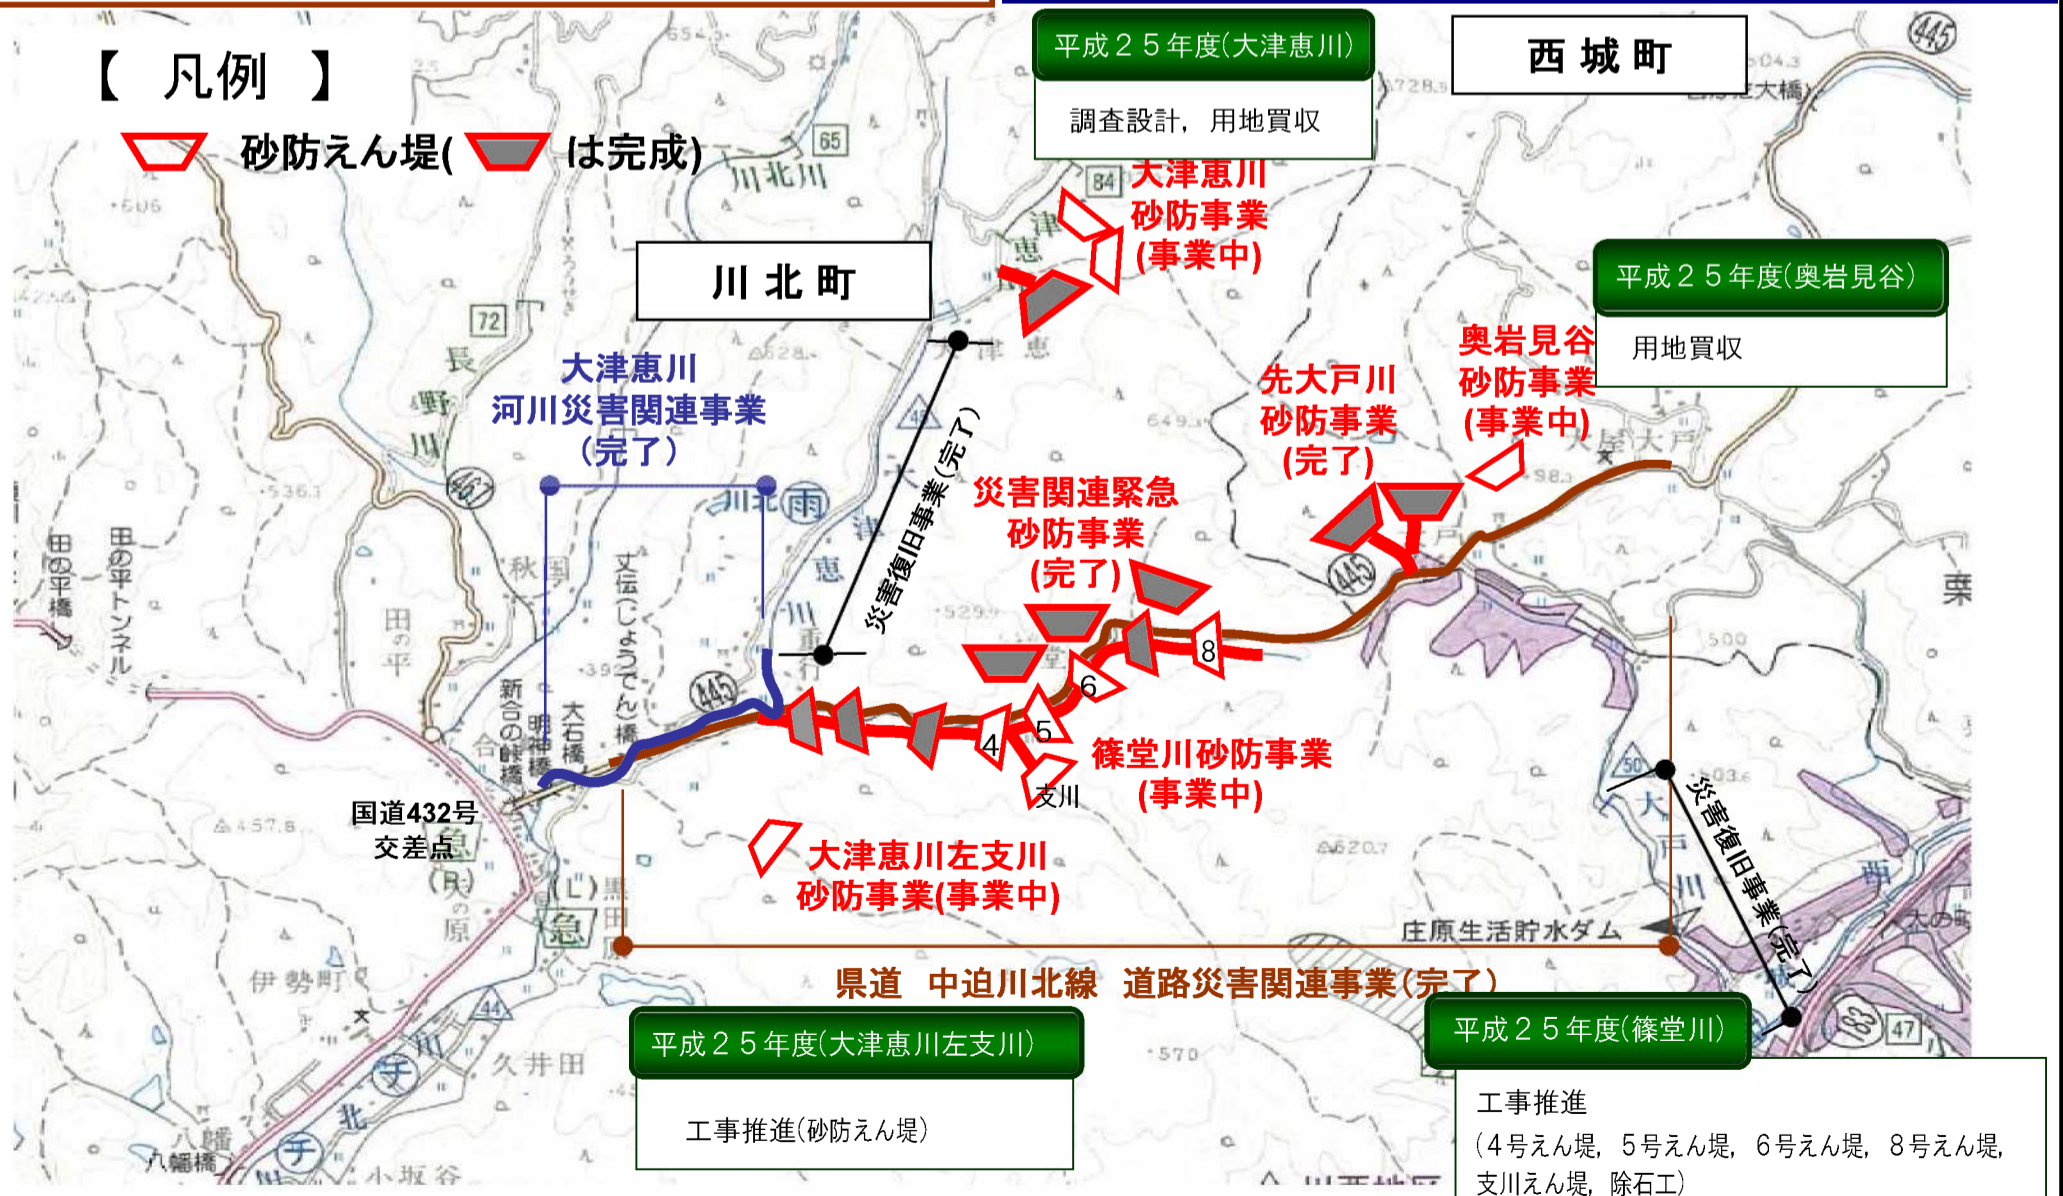
先大戸地区

2基の砂防えん堤に続き、L=375mの渓流保全工が完成しました。



【凡例】


砂防えん堤( は完成)



平成25年度(大津恵川左支川)
工事推進(砂防えん堤)

平成25年度(篠堂川)
工事推進
(4号えん堤, 5号えん堤, 6号えん堤, 8号えん堤, 支川えん堤, 除石工)

工事中箇所
の進捗状況

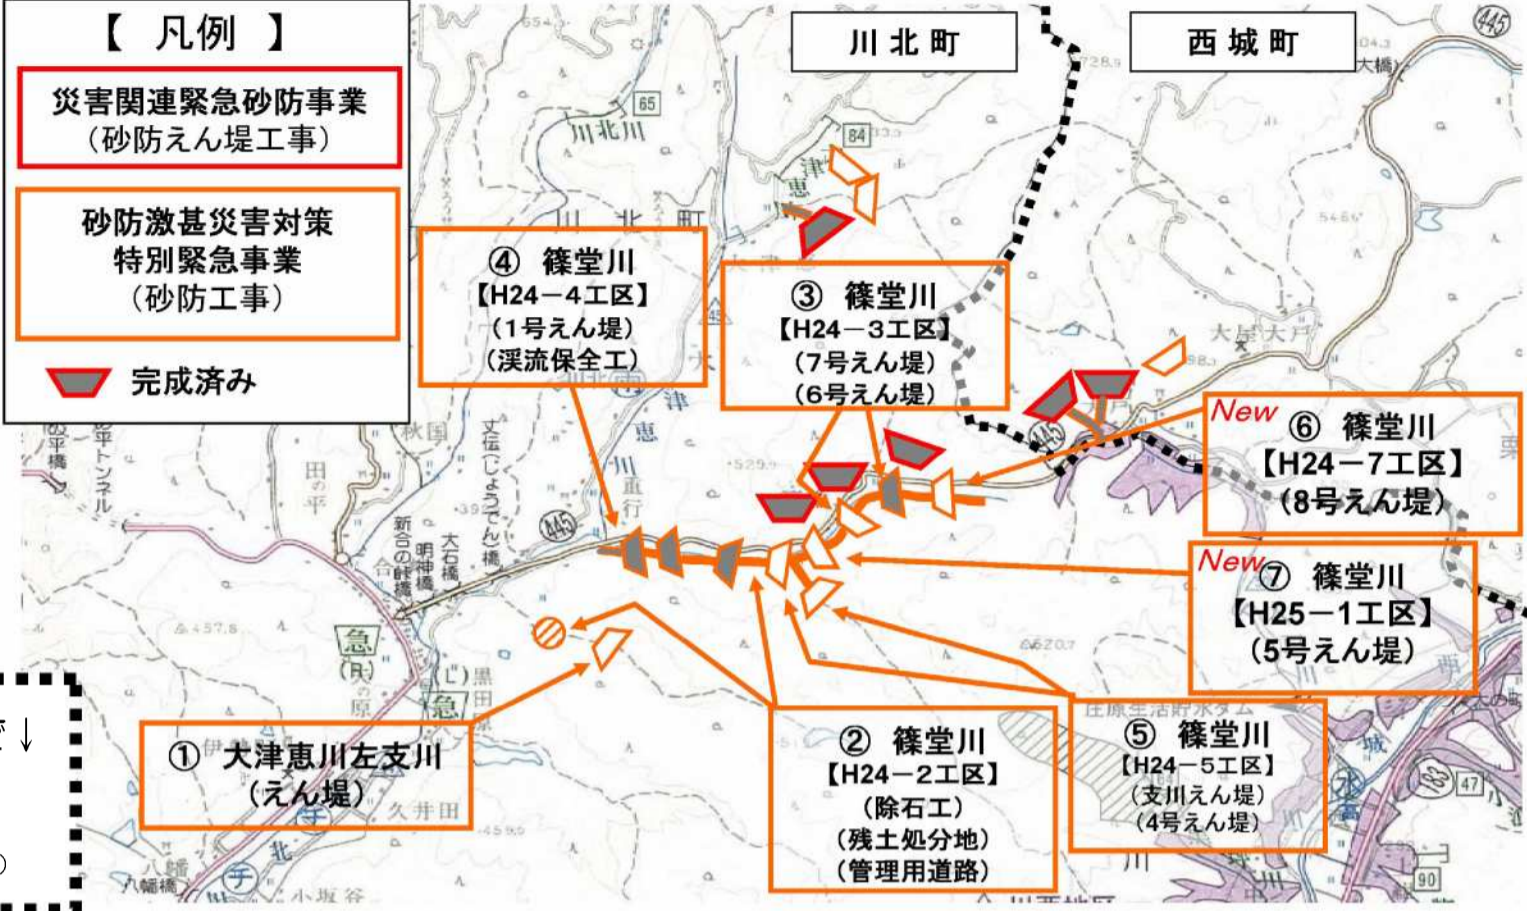

お知らせ

篠堂川5号えん堤・8号えん堤(右図⑥⑦)に工事着手しました。

※進捗率は平成二十五年5月末時点の発注工事単位ごとの進捗率を示します。

↓ご質問はこちらまで↓
広島県北部建設事務所庄原支所
災害復旧チーム
TEL 72-2015 (代表)

進捗率 70%

【6号えん堤】



③ 篠堂川【H24-3工区】
しのだうがわ

工事内容：砂防ソイルセメントえん堤 2 基，除石工
施工：有限会社中田建設
工期：H24.6～H25.10 (予定)

進捗率 55%

【除石工区】



② 篠堂川【H24-2工区】
しのだうがわ

工事内容：除石工，残土処分地，管理道
施工：株式会社加藤組
工期：H24.7～H25.12 (予定)

進捗率 15%

① 大津恵川左支川
おおつえがわひだりしせん



工事内容：砂防ソイルセメントえん堤 1 基
施工：宮田建設株式会社
工期：H25.1～H25.10 (予定)

進捗率 58%

【支川えん堤】



⑤ 篠堂川【H24-5工区】
しのだうがわ

工事内容：砂防ソイルセメントえん堤 1 基，除石工
コンクリートえん堤 1 基
工期：H24.9～H25.12 (予定)
施工：広成建設株式会社

進捗率 100%

【溪流保全工】



④ 篠堂川【H24-4工区】
しのだうがわ

工事内容：コンクリートえん堤 1 基，溪流保全工
工期：H24.8～H25.6
施工：宮田建設株式会社

工事のご協力ありがとうございました。



毎年6月は、土砂災害防止月間です。
日ごろの備え・早めの避難を心がけ
ましょう。

進捗率 0%

【5号えん堤】




⑦ 篠堂川【H25-1工区】
しのだうがわ

工事内容：コンクリートえん堤 1 基
施工：(株)角栄組
工期：H25.5～H26.1 (予定)

進捗率 4%

【8号えん堤】

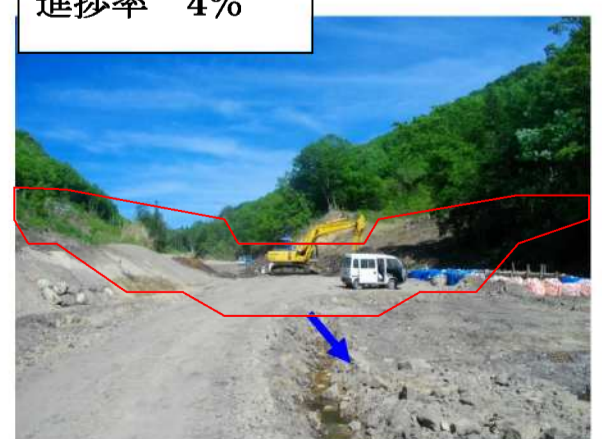

⑥ 篠堂川【H24-7工区】
しのだうがわ

工事内容：砂防ソイルセメントえん堤 1 基
施工：有限会社中田建設
工期：H25.4～H25.12 (予定)
