

一般国道 182 号法面崩壊復旧工事の進捗状況について（お知らせ）

平成 27 年 11 月 10 日

東 部 建 設 事 務 所

(Tel 084-921-1311)

現在、伐採及び工事用道路設置等が完了し、掘削、法面整形及び土砂運搬を行っているところです。平成 27 年 11 月 2 日時点で、上部 2 段（全法面高さ 35m のうち上部約 10m）まで掘削が進んでいます。

引き続き、施工中における交通の安全を確保するとともに、早期に 2 車線供用開始できるよう努めて参りますので、ご理解ご協力をよろしくお願いいたします。

■工事の進捗状況及び今後の予定

施工内容	施工時期
① 準備工 (伐採, 工事用道路設置等)	完了
② 土工 (掘削, 法面整形及び土砂運搬)	施工中
③ 法面保護工 (吹付法枠(上段部))	平成 27 年 11 月下旬 施工開始予定
④ 既設仮防護柵移設, 舗装工等	平成 28 年 1 月中旬 施工開始予定
2 車線供用開始予定	平成 28 年 1 月下旬
⑤ 法面保護工 [③の継続] (吹付法枠(下段部), モルタル吹付)	平成 28 年 1 月下旬
⑥ 仮防護柵撤去, 舗装工等	平成 28 年 2 月下旬
本復旧工事完成予定	平成 28 年 3 月中旬

① 発災直後（平成 27 年 7 月 23 日撮影）



② 暫定交通開放後（平成 27 年 8 月 18 日撮影）




③ 復旧工事進捗状況（平成 27 年 11 月 2 日撮影）



工事概要

工事延長	L = 128 m
掘削工	V = 11,780 m ³
吹付法枠工	A = 2,390 m ²
モルタル吹付工	A = 410 m ²

平面図

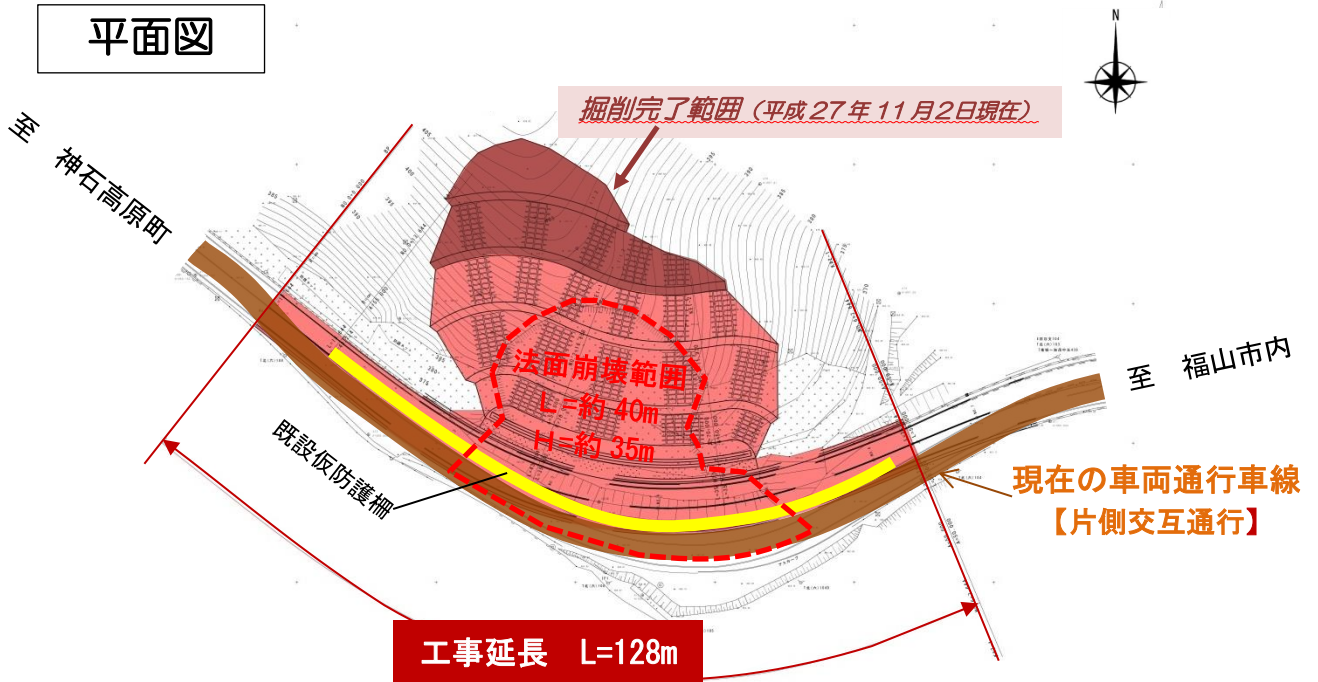

断面図

