

一般国道 182 号法面崩壊復旧工事の進捗状況について（お知らせ）

平成 28 年 1 月 20 日

東 部 建 設 事 務 所

(Tel 084-921-1311)

一般国道 182 号法面崩壊復旧工事は、現在、掘削、法面整形、土砂運搬、及び上部 2 段の吹付法枠が完了し、下部の吹付法枠を施工しているところです。

平成 27 年 12 月 23 日から 2 車線供用を開始したところですが、今後、一部の吹付法枠を施工する際に、一時的に片側交互通行による規制を予定しています。

引き続き、施工中における交通の安全を確保するとともに、早期に工事完成できるよう努めて参りますので、ご理解ご協力をよろしくお願いいたします。

■工事の進捗状況及び今後の予定

施工内容	施工時期
① 準備工 (伐採, 工事用道路設置等)	完了
② 土工 (掘削, 法面整形及び土砂運搬)	完了
③ 法面保護工 (吹付法枠(上段部))	完了 (上部 2 段完了)
④ 既設仮防護柵移設, 舗装工等	完了
2 車線供用開始予定	平成 27 年 12 月 23 日開始
⑤ 法面保護工 [③の継続] (吹付法枠(下段部), 枠内吹付, モルタル吹付等)	施工中
⑥ 仮防護柵撤去, 舗装工等	平成 28 年 2 月下旬
本復旧工事完成予定	平成 28 年 3 月中旬

① 発災直後（平成 27 年 7 月 23 日撮影）



② 暫定交通開放後（平成 27 年 8 月 18 日撮影）



③ 復旧工事進捗状況（平成 27 年 11 月 2 日撮影）



④復旧工事進捗状況（平成27年11月30日撮影）



⑤2車線供用開始後（平成27年12月25日撮影）



工事概要


工事延長 $L = 128\text{ m}$

掘削工 $V = 11,780\text{ m}^3$

吹付法枠工 $A = 2,390\text{ m}^2$

モルタル吹付工 $A = 410\text{ m}^2$

平面図

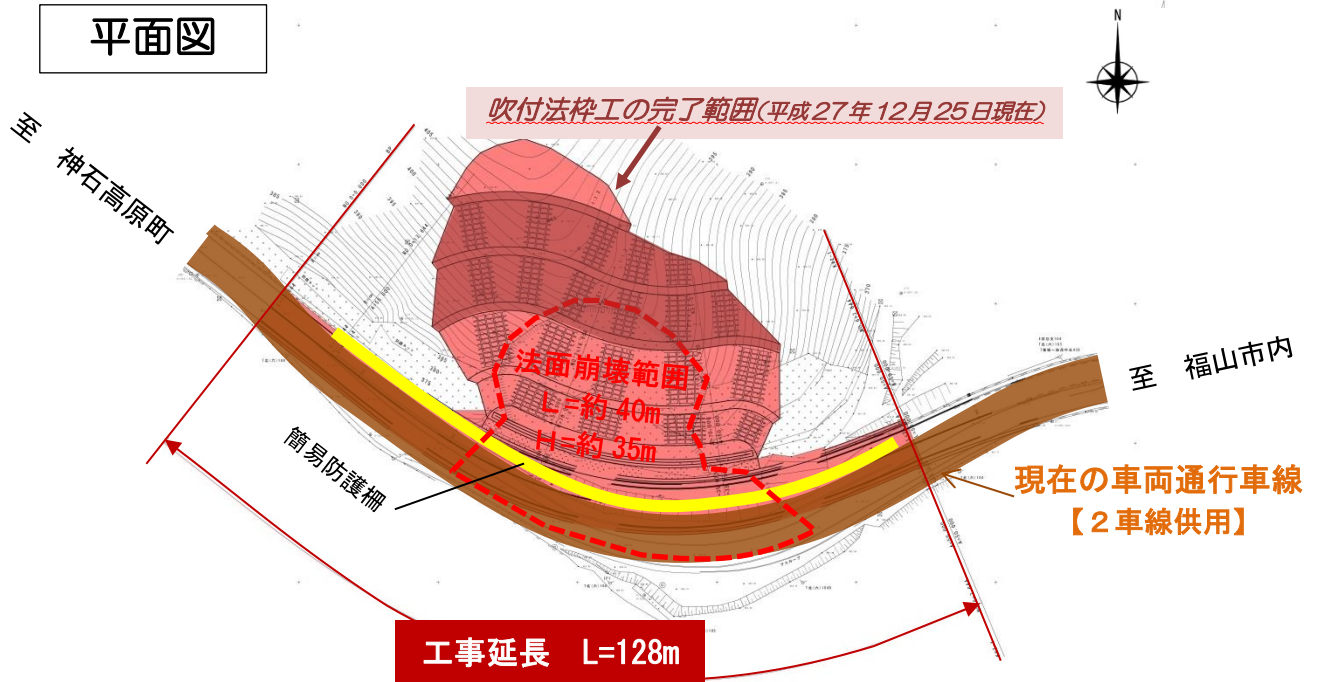

断面図

