



西部建設東広島災害復旧ニュース

(VOL5 令和2年5月28日発行)

平成30年7月豪雨災害からの復旧工事を進めています

一般国道432号(東広島市河内町小田〜中河内の間) 道路災害復旧工事が全て完成しました

一般国道432号の災害復旧工事にあたり

この度の一般国道432号の復旧工事におきましては、多くの地元関係者の皆様にご協力をいただきました。まずは、災害発生直後から応急復旧及び本復旧工事を施工していただいた地元建設業者の方々です。建設業者の方々には、この区間の復旧だけでなく、現在も管内全域にわたり、早期復旧に向けてご尽力いただいていることに対しまして、改めて感謝申し上げます。

そして今回、早期の復旧・供用開始が可能となったのは、地元河内町の住民の皆様のご理解・ご協力があったからこそでございます。国道432号は、県中央部の幹線道路であるだけでなく、住民生活にとっても非常に重要な路線であります。にもかかわらず、復旧工事に際し、約7か月間の長期間にわたり、全面通行止めのご協力をいただいたことに対しまして、深く感謝申し上げます。国道432号の復旧工事が完了が河内町の早期復興、そして更なる地域振興に繋がることを願っております。

東広島市内の主要な道路の復旧は進んできましたが、災害復旧・復興は道半ばでございます。今後、早期の復旧・復興に全力で取り組む所存でございます。引き続き、事業へのご理解・ご協力をお願いいたします。

広島県西部建設事務所東広島支所長 重政 英治





東広島支所管内の災害復旧工事の件数は、517箇所になります。早期の復旧を目指し、準備の整った箇所から、道路や河川などの災害復旧工事を進めています。

平成30年7月豪雨により甚大な被害が発生した公共土木施設については、発災直後から道路の土砂撤去や河川の破堤箇所などの応急復旧工事に取り組みとともに、被災地の早期の復旧・復興に向け、優先順位等を踏まえながら復旧工事に着手しています。災害復旧事業については、概ね3ヶ年で完了を目指して、進めているところです。県が管理する道路・河川など、県内全体が517箇所（東広島市402箇所、竹原市111箇所、大崎上島町1箇所、棕梨ダム関連3箇所）となっており、このうち約5割が工事契約済みであり、準備の整った箇所から、順次、工事を進めているところです。

引き続き、早期の復旧を目指し、鋭意、取り組んでいきますので、工事へのご理解とご協力をよろしくお願い致します。

一級河川 太田川水系 東川 河川災害復旧工事(東広島市志和町上尾橋上)【第1504号】
二級河川 瀬野川水系 椋坂川 河川災害復旧工事(東広島市志和町大流橋下)【第4699号】
平成30年7月豪雨により河川が氾濫し、護岸が被災しました。令和2年3月に河川の災害復旧工事が完了しました。

■被災直後

■復旧完了

■概要【第1504号】
復旧延長L=152.2m
(左岸L=133.2m, 右岸L=69.5m)
コンクリートブロック工 A=356㎡
【施工業者: 藤原メセナ建設(株)】

■概要【第4699号】
復旧延長L=54.4m
(左岸L=10.7m, 右岸L=43.7m)
コンクリートブロック工 A=156㎡
【施工業者: 藤原メセナ建設(株)】

施工：藤原メセナ建設(株)

一級河川太田川水系 半川 河川災害復旧工事(東広島市志和町志和堀中村橋上下)【2173号】
平成30年7月豪雨により河川が氾濫し、半川の護岸が流出したことにより家屋が危険な状況でした。令和2年3月に河川の災害復旧工事が完了しました。

■被災直後

■復旧完了

■概要【第2173号中村橋上下】
復旧延長 L=94.4m
(左岸L=76.1m, 右岸L=18.3m)
コンクリートブロック工 A=237㎡
【施工業者: 日輝トラスト】

施工：日輝トラスト

二級河川沼田川水系 沼田川 河川災害復旧工事(東広島市河内町河内一夜原橋上)【第1210号】
平成30年7月豪雨により河川が氾濫し、護岸が流出したことにより人家が危険な状況となりました。令和2年5月に河川の災害復旧工事が完了しました。

■被災直後

■復旧完了

■概要【第1210号 一夜原橋上】
復旧延長(左岸) L=140.7m
コンクリートブロック工 A=1,157㎡
【施工業者: (株)東豊建設】

施工：(株)東豊建設

(一)吉川大多田線 道路災害復旧工事(東広島市黒瀬町大多田小池峠下)【第5218号】
平成30年7月豪雨により一般国道 吉川大多田線が被災し、全面通行止めになりました。この後、道路災害復旧工事が完成し、2車線の通行が可能になりました。

■被災直後

■復旧完了

■概要【第5218号】
復旧延長 L=45.0m
造土工V=1,000m³、養生工A=730㎡
【施工業者: 黒瀬資源再利用センター(株)】

施工：黒瀬資源再利用センター(株)

二級河川黒瀬川水系 小田山川 河川災害復旧工事(東広島市西条町郷管)【第4723号】
平成30年7月豪雨により小田山川が氾濫し、護岸が流出したことにより農家や家屋が危険な状況でした。令和2年3月に河川の災害復旧工事が完了しました。

■被災直後

■復旧完了

■概要【第4723号】
復旧延長 L=60.0m
(左岸L=53.1m, 右岸L=23.5m)
コンクリートブロック工 A=509㎡
【施工業者: 平原建設(株)】

施工：平原建設(株)

(一)造賀田万里線 外 道路災害復旧工事(東広島市高屋町高屋堤)【第580号-第581号】
平成30年7月豪雨により一般県道 造賀田万里線及び高屋戸線の路肩が被災し、全面通行止めになりました。いずれの箇所も道路災害復旧工事が完成しました。

■被災直後

■復旧完了

■概要【第580号 萩原池南】
復旧延長 L=51.0m
コンクリートブロック工 A=66㎡
【施工業者: ラーフテクト(株)】

■概要【第581号 河戸堤】
復旧延長 L=14.0m
コンクリートブロック工 A=47㎡
【施工業者: ラーフテクト(株)】

施工：ラーフテクト(株)

二級河川黒瀬川水系 黒瀬川 河川災害復旧工事(東広島市八本松町正力)【第3970号】
平成30年7月豪雨により河川が氾濫し、護岸が流出したことにより被害が発生しました。令和2年5月に河川の災害復旧工事が完了しました。引き続き、早期の復旧に向け、他工区の復旧工事を進めています。

■被災直後

■復旧完了

■概要【第3970号 奥本宅上】
復旧延長 L=56.6m
(左岸L=34.5m, 右岸L=22.4m)
コンクリートブロック工 A=195㎡
【施工業者: 樋口建設(株)】

施工：樋口建設(株)



【東広島支所管内の緊急事業箇所】

(※番号は、「平成30年7月豪雨災害 砂防・治山施設整備計画」箇所番号)

市	事業名・箇所名	事業箇所	事業内容	概成目標時期	施工業者	進捗状況	
東広島市	180	杉坂下川隣	志和町志和堀	砂防ダム工	概成	藤原メセナ建設(株)	工事中
	184	小野川左3	志和町別府	砂防ダム工	R3年3月	藤原メセナ建設(株)	工事中
	185	貞岡川	志和町別府	砂防ダム工	概成	(株)三輝	工事中
	186	扇迫川隣	志和町別府	砂防ダム工	R2年6月	(株)三輝	工事中
	187	奥屋川右1	志和町奥屋	砂防ダム工	R2年9月	(株)上垣組	工事中
	190	東条川1	河内町中河内	砂防ダム工	概成	(株)東豊建設	工事中
	206	下大内原隣	河内町入野	砂防ダム工	概成	(株)上垣組	工事中
	208	古河川支川	八本松町原	砂防ダム工	R2年9月	(株)後藤組	工事中
	213	大宮川	西条町下三永	砂防ダム工	R3年3月	シンクコンストラクション(株)	工事中
	214	本頭川隣	西条町下三永	砂防ダム工	R2年9月	シンクコンストラクション(株)	工事中
	215	黒瀬川左6隣	西条町郷曾	砂防ダム工	R3年3月	(株)東豊建設	工事中
	223	蚊無中西谷	安芸津町三津	砂防ダム工	R2年9月	シンクコンストラクション(株)	工事中
224	小谷川	黒瀬町市飯田	砂防ダム工	概成	(株)明成	工事中	
竹原市	97	賀茂川支川7	竹原市西野町	砂防ダム工	R3年3月	シンクコンストラクション(株)	工事中
	98	賀茂川支川8	竹原市西野町	砂防ダム工	R2年9月	シンクコンストラクション(株)	工事中
	102	中条川	竹原市東野町	砂防ダム工	概成	(株)舂田組	工事中
	111	仮屋谷川	竹原市港町	砂防ダム工	概成	保手濱建設(株)	工事中
	100	下仁賀地区	竹原市仁賀町	法枠工	R2年6月	エヌエル産業(株)	工事中
	105	片山谷862地区	竹原市新庄町	法枠工	R2年9月	(株)福美建設	工事中
	114	観音谷地区	竹原市吉名町	法枠工	R2年6月	エヌエル産業(株)	工事中
	118	小平方地区	竹原市吉名町	法枠工	R2年9月	ジーエム建設(株)	工事中

(令和2年5月19日時点)

災害関連緊急事業の進捗状況の情報は、東広島支所ホームページから！

平成30年7月豪雨により、県内では1,242箇所の土砂災害が発生しました。土石流等により甚大な被害が発生した箇所においては、早期の復旧に向け、国・県・市町が連携を図り、緊急的な砂防・治山施設等の施工箇所を決定し、県内301箇所の緊急事業を実施しているところです。このうち東広島支所が緊急に事業を行う箇所は、左表のとおり21箇所です。5月中旬までに7箇所が概成したところですが、引き続き、早期の工事完了を目指し進めていきます。各工事箇所の進捗状況は、東広島支所ホームページをご覧ください。

地域の皆様には、大変ご迷惑をお掛けしますが、引き続き、事業へのご理解とご協力をお願いします。

土砂災害発生箇所における緊急的な砂防ダムや法面の崩壊防止のための法枠工等の整備をしています

【災害関連緊急砂防事業 進捗状況】

【仮屋谷川】災害関連緊急砂防事業 緊急事業分の堰堤工の完了について

平成30年7月豪雨に伴い、竹原市港町において発生した土砂災害(土石流)に対して、広島県が緊急的に実施している災害関連緊急砂防事業について、所定の高さまで堰堤工事が完了しました。(令和2年3月31日)引き続き、地域の安全度を高めるため、激特事業により砂防堰堤の嵩上げ工事などを実施します。

【被災状況】
土砂災害発生日:平成30年7月7日
土砂災害発生箇所:竹原市港町
死者:1名
全壊:6戸、半壊:13戸 外

【事業概要】
保全対象:人家20戸、道路L約410m
主な対策:砂防堰堤
高さ:11.5m、幅51m
(緊急事業分:高さ6.5m)
採択額:約1.5億円(緊急事業)

堰堤一般図: 51.0m x 6.5m

進捗状況: 緊急事業完了高さ H=6.5m

設計: 復建調査設計株式会社
施工: 保手濱建設株式会社
発注: 西部建設事務所東広島支所

工事完了 (令和2年3月31日)
施工: 保手濱建設(株)

【貞岡川】災害関連緊急砂防事業 堰堤工事(本堤部)の完了について

平成30年7月豪雨に伴い、東広島市志和町別府において発生した土砂災害(土石流)に対して、広島県が緊急的に実施している災害関連緊急砂防事業について、堰堤工事(本堤部)が完了しました。(令和2年3月31日)引き続き、地域の安全確保のため、堰堤周辺部の工事を実施します。

【被災状況】
土砂災害発生日:平成30年7月7日
土砂災害発生箇所:志和町別府
全壊:2戸
半壊:1戸 外


【事業概要】
保全対象:人家29戸、道路L約2050m
主な対策:砂防堰堤
高さ:9.5m、幅46m
採択額:約1.5億円(緊急事業)

堰堤一般図: 46.0m x 9.5m

進捗状況

設計: 株式会社建設技術研究所
施工: 株式会社三輝
発注: 西部建設事務所東広島支所

工事完了 (令和2年3月31日)
施工: (株)三輝

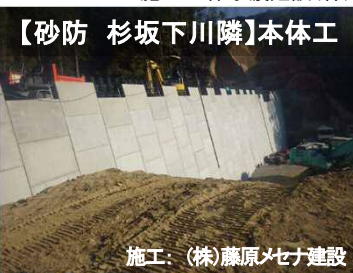

【災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業 進捗状況】



一般国道432号 道路災害復旧工事(東広島市河内町小田～中河内)
平成30年7月豪雨により被災した全11箇所(箇所)の道路災害復旧工事が完成し、地域の主権により「完成式典」が4月20日に開催されました。



国道432号河内町内(小田～中河内)の災害復旧工事が完成に伴い、地域の主権により開通式典が開催されました。

一般国道432号(東広島市河内町小田から中河内の区間)は、令和元年10月から全面通行止めとし、災害復旧工事を実施してまいりましたが、令和2年4月、被災した全11箇所の災害復旧工事と、併せて走行性や安全性を高めるための舗装補修や安全施設工事が完成しました。

この災害復旧工事等の完成に合わせて、地域(住民自治組織 you愛 sunこうち・共和の郷おだ)の主権により、完成式典が開催されました。

(※新型コロナウイルスに対する対策を講じたうえで、規模を縮小して開催)

西部建設事務所東広島支所管内 平成30年7月豪雨災害復旧工事 進捗状況一覧表(市町単位) 令和2年4月末時点

市町	災害箇所数 ^{※1}	発注済 ^{※2}		契約済 ^{※3}		完成		
		箇所数	進捗率	箇所数	進捗率	箇所数	進捗率	
								旧町
東広島市	安芸津町	69	29	42%	28	41%	7	10%
	河内町	86	55	64%	54	63%	24	28%
	高屋町	37	6	16%	6	16%	5	14%
	黒瀬町	36	31	86%	29	81%	17	47%
	志和町	62	18	29%	16	26%	9	15%
	西条町	34	33	97%	33	97%	23	68%
	八本松町	24	19	79%	18	75%	2	8%
	福富町	25	11	44%	11	44%	3	12%
	豊栄町	29	11	38%	11	38%	0	0%
	小計	402	213	53%	206	51%	90	22%
竹原市	111	54	49%	54	49%	23	21%	
大崎上島町	1	1	100%	1	100%	1	100%	
三原市	3	3	100%	3	100%	3	100%	
全体	517	271	52%	264	51%	117	23%	

(※1) 県が管理する公共土木施設で工事費120万円以上の災害復旧事業として採択された箇所数を表す。
(※2) 発注手続きが済んでいるものを表す。
(※3) 発注手続きが済んでいる箇所のうち、契約手続きが済んでいるものを表す。

【広島県ホームページ】

災害復旧工事の進捗状況をホームページで公表しています

県では、創造的復興による新たな広島県づくりを目指した「平成30年7月豪雨災害からの復旧・復興プラン」に基づき、道路や河川などの災害復旧工事を行っています。令和2年4月末時点の進捗状況は左表のとおりです。また、県ホームページにも災害復旧に関する情報を掲載しています。引き続き、早期の復旧に取り組みたいです。引き続き、早期の復旧に関する情報をお願ひします。

【土砂災害ポータルひろしま】

【広島県河川防災情報システム】

【広島県防災Web】

問合せ先：広島県西部建設事務所東広島支所

- ・災害関連緊急対策チーム【緊急の砂防ダム等の整備に関すること】
- ・工務第一課【災害復旧事業(東広島市全域(安芸津町を除く))】
- ・工務第二課【災害復旧事業(竹原市、大崎上島町、東広島市安芸津町)】
- ・維持課【災害復旧事業以外(道路の維持・修繕、河川の浚渫など)】
- ・事業調整特別班【各種事業調整・土砂災害防止法に関すること】

住所：東広島市西条昭和町13-10 電話：082-422-6911 FAX：082-422-7499

【ひろしま道路ナビ(道路防災情報システム)】

出水期(梅雨・台風など)を迎えますので、防災情報をご確認ください
