

## 東部こども家庭センター—一時保護所増改築事業の進捗状況について

### 1 要旨・目的

東部こども家庭センターの一時保護所について、適切に被虐待児童等を保護できる体制を整えらるとともに、一時保護所の環境改善を図るため、令和3年8月に実施設計が完了したことから、令和4年3月に増改築工事に着手し、令和5年7月頃の供用開始を目指すこととする。

### 2 現状・背景

令和2年度に行った地質調査により、軟弱地盤の改良工事が必要となることが判明したため、今年度の実実施設計で工期の短縮等を検討したものの、供用開始時期が当初の予定（令和4年度中）より遅れることとなったが、できるだけ早く供用開始できるよう早期に契約・着工する。

### 3 概要

#### (1) 対象者

要保護児童

#### (2) 事業内容（実施内容）

##### ア 整備場所


東部こども家庭センター敷地内（現駐車場）  
（福山市瀬戸町山北 291-1）

##### イ 定員数

18人（男・女児各7人，幼児4人）  
〔現在：定員16人〕

##### ウ 施設規模

階数：地上4階建て（RC造）  
延面積：約2,198㎡

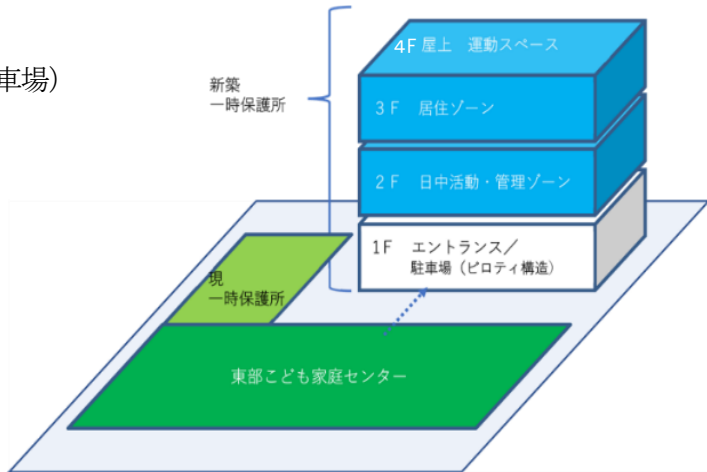

#### (3) スケジュール

令和4年3月に増改築工事に着手し、令和5年7月頃の供用開始を目指す。

令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
基本・実施設計	入札 手続	●本契約 R4.3(議決後)	
		増改築工事 (R4.3~R5.6 予定)	供用開始

#### (4) 予算

実施設計 42,180 千円（単県）（R3）  
本体工事費 1,583,039 千円（一部国庫）（R3～R5）
