

資料番号	9
------	---

令和5年8月18日
課名 土木建築局河川課
担当者 課長 水頭
内線 3928
課名 土木建築局港湾漁港整備課
担当者 課長 高橋
内線 4002

「ひろしま海岸防災プラン2021」の進捗状況について

1 要旨・目的

「ひろしま海岸防災プラン2021（以下、「計画」という）」に掲げる成果目標等の進捗状況について、総点検を行ったので、その結果を報告する。

2 現状・背景

社会資本未来プランの関連計画として、本計画を令和3年3月に策定（計画期間：令和3年度～令和7年度）し、計画的に事業を推進している。

この度、計画策定から2年が経過したことから、進捗状況の取りまとめを行うとともに、進捗状況を踏まえた今後の見通しも含めて報告するものである。

3 概要

(1) 対象者

県民

(2) 事業内容（実施内容）

ア 事業量確保の状況

投資額については、国の「防災・減災、国土強靱化のための5か年加速化対策」など有利な財源を最大限活用しながら事業量の確保に努め、計画期間（令和3年度～令和7年度）の投資予定額約143億円※に対し、令和5年度当初予算までの実績は99億円※となっている。

※農地海岸を除く。

イ 事業実施状況（令和5年7月末時点）

計画箇所数44箇所のうち、34箇所で事業に着手しており、このうち完成箇所については、計画している13箇所に対して、1箇所の完成となっている。

区 分	計画箇所数 (R3～R7)			事業化箇所数	
	完成	継続	計		うち完成
港 湾	8	19	27	24	1
建 設	2	4	6	5	0
漁 港	3	8	11	5	0
合 計	13	31	44	34	1

※事業化箇所数には、調査設計などに着手している箇所を含む。

ウ 主な新規着手箇所（R3～R5）

区分	海岸名	地区名	市町名
港湾	①大西港海岸	①大西地区	①大崎上島町大西
	②三高港海岸	②中ノ浜地区	②江田島市沖美町
建設	①大野海岸	①柿ノ浦地区	①廿日市市宮島口
	②廿日市海岸	②扇新開地区	②廿日市市地御前～串戸
漁港	豊島漁港海岸	内浦地区、立花地区	呉市豊浜町

エ 主な完成箇所

区分	海岸名	地区名	市町名
港湾	広島港海岸	坂地区	坂町横浜東

オ 成果指標による点検結果

ハード対策については、適切な工事発注や工事工程の把握、調整などを行いながら計画的に事業を実施しているところであり、加えて、計画に影響を与えるような重大な課題なども発生しておらず、概ね順調に進捗している。

また、津波や高潮から地域住民の生命をまもるためのソフト対策についても、計画的に実施しており、順調に進捗している。

施策項目	目標・指標					
	項目	現状値 (R2)	目標値 (R7)	目標値 (R4)	実績 (R4)	進捗 状況
ハード対策（防災・減災対策の充実・強化）	高潮（津波）防護達成人口	254千人	263千人	—	257千人	順調
	高潮（津波）防護達成人口率	63.4%	65.7%	—	64.2%	順調
	市街地堤防耐震化人口	113千人	121千人	—	116千人	概ね順調
	市街地堤防耐震化人口率	87.5%	94.2%	—	90.1%	概ね順調
ソフト対策（災害対応力と地域防災力の向上）	高潮浸水想定区域公表率	0% (0市町)	100% (14市町)	—	100% (14市町)	順調

(3) スケジュール

—

(4) 予算（R5当初予算、R4補正予算）

34億円

(5) 今後の対応

引き続き、計画に掲げる目標・指標の達成に向け、事業実施状況の点検や適切な工程管理などを行いながら、着実な事業進捗を図る。

4 その他（関連情報等）

—

海岸

広島港海岸 高潮対策事業(坂地区)(坂町)

背景・整備効果


当海岸の背後には国道31号及び人家が密集しており、護岸の天端高不足から平成16年の台風18号等により度重なる越波被害を受けていた。このため、高潮・津波による被害の防護を目的とした護岸整備により、防災、減災対策の強化が図られ、海岸背後の生命・財産を守る効果が期待される。

事業の概要

事業内容： 護岸(改良) L=380m


完成時期： 令和5年6月

進捗段階： 完成

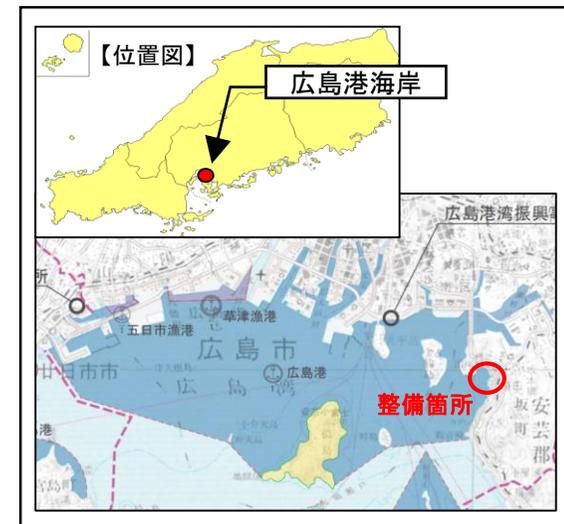

整備前(平成29年8月)

浸水状況

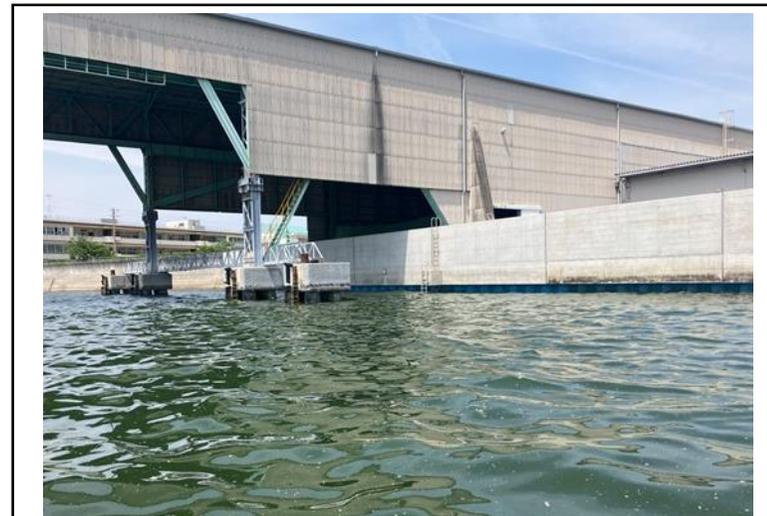

完成(令和5年6月)
