

平成30年7月豪雨災害に伴う 三篠川災害復旧助成事業の進捗状況について

1 要旨・目的

平成30年7月豪雨に対する家屋浸水被害の解消を目的として実施している一級河川太田川水系三篠川災害復旧助成事業について、現在の進捗状況について報告する。

2 現状・背景

当事業は、5区間の改良復旧区間において、築堤・護岸整備、河道拡幅等による河積の確保を進めており、令和5年8月末時点で約7割の区間の工事が完了している。

取得に時間を要していた一部の事業用地について、土地収用に向けた事業認定申請の協議を進めつつ、地権者との交渉を継続して進めたところ、令和5年6月末に用地買収契約を締結した。

3 概要

(1) 対象者

浸水のおそれのある地域に居住している住民（三篠川流域）

(2) 事業内容（実施内容）

築堤・護岸の整備、河道拡幅及び河床掘削による河積の確保

(3) スケジュール（事業期間）

ア 事業期間

（変更前）平成30年度～令和5年度

（変更後）平成30年度～令和6年度

イ 理由

令和5年6月末の用地買収契約後、用地引き渡しまでに必要な物件の移設に要する時間を考慮した上で、残工事量と今年度に施工可能な工事量を精査した結果、事業完了時期を令和5年度から令和6年度に変更する。

(4) 予算（補助事業）

4,254百万円（事故繰越、明許繰越）

(5) 今後の対応

引き続き関係者に丁寧な説明を行うとともに、令和6年度の完了に向け、適切な工程管理等を行い、事業執行を図る。

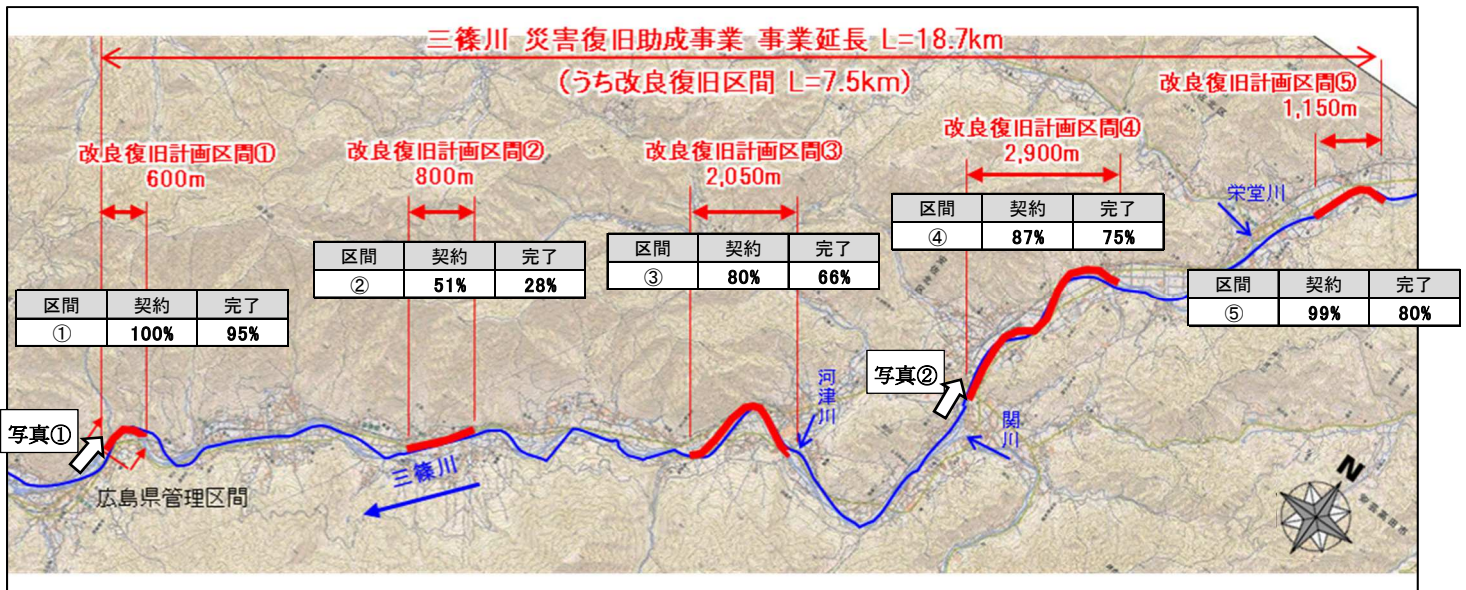


図1 三篠川災害復旧助成事業位置図（令和5年8月末時点）

事業イメージ図

