


平成30年7月豪雨に伴い、安芸郡海田町南幸町において発生した土砂災害（がけ崩れ）に対して、広島県が実施している再度災害防止事業が完了しました。（令和3年12月20日）

## 位置図



南幸町13地区

## 平面図

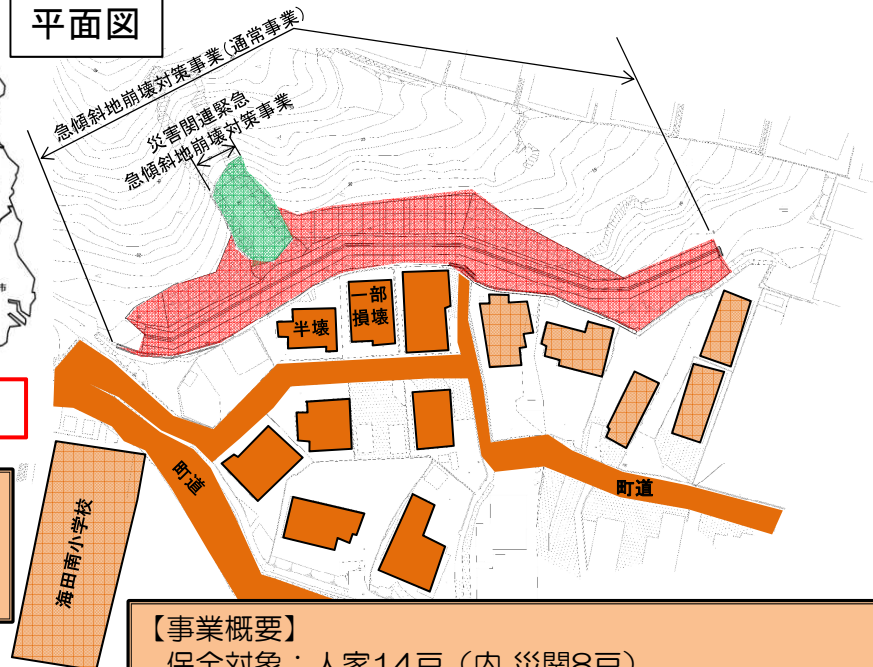

斜面崩壊・被災状況（H30年7月）



工事完了（令和3年12月20日）

## 【被害状況】

土砂災害発生日：平成30年7月6日  
半壊：1戸  
一部損壊：1戸

## 【事業概要】


保全対象：人家14戸（内 災関8戸）  
主な対策：法枠工 約743㎡（内 災関 約204㎡）  
待受擁壁工 約103m  
事業費：約196,700千円（内 災関約 17,100千円）

## 工事着手前



設計：日本工営株式会社  
施工：河井建設工業株式会社  
発注：西部建設事務所

## 標準断面図

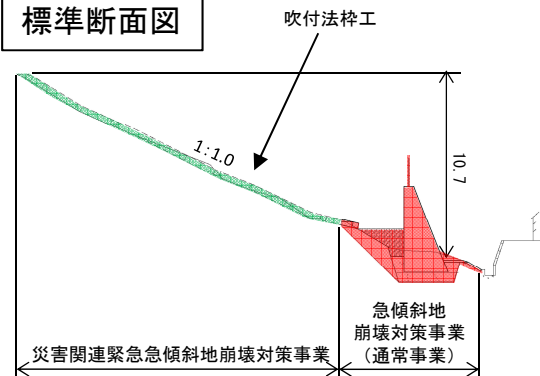

急傾斜地崩壊対策事業（通常事業）  
令和3年12月20日完

災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業  
令和2年3月30日完
