

「平成 30 年 7 月豪雨災害 砂防・治山施設整備計画」における緊急事業の進捗状況について

1 要 旨

平成 30 年 7 月豪雨により土砂災害が発生し、甚大な被害を受けた箇所において、早期の復旧に向け、国・県・市町が連携を図り、緊急的な砂防・治山施設の施工箇所、工事内容等の事業計画に関して調整を進め、「平成 30 年 7 月豪雨災害 砂防・治山施設整備計画（緊急事業・激特事業等）」を作成し、令和元年 5 月 17 日に公表している。

砂防ダムなどの整備については、これに基づき事業実施しているところであり、この整備計画における緊急事業の6 月末時点の進捗状況について報告する。

2 整備計画の進捗状況

(1) 緊急事業

施設整備計画にある砂防・治山の事業箇所のうち、住宅に直接被害のあった箇所や渓流内の不安定な土砂により崩壊が拡大するおそれがある箇所など、特に緊急性の高い 301 箇所については緊急事業として整備することとしている。

令和 2 年 6 月末時点で合計 291 箇所（砂防関係 197 箇所、治山関係 94 箇所）が工事契約済となり、そのうち 112 箇所（砂防関係 85 箇所、治山関係 27 箇所）は工事が完了している。

(2) 各機関の進捗状況（令和 2 年 6 月末時点）

各機関の進捗状況は、次のとおりである。

（単位：箇所）

区分	事業主体	事業種別	緊急事業 箇所数	地元調整 発注準備	契約済	前月からの 増	現場着手	完了	
								完了	前月からの 増
砂防	国土交通省	砂防事業	20	0	20	0	20	17	1
	広島県 （砂防課）	砂防事業	85	1	84	1	82	20	4
		急傾斜地崩壊対策事業	26	0	26	0	26	21	3
	広島県砂防事業計		111	1	110	1	108	41	7
	市町	急傾斜地崩壊対策事業	68	1	67	0	65	27	2
小 計（砂 防）			199	2	197	1	193	85	10
治山	農林水産省	治山事業	39	1	38	0	38	14	1
	広島県 （森林保全課）	治山事業	59	4	55	1	54	13	5
	市町	治山事業	4	3	1	1	1	0	0
小 計（治 山）			102	8	94	2	93	27	6
緊 急 事 業 合 計			301	10	291	3	286	112	16

(3) 各市町別の緊急事業の契約状況（令和2年6月末時点）

市町	対応主体	砂防事業								急傾斜事業								治山事業												市町箇所数 合計			
		国				県				県				市町				国				県				市町							
		緊急事業箇所	工事契約済	現場着手	完了	緊急事業箇所	工事契約済	現場着手	完了	緊急事業箇所	工事契約済	現場着手	完了	緊急事業箇所	工事契約済	現場着手	完了	緊急事業箇所	工事契約済	現場着手	完了	緊急事業箇所	工事契約済	現場着手	完了	緊急事業箇所	工事契約済	現場着手	完了	緊急事業箇所	工事契約済	現場着手	完了
広島市	12	12	12	9	8	7	7	1	3	3	3	2	5	4	4	3	4	4	4	3	12	11	11	2	-	-	-	-	44	41	41	20	
	①東区	2	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	3	3	3	0	-	-	-	-	6	6	6	2	
	②南区	-	-	-	-	2	2	2	0	1	1	1	1	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	4	2	
	③西区	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	3	2	
	④安佐北区	4	4	4	4	1	1	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	7	7	2	-	-	-	-	12	12	12	6	
	⑤安芸区	6	6	6	4	5	4	4	1	2	2	2	1	-	-	-	3	3	3	2	2	1	1	0	-	-	-	-	18	16	16	8	
⑥呉市	5	5	5	5	22	22	22	1	6	6	6	5	1	1	1	1	7	7	7	7	6	6	6	2	2	1	1	0	49	48	48	21	
⑦竹原市	-	-	-	-	4	4	4	2	4	4	4	2	9	9	9	4	1	1	1	0	8	8	8	0	-	-	-	-	26	26	26	8	
⑧三原市	-	-	-	-	8	8	8	2	-	-	-	-	6	6	6	4	8	8	8	2	4	3	3	0	-	-	-	-	26	25	25	8	
⑨尾道市	-	-	-	-	5	5	5	2	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	8	8	8	5		
⑩福山市	-	-	-	-	1	1	1	0	2	2	2	2	10	10	10	9	1	0	0	0	3	3	3	3	-	-	-	-	17	16	16	14	
⑪府中市	-	-	-	-	1	1	1	0	1	1	1	1	4	4	4	0	-	-	-	2	2	2	1	-	-	-	-	8	8	8	2		
⑫庄原市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	0		
⑬東広島市	-	-	-	-	13	13	13	7	-	-	-	-	7	7	7	0	12	12	12	1	13	13	13	4	-	-	-	-	45	45	45	12	
⑭廿日市市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	
⑮安芸高田市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	1	1	1	0	-	-	-	-	2	2	2	1		
⑯江田島市	-	-	-	-	4	4	4	2	2	2	2	1	18	18	16	1	-	-	-	2	2	2	0	-	-	-	-	26	26	24	4		
⑰府中町	-	-	-	-	1	1	0	0	-	-	-	-	3	3	3	3	-	-	-	1	1	1	0	-	-	-	-	5	5	4	3		
⑱海田町	-	-	-	-	1	1	1	0	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	1		
⑲熊野町	-	-	-	-	5	5	5	2	1	1	1	1	1	-	-	-	6	6	6	1	4	2	1	0	2	0	0	0	18	14	13	4	
㉑坂町	3	3	3	3	12	12	11	1	4	4	4	4	2	2	2	0	-	-	-	1	1	1	0	-	-	-	-	22	22	21	8		
㉒世羅町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	0	-	-	-	-	1	1	1	0		
	合計	20	20	20	17	85	84	82	20	26	26	26	21	68	67	65	27	39	38	38	14	59	55	54	13	4	1	1	0	301	291	286	112

[緊急事業箇所の実施状況]



県砂防事業 荻之尾川隣
(福山市神村町)



県急傾斜事業 小平方地区
(竹原市吉名町)



県治山事業 水ヶ浦地区
(江田島市江田島町)

(4) 令和2年6月に完了した箇所

令和2年6月に完了した箇所は次のとおりである。

(単位：箇所)

事業名	事業主体	箇所名	施工位置	概成年月日
災害関連緊急 砂防事業	国土交通省	大谷川	広島市東区	R2.6.30
	広島県	中ヶ原川	呉市安浦町	R2.6.1
		防地川隣	尾道市防地町	R2.6.30
		扇迫川隣	東広島市志和町	R2.6.30
		本頭川隣	東広島市西条町	R2.6.30
災害関連緊急 急傾斜地崩壊対策事業	広島県	下仁賀地区	竹原市仁賀町	R2.6.25
		矢野西3丁目地区	広島市安芸区	R2.6.30
		観音谷地区	竹原市吉名町	R2.6.30
災害関連 地域防災がけ崩れ対策事業	竹原市	宮原9457地区	竹原市下野町	R2.6.10
	三原市	平佐地区	三原市沼田東町	R2.6.30
国有林野直轄治山災害関連緊急事業	農林水産省	黒瀬地区	東広島市黒瀬町	R2.6.30
災害関連緊急 治山事業	広島県	坂井谷地区	東広島市西条町	R2.6.1
		大田地区	東広島市安芸津町	R2.6.1
		矢多田地区	府中市上下町	R2.6.23
		山行地区	尾道市栗原町	R2.6.24
		神村五区地区	福山市神村町	R2.6.26

3 公表内容の詳細について

- ・砂防課のホームページ内で、令和元年5月17日公表済みの「平成30年7月豪雨災害 砂防・治山施設整備計画（緊急事業・激特事業等）事業箇所一覧表～災害関連緊急事業の進捗状況（契約済み、現場着手、完了）の情報を定期的に更新するとともに、概成した箇所についても積極的に情報発信する。
- ・各関係機関（国交省広島西部山系砂防事務所、林野庁近畿中国森林管理局、森林保全課、広島県西部建設事務所、呉支所、東広島支所、東部建設事務所、三原支所）のホームページへのリンクを貼り、緊急事業に関する進捗状況について情報発信の充実を図っている。

<https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/100/201807gouusisetsuseibikeikaku-kinkyuugekitoku.html>

- ・引き続き、被災者の皆様、地域住民の方々への丁寧な説明により、ご理解をいただくとともに、あわせて、工事の進捗状況を写真で示すなど定期的な更新を行い、県民の皆様への情報発信の充実を図っていく。

【砂防課 ホームページ】

【呉支所 ホームページ】



【三原支所 ホームページ】



【森林保全課 ホームページ】



【6/24 中ヶ原川 地元住民への現場見学会】



【7/2 天地川支川5 小学生に対する現場見学】



【7/2 天地川支川1 報道機関向け現場公開】

4 資料

平成30年7月豪雨災害 砂防・治山施設整備計画（緊急事業・激特事業等）事業箇所一覧表（緊急事業のみ抜粋）

【中ヶ原川】災害関連緊急砂防事業 堰堤工事（本堤部）の完了について



平成30年7月豪雨に伴い、呉市安浦町下垣内において発生した土砂災害（土砂流）に対して、広島県が緊急的に実施している災害関連緊急砂防事業について、堰堤工事（本堤部）が完了しました。（令和2年6月1日）引き続き、地域の安全確保のため、堰堤周辺部の工事を実施します。

位置図



平面図



【被害状況】

土砂災害発生日：平成30年7月6日
全壊：6戸
半壊：5戸 外


【事業概要】

保全対象：人家11戸、道路L=778m
主な対策：砂防堰堤
高さ9.0m、幅88m
採択額：約4.3億円（緊急事業）

被災状況



堰堤一般図



設計：川崎地質株式会社
施工：株式会社増岡組
発注：西部建設事務所呉支所

■進捗状況



工事完了（令和2年6月1日）

【防地川隣】災害関連緊急砂防事業 法面工事の完了について




平成30年7月豪雨に伴い、尾道市防地町において発生した土砂災害に対して、広島県が緊急的に実施した災害関連緊急砂防事業の法面部分の法枠工事が完了しました（令和2年6月30日）。引き続き、地域の安全確保のため、付属施設等の工事を実施します。

位置図



平面図

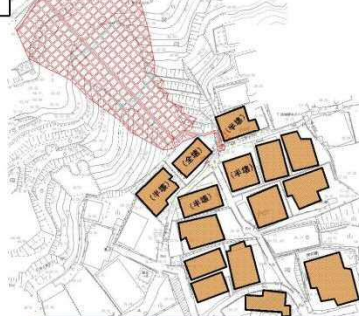

【被害状況】

土砂災害発生日：平成30年7月7日
全壊：1戸
半壊：4戸


【事業概要】

保全対象：人家15戸
主な対策：法枠工 約1,148 m²
事業費：約104,000千円

工事着手前



標準断面図

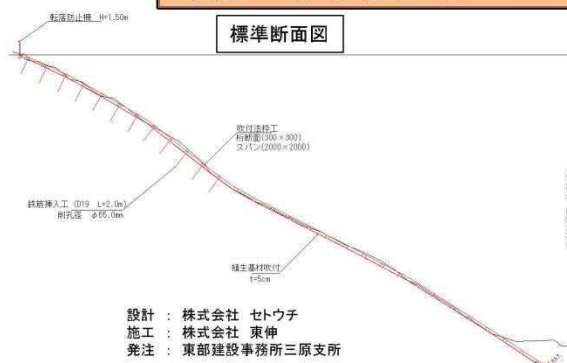


設計：株式会社 セトウチ
施工：株式会社 東伸
発注：東部建設事務所三原支所

斜面崩壊・被災状況（平成30年7月）



工事完了（令和2年6月30日）

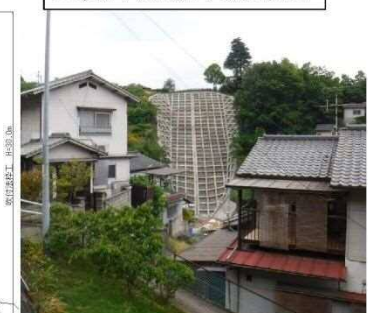

平成30年7月豪雨に伴い、東広島市志和町別府において発生した土砂災害（土石流）に対して、広島県が緊急に実施している災害関連緊急砂防事業について、堰堤工事（本堤部）が完了しました。（令和2年6月30日）引き続き、地域の安全確保のため、堰堤周辺部の工事を実施します。

位置図




【被害状況】

土砂災害発生日：平成30年7月6日
半壊：1戸 外

被災状況



平面図

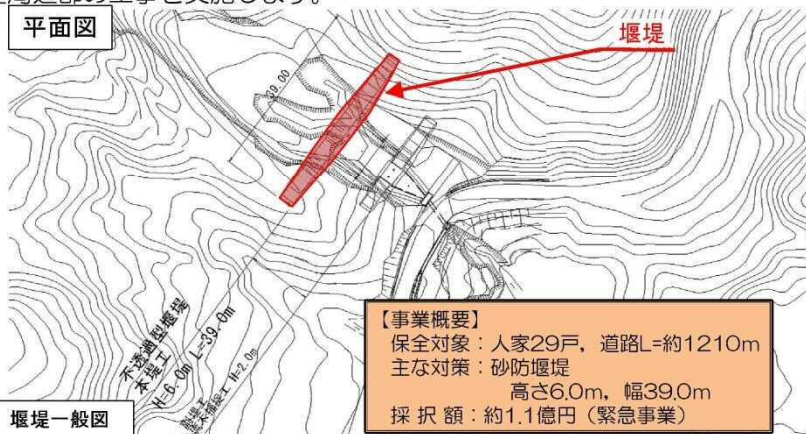

堰堤一般図

39.00m

【事業概要】

保全対象：人家29戸、道路L=約1210m
主な対策：砂防堰堤
高さ6.0m、幅39.0m
採択額：約1.1億円（緊急事業）

■進捗状況



工事完了（令和2年6月30日）

平成30年7月豪雨に伴い、東広島市西条町において発生した土砂災害（土石流）に対して、広島県が緊急に実施している災害関連緊急砂防事業について、所定の高さまで堰堤工事が完了しました。（令和2年6月30日）引き続き、地域の安全度を高めるため、激突事業により砂防堰堤の嵩上げ工事などを実施します。

位置図




【被害状況】

土砂災害発生日：平成30年7月7日
死者：3名
全壊：1戸
国道：約100m
市道：約200m

被災状況



平面図

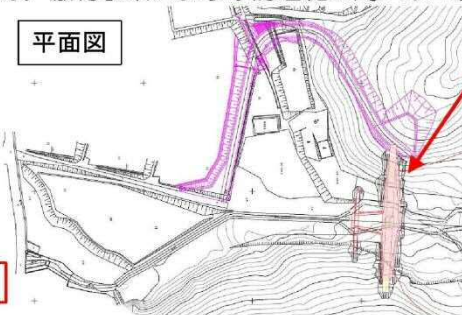

堰堤一般図

68.0m

【事業概要】

保全対象：人家5戸
国道L=約220m
市道L=約780m
主な対策：砂防堰堤 1基
高さ10.0m、幅68.0m
（緊急事業分：高さ8.0m）
採択額：約2.7億円（緊急事業）

：災害関連緊急砂防事業
：砂防激突災害対策特別緊急事業

緊急事業完了高さ

H=8.0m

工事完了（令和2年6月30日）



設計：株式会社荒谷建設コンサルタント
施工：シンクンストラクション株式会社
発注：西部建設事務所東広島支所

【下仁賀地区】災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業の完了について




平成30年7月豪雨に伴い、竹原市仁賀町において発生した土砂災害（がけ崩れ）に対して、広島県が緊急的に実施した急傾斜地崩壊対策事業が完了しました（令和2年6月25日）。

引き続き、地域の安全度を高めるため、隣接する範囲において、通常事業により擁壁工事などの対策工事を実施します。



位置図

平面図

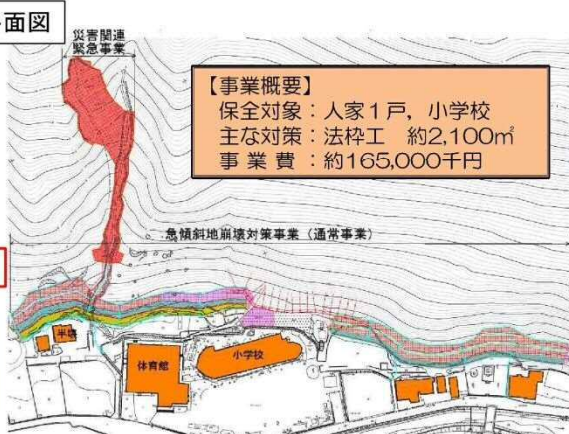

斜面崩壊・被災状況（H30年7月）




【被害状況】
土砂災害発生日：平成30年7月7日
斜面崩壊：L=37.0m、H=90.0m
半壊：1戸

工事着手時（伐採後）



標準横断面図

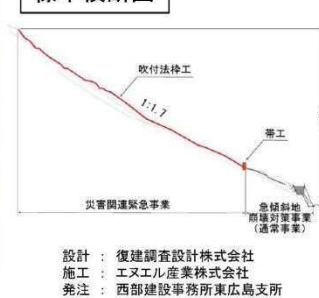

工事完了
（令和2年6月25日）



【矢野西3丁目37地区】災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業の完了について



平成30年7月豪雨に伴い、安芸区矢野西3丁目37地区において発生した土砂災害（がけ崩れ）に対して、広島県が緊急的に実施した急傾斜地崩壊対策事業が完了しました（令和2年6月30日）。

引き続き、地域の安全度を高めるため、隣接する範囲において、通常事業により法枠工などの対策工事を実施します。



位置図

平面図



斜面崩壊・被災状況（H30年7月）




【被害状況】
土砂災害発生日：平成30年7月6日
斜面崩壊 L=13.0m、H=15.0m

工事着手前



標準断面図

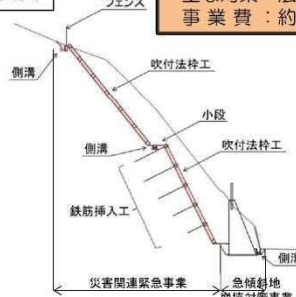

【事業概要】
保全対象：人家5戸
主な対策：法枠工 約325㎡
事業費：約50,000千円

工事完了（令和2年6月30日）



【観音谷地区】災害関連緊急傾斜地崩壊対策事業の完了について



平成30年7月豪雨に伴い、竹原市吉名町において発生した土砂災害（がけ崩れ）に対して、広島県が緊急的に実施した災害関連緊急傾斜地崩壊対策事業が完了しました。（令和2年6月30日）

位置図



平面図



【事業概要】

保全対象：人家6戸
主な対策：法枠工 約360㎡
事業費：約70,000千円

【被害状況】

土砂災害発生日：平成30年7月7日
一部損壊：1戸

工事着手前



標準断面図



設計：日本工営株式会社
施工：エヌエル産業株式会社
免注：西部建設事務所東広島支所



斜面崩壊・被災状況（H30年7月）



工事完了（令和2年6月30日）



【宮原9457地区】災害関連地域防災がけ崩れ対策事業の完了について（竹原市）

平成30年7月豪雨に伴い、竹原市下野町において発生した土砂災害（がけ崩れ）に対して、竹原市が緊急的に実施した災害関連緊急傾斜地崩壊対策事業が完了しました（令和2年6月10日）。

位置図



平面図



【事業概要】

保全対象：人家2戸
主な対策：法枠工 約632㎡
事業費：約47,280千円


【被害状況】

土砂災害発生日：平成30年7月7日

工事着手前



標準断面図

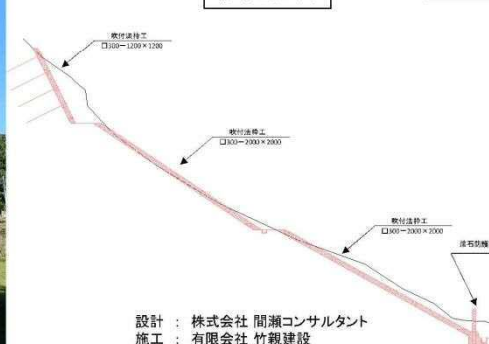

設計：株式会社 間瀬コンサルタント
施工：有限会社 竹親建設



斜面崩壊・被災状況（H30年7月）



工事完了（令和2年6月10日）



【平佐地区】災害関連地域防災がけ崩れ対策事業の完了について（三原市）

平成30年7月豪雨に伴い、三原市沼田東町納所において発生した土砂災害（がけ崩れ）に対して、三原市が緊急的に実施したがけ崩れ対策事業が完了しました（令和2年6月30日）。

位置図



【被害状況】

土砂災害発生日：平成30年7月6日
半壊：2戸

平面図



【事業概要】

保全対象：人家3戸
主な対策：法枠工 約370㎡
事業費：約45,620千円

斜面崩壊・被災状況（H30年7月）



標準断面図



設計：明伸建設コンサルタント株式会社
施工：株式会社中博建設

工事着手前

工事完了（令和2年6月30日）



【坂井谷地区】災害関連緊急治山事業 溪間工事の本堤完了について

広島県


平成30年7月豪雨に伴い、東広島市西条町吉行において発生した土砂災害（土石流）に対して、広島県が緊急的に実施している災害関連緊急治山事業溪間工事の治山ダム本堤が完了しました。（令和2年6月1日）

引き続き、流域の安全度を高めるため、洗掘防止対策を実施します。

位置図



被災状況

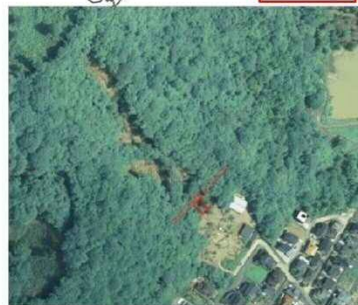

本堤完了



【被害状況】

土砂災害発生日：平成30年7月6日
土砂流入：人家、市道、農地

【事業概要】

谷止工 1基 高さ6.0m、幅65.0m、体積1111.1m³
事業費：約82,500千円

設計：（株）藤井測量設計
施工：（株）後藤組

【大田地区】災害関連緊急治山事業 溪間工事の本堤完了について




平成30年7月豪雨に伴い、東広島市安芸津町において発生した土砂災害（土石流）に対して、広島県が緊急的に実施している災害関連緊急治山事業溪間工事の治山ダム本堤が完了しました。（令和2年6月1日）引き続き、流域の安全度を高めるため、洗掘防止対策を実施します。

位置図



平面図

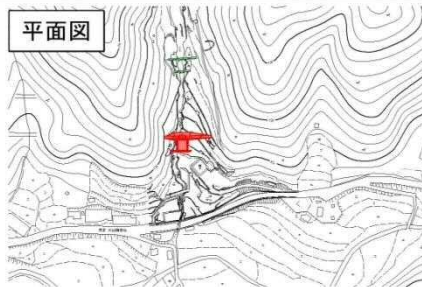

施工前



被災状況



【被害状況】

土砂災害発生日：平成30年7月6日
土砂流入：人家、市道、農地

【事業概要】

谷止工 1基 高さ8.0m, 幅43.0m, 体積1106.7m³
事業費：約109,400千円

本堤完了



設計：（株）日西テクノプラン
施工：（株）上垣組

【矢多田地区】災害関連緊急治山事業 溪間工事の本堤完了について



平成30年7月豪雨に伴い、府中市上下町において発生した土砂災害（土石流）に対して、広島県が緊急的に実施している災害関連緊急治山事業溪間工事の治山ダム本堤が完了しました。（令和2年6月23日）引き続き、流域の安全度を高めるため、洗掘防止対策を実施します。

位置図



平面図



施工前



【被害状況】

土砂災害発生日：平成30年7月6日
土砂流入：人家、県道

被災状況



本堤完了



【事業概要】



谷止工 1基 高さ7.0m, 幅38.5m, 体積736.7m³
事業費：約52,500千円

設計：（株）イワコンサルト
施工：（株）中国開発

【神村五区地区】災害関連緊急治山事業 山腹工事の完成について



平成30年7月豪雨に伴い、福山市神村町において発生した土砂災害（山腹崩壊）に対して、広島県が緊急的に実施している災害関連緊急治山事業山腹工事が、完成しました。（令和2年6月26日）

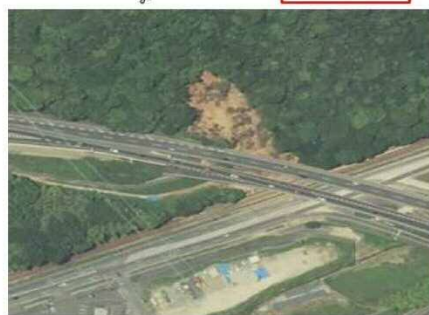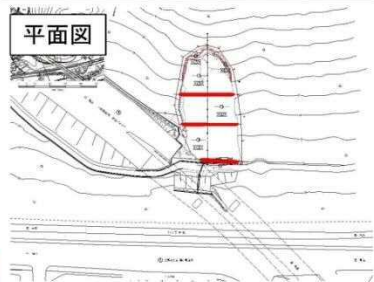

被災状況



完成

【被害状況】
土砂災害発生日：平成30年7月6日
土砂流入：JR、県道

設計：（株）知久設計
施工：三葉興業（有）

【事業概要】
山腹工 A=0.26ha
事業費：約35,300千円

【山行地区】災害関連緊急治山事業 溪間工事の本堤完了について



平成30年7月豪雨に伴い、尾道市栗原町において発生した土砂災害（土石流）に対して、広島県が緊急的に実施している災害関連緊急治山事業溪間工事の治山ダム本堤が完了しました。（令和2年6月24日）引き続き、流域の安全度を高めるため、洗掘防止対策を実施します。



施工前



被災状況



本堤完了

【被害状況】
土砂災害発生日：平成30年7月6日
土砂流入：人家、市道、公民館

【事業概要】
谷止工 1基 高さ9.0m、幅29.0m、体積660.8m³
事業費：約54,200千円

設計：（有）スペースプランニング
施工：シンカ建設（株）

平成30年7月豪雨災害 砂防・治山施設整備計画(緊急事業・激特事業等)事業箇所一覧表

資料

令和2年6月末時点

※事業着手手済とは、工事の公告または指名通知済の箇所を指す。

整備 計画図	詳細 番号	箇所 番号	緊急 事業	激特 等	渓流名・箇所名	市町名	所在	対応主体	施設概要	緊 急 事 業					緊急事業 概成目標 時期
										事業 着手時期	事業 着手済	契約済	現場着手	完了	
①	【1】	1	○	○	おおたにがわ 大谷川	広島市	東区 馬木 8丁目	国(砂防)	砂防ダム		○	○	○	○	
①	【1】	2	○	○	てらにようがわ(支) 寺桑川右支	広島市	東区 福田 1丁目	国(砂防)	砂防ダム		○	○	○		R2年11月
①	【2】	3	○		うすき原(支) 戸坂大上地区	広島市	東区 戸坂大上 1丁目	県(治山)	治山ダム		○	○	○		R2年12月
①	【2】	4	○		うしなひがしよんちようめ 牛田東4丁目①地区	広島市	東区 牛田東 4丁目	県(治山)	治山ダム		○	○	○		R2年12月
①	【2】	5	○		うしなひがしよんちようめ 牛田東4丁目②地区	広島市	東区 牛田東 4丁目	県(治山)	治山ダム		○	○	○		R2年12月
①	【2】	6	○		なかやまにいちちようめ 中山西一丁目地区	広島市	東区 中山西 1丁目	市町(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○	○	
②	【1】	7	○		うにのやまこひめりん 宇品山園有林	広島市	南区 元宇品	国(治山)	山腹工		○	○	○	○	
②	【1】	8	○		くすもろしき 楠那町14地区	広島市	南区 楠那町	県(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○	○	
②	【1】	9	○	○	おおこがわ(支) 大河川支川1隣	広島市	南区 日宇那町	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○		R3年3月
②	【2】	10	○	○	かたがわ 家下川2	広島市	南区 似島町	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○		R3年度
③	【1】	11	○	○	やまのたけ 山田町34地区	広島市	西区 山田町	市町(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○	○	
③	【1】	12	○	○	くさうまふし 己斐上五丁目26地区	広島市	西区 己斐上 5丁目	市町(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○		R2年9月
③	【1】	13	○	○	みたきぼんまもいちちようめ 三滝本町一丁目35地区	広島市	西区 三滝本町 1丁目	市町(急傾斜)	急傾斜地対策	令和2年度 第2四半期					R3年3月
③	【2】	14	○	○	いぬのちんちめ 井口二丁目4地区	広島市	西区 井口 3丁目	市町(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○	○	
④	【1】	15	○	○	あまがわ(支) 三篠川支川76	広島市	安佐北区 白木町 井原	県(砂防)	砂防ダム、地すべり 対策		○	○	○		R3年3月
④	【2】	16	○		にしよしな 西吉永地区	広島市	安佐北区 白木町 三田	県(治山)	治山ダム		○	○	○		R2年12月
④	【3】	17	○		みつかけやま 光掛山1地区	広島市	安佐北区 落合南町	県(治山)	治山ダム		○	○	○	○	
④	【3】	18	○		みつかけやま 光掛山2地区	広島市	安佐北区 落合南町	県(治山)	治山ダム		○	○	○	○	
④	【3】	19	○		みつかけやま 光掛山3地区	広島市	安佐北区 落合南町	県(治山)	治山ダム		○	○	○		R2年9月
④	【3】	20	○		いしやま 樺村地区	広島市	安佐北区 上深川町 樺村	県(治山)	治山ダム		○	○	○		R2年9月
④	【3】	21	○		きくがわ 木ノ宗地区	広島市	安佐北区 小河原町 木ノ宗	県(治山)	治山ダム		○	○	○		R2年9月
④	【4】	22	○		きくがわ 笹原地区	広島市	安佐北区 口田南町	県(治山)	治山ダム		○	○	○		R2年12月
④	【4】	23	○	○	おだか 小田川	広島市	安佐北区 口田南 3丁目	国(砂防)	砂防ダム		○	○	○	○	
④	【4】	24	○	○	やぐちがわ(支) 矢口川支川	広島市	安佐北区 口田南 5丁目	国(砂防)	砂防ダム		○	○	○	○	
④	【4】	25	○	○	いもがわ(支) 一ヶ谷川(279-2)	広島市	安佐北区 口田南 5丁目	国(砂防)	砂防ダム		○	○	○	○	
④	【4】	26	○	○	いもがわ(支) 一ヶ谷川(279-1)	広島市	安佐北区 口田南 5丁目	国(砂防)	砂防ダム		○	○	○	○	
⑤	【1】	27	○		とくしんやまこひめりん 立石山園有林	広島市	安芸区 瀬野町	国(治山)	治山ダム		○	○	○	○	
⑤	【2】	28	○	○	おもとにがわ 大元谷川	広島市	安芸区 上瀬野町	国(砂防)	砂防ダム		○	○	○	○	
⑤	【3】	29	○		はながわ(支) 畑賀川支川7隣	広島市	安芸区 畑賀町	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○		R2年9月
⑤	【3】	30	○	○	はながわ(支) 畑賀川支川7	広島市	安芸区 畑賀町	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○	○	
⑤	【3】	31	○	○	したためずみ 下為角4111地区	広島市	安芸区 畑賀町	県(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○		R2年9月
⑤	【3】	32	○		かげやま 影山地区	広島市	安芸区 畑賀町 影山	県(治山)	治山ダム		○	○	○		R3年3月
⑤	【3】	33	○	○	きんのうがわ 山王川	広島市	安芸区 中野東 3丁目	国(砂防)	砂防ダム		○	○	○	○	
⑤	【4】	34	○	○	みなみいけがわ 南幸川	広島市	安芸区 矢野町	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○		R3年3月
⑤	【4】	35	○		にしきよ平 西崎平地区	広島市	安芸区 矢野町 西崎平	県(治山)	治山ダム		○				R3年度
⑤	【4】	36	○	○	あつに、きんちようめ 矢野西三丁目37地区	広島市	安芸区 矢野西 3丁目	県(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○	○	
⑤	【4】	37	○	○	くまがわ 熊崎川	広島市	安芸区 矢野東 6丁目	県(砂防)	砂防ダム		○				R3年度
⑤	【5】	38	○	○	まはがわ 的場川	広島市	安芸区 矢野東 7丁目	国(砂防)	砂防ダム		○	○	○		R2年9月
⑤	【5】	39	○	○	かみながわ(支) 神長日広川	広島市	安芸区 矢野東 7丁目	国(砂防)	砂防ダム		○	○	○	○	
⑤	【5】	40	○	○	かみながわ 神長川	広島市	安芸区 矢野東 7丁目	国(砂防)	砂防ダム		○	○	○	○	
⑤	【5】	41	○	○	かみながわ(支) 神長南川	広島市	安芸区 矢野東 7丁目	国(砂防)	砂防ダム		○	○	○		R2年11月
⑤	【5】	42	○	○	かみながわ(支) 樫木宗屋南川	広島市	安芸区 矢野町	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○		R3年3月
⑤	【5】	43	○		よづけやまこひめりん 峠山園有林	広島市	安芸区 矢野町	国(治山)	治山ダム		○	○	○		R2年6月
⑤	【5】	44	○		よづけやまこひめりん 峠山園有林	広島市	安芸区 矢野町	国(治山)	治山ダム		○	○	○	○	

平成30年7月豪雨災害 砂防・治山施設整備計画(緊急事業・激特事業等)事業箇所一覧表

資料

令和2年6月末時点

※事業着手済とは、工事の公告または指名通知済の箇所を指す。

整備 計画図	詳細 番号	箇所 番号	緊急 事業	激特 等	渓流名・箇所名	市町名	所在	対応主体	施設概要	緊 急 事 業					緊急事業 概成目標 時期
										事業 着手時期	事業 着手済	契約済	現場着手	完了	
⑥	【1】	45	○		たつのりやまこけのり山 竜ノ口山国有林	呉市	焼山北	国(治山)	治山ダム		○	○	○	○	
⑥	【1】	46	○		たつがね 龍ヶ畝地区	呉市	焼山町 龍ヶ畝	県(治山)	治山ダム		○	○	○	○	
⑥	【1】	47	○		おまがほみがわひびのり山 鎌ヶ原川左支溪	呉市	押込 6丁目	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○		R3年3月
⑥	【1】	48	○		めうそやまこけのり山 ノウソ山国有林	呉市	押込	国(治山)	治山ダム		○	○	○	○	
⑥	【2】	49	○		ふなきまこ 船木迫地区	呉市	安浦町 中畑 船木迫	県(治山)	治山ダム		○	○	○		R3年3月
⑥	【2】	50	○	○	いずみくにがわ 泉谷川	呉市	安浦町 中畑	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○		R2年7月
⑥	【2】	51	○	○	なかがほみがわ 中ヶ原川	呉市	安浦町 下垣内	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○	○	
⑥	【2】	52	○		もふがね エフリ谷地区	呉市	安浦町 中畑 エフリ谷	県(治山)	治山ダム		○	○	○		R3年3月
⑥	【2】	53	○		なまがまこ 釜ヶ迫地区	呉市	安浦町 中畑 釜ヶ迫	県(治山)	治山ダム		○	○	○		R3年3月
⑥	【2】	54	○		なかやま 中山地区	呉市	安浦町 中畑 中山	県(治山)	治山ダム		○	○	○	○	
⑥	【3】	55	○		てんのかしらにしろきんちんち 天応西条3丁目20地区	呉市	天応	県(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○	○	
⑥	【3】	56	○	○	おまがほみがわ 背戸川支川(90d)	呉市	天応 西条 3丁目	国(砂防)	砂防ダム		○	○	○	○	
⑥	【3】	57	○	○	せとかしら 背戸川支川(90f)	呉市	天応 西条 3丁目	国(砂防)	砂防ダム		○	○	○	○	
⑥	【3】	58	○	○	おまがほみがわ 大屋大川	呉市	焼山町	国(砂防)	砂防ダム		○	○	○	○	
⑥	【3】	59	○	○	おまがほみがわ 大屋大川左支川	呉市	天応町	国(砂防)	砂防ダム		○	○	○	○	
⑥	【3】	60	○	○	おまがほみがわ 大屋大川(92隣e)	呉市	天応 東久保 2丁目	国(砂防)	砂防ダム		○	○	○	○	
⑥	【3】	61	○	○	うめきがわしん 梅木川支川	呉市	大山町	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○		R3年3月
⑥	【3】	62	○	○	うめきがわしん 梅木川隣	呉市	長谷町	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○		R3年度
⑥	【3】	63	○		いのししやまこけのり山 猪山国有林	呉市	吉浦町	国(治山)	治山ダム		○	○	○	○	
⑥	【3】	64	○		いのししやまこけのり山 猪山国有林	呉市	狩留賀町	国(治山)	山腹工		○	○	○	○	
⑥	【3】	65	○		いのししやまこけのり山 猪山国有林	呉市	狩留賀町	国(治山)	山腹工		○	○	○	○	
⑥	【3】	66	○		いのししやまこけのり山 猪山国有林	呉市	狩留賀町	国(治山)	山腹工		○	○	○	○	
⑥	【3】	67	○		いのししやまこけのり山 猪山国有林	呉市	狩留賀町	国(治山)	治山ダム		○	○	○	○	
⑥	【3】	68	○	○	うめき 梅ノ木	呉市	焼山東 4丁目	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○		R3年3月
⑥	【4】	69	○		いのししやまこけのり山 一ノ松光山地区	呉市	郷原町 一ノ松光山	市町(治山)	山腹工等	調整中					R3年3月
⑥	【5】	70	○	○	いしがねがわ 石ヶ森川	呉市	安浦町 原畑	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○		R2年9月
⑥	【6】	71	○	○	みづいしがわ 水尻川	呉市	安浦町 三津口	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○		R2年9月
⑥	【7】	72	○	○	うねがわ かきいしがわ 宇根川・笠岩川	呉市	吉浦新出町	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○		R3年3月
⑥	【7】	73	○		おまがほみがわ 西辰川2丁目14地区	呉市	西辰川 2丁目	県(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○	○	
⑥	【8】	74	○	○	あしかんむらぎがわ 芦冠川	呉市	広 三芦 1丁目	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○		R3年度
⑥	【8】	75	○	○	ひがしやまこけのり山 東両谷川	呉市	広 両谷	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○		R3年3月
⑥	【8】	76	○		ひろもとつばにんがわ 広船津神社東地区	呉市	広 両谷 3丁目	県(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○	○	
⑥	【8】	77	○		にがね山もちにもよる 仁方本町2丁目10地区	呉市	仁方本町 2丁目	県(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○	○	
⑥	【8】	78	○	○	おまがほみがわ 大坪川	呉市	広町白石免田	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○		R3年3月
⑥	【8】	79	○		おまがほみがわ 大壺川支川	呉市	広 長浜 1丁目	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○		R3年3月
⑥	【8】	80	○	○	こつばにがわ 小坪西川	呉市	広 小坪 1丁目	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○		R3年3月
⑥	【9】	81	○		こよういし 小用一号	呉市	川尻町 小用 2丁目	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○		R3年3月
⑥	【9】	82	○		こよういし 小用二号隣	呉市	川尻町 小用 2丁目	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○		R3年3月
⑥	【10】	83	○	○	すががわしん 菅原川支川	呉市	菅戸町 北隠渡 2丁目	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○		R3年3月
⑥	【11】	84	○		おまがほみがわ 刈浜地区	呉市	蒲刈町 向	県(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○		R3年3月
⑥	【11】	85	○		おまがほみがわ 後原川	呉市	蒲刈町 大浦	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○		R3年3月
⑥	【12】	86	○	○	こいのり 鯉ノ浦川隣	呉市	菅戸町 早瀬 2丁目	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○		R3年3月
⑥	【12】	87	○	○	こいのり 鯉ノ浦川隣2	呉市	菅戸町 早瀬 2丁目	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○		R3年3月
⑥	【12】	88	○	○	おまがほみがわ 岡棟川	呉市	菅戸町 先奥 3丁目	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○		R3年3月

平成30年7月豪雨災害 砂防・治山施設整備計画(緊急事業・激特事業等)事業箇所一覧表

資料

令和2年6月末時点

※事業着手済とは、工事の公告または指名通知済の箇所を指す。

整備 計画図	詳細 番号	箇所 番号	緊急 事業	激特 等	渓流名・箇所名	市町名	所在	対応主体	施設概要	緊 急 事 業					緊急事業 概成目標 時期
										事業 着手時期	事業 着手済	契約済	現場着手	完了	
⑥	【12】	89	○		はなみ 波多見地区	呉市	音戸町 波多見 10丁目	市町(治山)	山腹工等		○	○	○		R3年3月
⑥	【13】	90	○		こさね 小宇和木地区	呉市	倉橋町 小宇和木	県(治山)	山腹工等		○	○	○		R2年12月
⑥	【13】	91	○		くさね 草部D地区	呉市	倉橋町 宇和木	県(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○	○	
⑥	【13】	92	○	○	こさね 小塚A地区	呉市	倉橋町 宇和木	市町(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○	○	
⑥	【13】	93	○		おきねがわより 納川隣	呉市	倉橋町	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○		R3年3月
⑦	【1】	94	○		きよさ 青芦峯地区	竹原市	田万里町 青芦峯	県(治山)	治山ダム		○	○	○		R2年9月
⑦	【1】	95	○		ひがてんがに 東天下城地区	竹原市	西野町 東天下城	県(治山)	治山ダム		○	○	○		R2年12月
⑦	【1】	96	○		いせのみやま 伊勢宮山地区	竹原市	西野町 伊勢宮山	県(治山)	治山ダム		○	○	○		R2年9月
⑦	【1】	97	○	○	かみむらさき 賀茂川支川7	竹原市	西野町	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○		R3年3月
⑦	【1】	98	○	○	かみむらさき 賀茂川支川8	竹原市	西野町	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○		R2年9月
⑦	【1】	99	○		にしきやうこ 西葛子地区	竹原市	新庄町 西葛子	県(治山)	治山ダム		○	○	○		R2年12月
⑦	【2】	100	○	○	かみむらさき 下仁賀地区	竹原市	仁賀町	県(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○	○	
⑦	【2】	101	○		みつと 光時地区	竹原市	仁賀町 光時	県(治山)	治山ダム		○	○	○		R2年12月
⑦	【2】	102	○	○	なかにし 中条川	竹原市	東野町	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○	○	
⑦	【2】	103	○		なかにし 中条山地区	竹原市	東野町 中条山	県(治山)	治山ダム		○	○	○		R2年12月
⑦	【2】	104	○		あさひ 青田9476-2地区	竹原市	東野町 青田	市町(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○		R2年9月
⑦	【2】	105	○		かみむらさき 片山谷862地区	竹原市	新庄町 片山谷	県(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○		R2年9月
⑦	【2】	106	○		かみむらさき 片山谷9536地区	竹原市	新庄町 片山谷	市町(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○	○	
⑦	【2】	107	○		ひがしふかやま 東上条地区	竹原市	下野町 東上条	県(治山)	山腹工等		○	○	○		R2年9月
⑦	【2】	108	○		みやもと 宮原9457地区	竹原市	下野町 宮原	市町(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○	○	
⑦	【3】	109	○		きたに 北谷地区	竹原市	竹原町 北谷	県(治山)	山腹工等		○	○	○		R2年9月
⑦	【3】	110	○		こさきやまこくゆかりん 小吹山国有林	竹原市	小梨町	国(治山)	治山ダム		○	○	○		R2年7月
⑦	【3】	111	○	○	おきねがわより 飯屋谷川	竹原市	港町 5丁目	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○	○	
⑦	【3】	112	○		たかやま 高山6711地区	竹原市	港町 5丁目	市町(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○		R2年9月
⑦	【3】	113	○		みなみ 皆実2319地区	竹原市	竹原町 皆実	市町(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○	○	
⑦	【4】	114	○		かみむらさき 観音谷地区	竹原市	吉名町	県(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○	○	
⑦	【4】	115	○		こさきやま 小浦尻2304地区	竹原市	吉名町 小浦尻	市町(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○		R2年12月
⑦	【4】	116	○		こさきやま 小浦尻2304-1地区	竹原市	吉名町 小浦尻	市町(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○		R2年9月
⑦	【4】	117	○		こさきやま 浦尻6344-1地区	竹原市	吉名町 浦尻	市町(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○		R2年9月
⑦	【4】	118	○		こさきやま 小平方地区	竹原市	吉名町	県(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○		R2年9月
⑦	【4】	119	○		さい 曾井3721地区	竹原市	吉名町 曾井	市町(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○	○	
⑧	【1】	120	○		おきねがわより 頭谷川2隣	三原市	大和町 福田	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○		R2年9月
⑧	【1】	121	○	○	ふかみ 深見地区	三原市	大和町 下徳良 深見	県(治山)	治山ダム		○	○	○		R3年3月
⑧	【2】	122	○	○	おきねがわより 平沖隣	三原市	大和町 椋梨	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○		R3年3月
⑧	【2】	123	○		おきねがわより 和木地区	三原市	大和町 和木	県(治山)	治山ダム		○				R3年度
⑧	【2】	124	○		おきねがわより 東川	三原市	大和町 和木	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○		R2年9月
⑧	【3】	125	○		いしやま 石山沖東地区	三原市	久井町 羽倉	市町(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○	○	
⑧	【4】	126	○	○	おきねがわより 山岡西川隣	三原市	久井町 吉田行広	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○		R3年3月
⑧	【5】	127	○		かわず 河頭隣	三原市	大和町 大草	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○		R3年3月
⑧	【5】	128	○		かわず 河頭隣1	三原市	大和町 大草	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○		R2年9月
⑧	【5】	129	○		おきねがわより 姥ヶ原山国有林	三原市	大和町 姥ヶ原	国(治山)	治山ダム		○	○	○		R2年12月
⑧	【5】	130	○		おきねがわより 姥ヶ原山国有林	三原市	大和町 姥ヶ原	国(治山)	山腹工		○	○	○		R2年12月
⑧	【6】	131	○		なかにし 中西地区	三原市	八幡町 野串	市町(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○		R2年9月
⑧	【7】	132	○		おきねがわより 用意山国有林	三原市	本郷町 船木	国(治山)	治山ダム		○	○	○		R3年1月

平成30年7月豪雨災害 砂防・治山施設整備計画(緊急事業・激特事業等)事業箇所一覧表

資料

令和2年6月末時点

※事業着手済とは、工事の公告または指名通知済の箇所を指す。

整備 計画図	詳細 番号	箇所 番号	緊急 事業	激特 等	渓流名・箇所名	市町名	所在	対応主体	施設概要	緊 急 事 業					緊急事業 概成目標 時期
										事業 着手時期	事業 着手済	契約済	現場着手	完了	
⑧	【7】	133	○		ようぐんやまごのうりん 用倉山国有林	三原市	本郷町 船木	国(治山)	治山ダム		○	○	○		R3年1月
⑧	【7】	134	○		ようぐんやまごのうりん 用倉山国有林	三原市	本郷町 船木	国(治山)	治山ダム		○	○	○		R3年1月
⑧	【7】	135	○	○	ぜんにやまごのうりん 善入寺川支川3階	三原市	本郷町 善入寺	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○	○	
⑧	【8】	136	○		ぶつうじやまごのうりん 仏通寺山国有林	三原市	高坂町	国(治山)	山腹工		○	○	○	○	
⑧	【8】	137	○		ぶつうじやまごのうりん 仏通寺山国有林	三原市	高坂町	国(治山)	山腹工		○	○	○	○	
⑧	【8】	138	○		だいしやまごのうりん 大長寺川2地区	三原市	小坂町	市町(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○		R2年9月
⑧	【9】	139	○		しろかねやま 白金山地区	三原市	本郷町 上北方 白金山	県(治山)	治山ダム		○	○	○		R3年3月
⑧	【9】	140	○	○	りゅうおうやま 龍王平地区	三原市	本郷町 上北方 龍王平	県(治山)	治山ダム		○	○	○		R2年12月
⑧	【9】	141	○		あふりやま 油免地区	三原市	本郷町 南方	市町(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○	○	
⑧	【10】	142	○		ひらき 平佐地区	三原市	沼田東町 納所	市町(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○	○	
⑧	【10】	143	○		ひめさ 姫草地区	三原市	長谷 2丁目	市町(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○	○	
⑧	【11】	144	○	○	にしきやま 西福地川	三原市	木原 6丁目	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○	○	
⑧	【12】	145	○		あみつやまごのうりん 耳津山国有林	三原市	小泉町	国(治山)	治山ダム		○	○	○		R2年7月
⑨	【1】	146	○		やまがき 山行地区	尾道市	栗原町 山行	県(治山)	治山ダム		○	○	○	○	
⑨	【1】	147	○		ぼろにがわたり 防地川隣	尾道市	防地町	県(砂防)	山腹工		○	○	○	○	
⑨	【1】	148	○	○	ひがしなるたけしやまごのうりん 東鳴滝城川隣2	尾道市	吉和町	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○		R3年3月
⑨	【1】	149	○		ひがしなるたけしやまごのうりん 東五反田川隣	尾道市	吉和町	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○		R3年3月
⑨	【1】	150	○		しほ 潮見G地区	尾道市	桜町	県(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○	○	
⑨	【2】	151	○		かねよしがわたり 兼吉川隣	尾道市	向島町	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○	○	
⑨	【2】	152	○		かわしろ 川尻地区	尾道市	向島町 兼広	県(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○	○	
⑨	【2】	153	○	○	みなみなるたけしやま 南永谷川	尾道市	向島町 沖柴	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○		R3年3月
⑩	【1】	154	○		ながさ 長迫地区	福山市	神辺町 下竹田	市町(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○	○	
⑩	【2】	155	○	○	あさひやま 上山守4地区	福山市	駅家町 上山守	県(治山)	治山ダム		○	○	○	○	
⑩	【2】	156	○		おおいにやまごのうりん 大谷山国有林	福山市	神村町	国(治山)	治山ダム		○				R3年2月
⑩	【3】	157	○		よこさ 横尾G地区	福山市	千田町 4丁目	市町(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○	○	
⑩	【3】	158	○		にしきやま 西深津地区	福山市	西深津町 7丁目	市町(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○	○	
⑩	【4】	159	○		あさひやま 春日町浦上地区	福山市	春日町 浦上	市町(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○	○	
⑩	【4】	160	○		とほ 通り地区	福山市	春日町 浦上	市町(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○	○	
⑩	【4】	161	○		ちくさ 毛部川地区	福山市	引野町	市町(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○	○	
⑩	【5】	162	○		よんく 西区地区	福山市	神村町	市町(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○	○	
⑩	【5】	163	○		かやま 神村三区地区	福山市	神村町 生田	県(治山)	治山ダム		○	○	○	○	
⑩	【5】	164	○		かやま 神村五区地区	福山市	神村町	県(治山)	山腹工等		○	○	○	○	
⑩	【5】	165	○	○	おおいなるたけしやま 萩之尾川隣	福山市	神村町	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○		R3年3月
⑩	【5】	166	○		しかが 鹿田地区	福山市	赤坂町 赤坂	市町(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○	○	
⑩	【6】	167	○		ながさ 長崎地区	福山市	引野町	市町(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○		R2年9月
⑩	【7】	168	○		いわふね 岩船地区	福山市	沼隈町 能登原	市町(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○	○	
⑩	【8】	169	○		しろやま 白茅地区	福山市	鞆町	県(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○	○	
⑩	【8】	170	○		あさひ 茨塚地区	福山市	鞆町	県(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○	○	
⑪	【1】	171	○		やたが 矢多田地区	府中市	上下町 矢多田	県(治山)	治山ダム		○	○	○	○	
⑪	【2】	172	○		つばき 角目4地区	府中市	木野山町	県(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○	○	
⑪	【3】	173	○	○	みやのま 宮ノ間川	府中市	河佐町	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○		R3年度
⑪	【3】	174	○		わかしやま 別両路地区	府中市	荒谷町 別両路	県(治山)	治山ダム		○	○	○		R2年12月
⑪	【3】	175	○		ひがしやま 東谷地区	府中市	本山町	市町(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○		R2年9月
⑪	【3】	176	○		しらやま 府中地区	府中市	府中町	市町(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○		R3年3月

平成30年7月豪雨災害 砂防・治山施設整備計画(緊急事業・激特事業等)事業箇所一覧表

資料

令和2年6月末時点

※事業着手手済とは、工事の公告または指名通知済の箇所を指す。

整備 計画図	詳細 番号	箇所 番号	緊急 事業	激特 等	渓流名・箇所名	市町名	所在	対応主体	施設概要	緊 急 事 業					緊急事業 概成目標 時期
										事業 着手時期	事業 着手済	契約済	現場着手	完了	
⑪	【4】	177	○		はら 土生地区	府中市	土生町	市町(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○		R2年12月
⑪	【4】	178	○		くさ 栗柄地区	府中市	栗柄町	市町(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○		R2年9月
⑫	【1】	179	○		たか 高瀬(4040)地区	庄原市	口和町 永田	市町(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○		R2年9月
⑬	【1】	180	○	○	すまきわたがわより 杉坂下川隣	東広島市	志和町 志和堀 杉坂下	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○	○	
⑬	【2】	181	○		おひめ 小竹4地区	東広島市	高屋町 造賀	市町(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○		R2年9月
⑬	【3】	182	○		おのろ 鷹之巣地区	東広島市	河内町 宇山 鷹之巣	県(治山)	治山ダム・山腹工		○	○	○		R2年12月
⑬	【3】	183	○		おひめ 小田地区	東広島市	河内町 小田	県(治山)	治山ダム		○	○	○		R2年12月
⑬	【4】	184	○	○	おひめ 小野川左3	東広島市	志和町 別府	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○		R3年3月
⑬	【4】	185	○	○	おひめ 員岡川	東広島市	志和町 別府	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○	○	
⑬	【4】	186	○		おひめ 扇迫川	東広島市	志和町 別府	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○	○	
⑬	【4】	187	○	○	おひめ 奥屋川右1	東広島市	志和町 奥屋	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○		R2年9月
⑬	【5】	188	○		おひめ 中筋4地区	東広島市	高屋町 高屋東	市町(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○		R2年9月
⑬	【5】	189	○		おひめ 上郷750地区	東広島市	河内町 入野	市町(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○		R2年9月
⑬	【6】	190	○	○	おひめ 奥屋川1	東広島市	河内町 中河内	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○	○	
⑬	【7】	191	○		おひめ 乗重地区	東広島市	志和町 七条花坂 乗重	県(治山)	山腹工等		○	○	○		R2年12月
⑬	【7】	192	○		おひめ 八本松地区	東広島市	八本松西	国(治山)	治山ダム等		○	○	○		R3年2月
⑬	【7】	193	○		おひめ 八本松地区	東広島市	八本松町	国(治山)	治山ダム等		○	○	○		R3年2月
⑬	【8】	194	○		おひめ 寺家地区	東広島市	西条町 寺家	県(治山)	治山ダム		○	○	○		R2年9月
⑬	【8】	195	○		おひめ 坂井谷地区	東広島市	西条町 吉行 坂井谷	県(治山)	治山ダム		○	○	○	○	
⑬	【8】	196	○		おひめ 後迫地区	東広島市	西条町 吉行 後迫	県(治山)	治山ダム		○	○	○		R2年12月
⑬	【8】	197	○		おひめ 高屋地区	東広島市	高屋町 宮領	国(治山)	治山ダム等		○	○	○		R3年2月
⑬	【8】	198	○		おひめ 高屋地区	東広島市	高屋町 宮領	国(治山)	治山ダム等		○	○	○		R3年2月
⑬	【8】	199	○		おひめ 高屋地区	東広島市	高屋町 郷	国(治山)	治山ダム等		○	○	○		R3年2月
⑬	【9】	200	○		おひめ 高屋地区	東広島市	高屋町 溝口	国(治山)	山腹工等		○	○	○		R3年2月
⑬	【9】	201	○		おひめ 高屋地区	東広島市	高屋町 重兼	国(治山)	治山ダム等		○	○	○		R2年11月
⑬	【9】	202	○		おひめ 高屋地区	東広島市	高屋町 重兼	国(治山)	治山ダム等		○	○	○		R2年11月
⑬	【9】	203	○		おひめ 高屋地区	東広島市	高屋町 重兼	国(治山)	治山ダム等		○	○	○		R2年11月
⑬	【9】	204	○		おひめ 小谷地区	東広島市	高屋町 小谷	県(治山)	治山ダム		○	○	○		R2年9月
⑬	【9】	205	○		おひめ 門2726地区	東広島市	河内町 入野	市町(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○		R2年9月
⑬	【10】	206	○		おひめ 下大内原隣	東広島市	河内町 入野	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○	○	
⑬	【10】	207	○		おひめ 東山地区	東広島市	河内町 入野 東山	県(治山)	山腹工等		○	○	○	○	
⑬	【11】	208	○		おひめ 古河川支流	東広島市	八本松町 原	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○		R2年9月
⑬	【11】	209	○		おひめ 吉川A地区	東広島市	八本松町 吉川	県(治山)	治山ダム		○	○	○		R3年3月
⑬	【11】	210	○		おひめ 吉川B地区	東広島市	八本松町 吉川	県(治山)	治山ダム		○	○	○		R3年3月
⑬	【11】	211	○		おひめ 吉川C地区	東広島市	八本松町 吉川	県(治山)	山腹工等		○	○	○		R3年3月
⑬	【12】	212	○		おひめ 小滝原1地区	東広島市	西条町 田口	市町(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○		R2年9月
⑬	【12】	213	○	○	おひめ 大宮川	東広島市	西条町 下三永	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○		R3年3月
⑬	【12】	214	○	○	おひめ 本舘川隣	東広島市	西条町 下三永	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○	○	
⑬	【13】	215	○		おひめ 黒瀬川左6隣	東広島市	西条町 郷曾	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○		R3年3月
⑬	【14】	216	○		おひめ 津江上条地区	東広島市	黒瀬町 津江	市町(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○		R2年9月
⑬	【15】	217	○		おひめ 黒瀬地区	東広島市	黒瀬町 上保田	国(治山)	治山ダム等		○	○	○		R3年2月
⑬	【15】	218	○		おひめ 黒瀬地区	東広島市	黒瀬町 菅田	国(治山)	治山ダム等		○	○	○		R3年2月
⑬	【15】	219	○		おひめ 黒瀬地区	東広島市	黒瀬町 乃美尾	国(治山)	治山ダム等		○	○	○	○	
⑬	【15】	220	○		おひめ 乃美尾地区	東広島市	黒瀬町 乃美尾	県(治山)	治山ダム		○	○	○	○	

平成30年7月豪雨災害 砂防・治山施設整備計画(緊急事業・激特事業等)事業箇所一覧表

資料

令和2年6月末時点

※事業着手済とは、工事の公告または指名通知済の箇所を指す。

整備 計画図	詳細 番号	箇所 番号	緊急 事業	激特 等	渓流名・箇所名	市町名	所在	対応主体	施設概要	緊 急 事 業					緊急事業 概成目標 時期
										事業 着手時期	事業 着手済	契約済	現場着手	完了	
⑬	【15】	221	○		いけや かいほう 岩谷上梁2地区	東広島市	黒瀬町 宗近柳国	市町(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○		R2年9月
⑬	【16】	222	○		おおだ 大田地区	東広島市	安芸津町 大田	県(治山)	治山ダム		○	○	○	○	
⑬	【17】	223	○	○	あきしなやにしも 萩無中西谷	東広島市	安芸津町 三津	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○		R2年9月
⑬	【18】	224	○	○	こまにがわ 小谷川	東広島市	黒瀬町 市飯田	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○	○	
⑭	【1】	225	○	○	あかき 赤崎C地区	廿日市市	宮島口 3丁目	市町(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○	○	
⑮	【1】	226	○		いしほら 石佛地区	安芸高田市	吉田町 中馬	市町(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○	○	
⑮	【2】	227	○		ほさき 保垣地区	安芸高田市	向原町 保垣	県(治山)	山腹工等		○	○	○		R3年3月
⑯	【1】	228	○		きしほにしも 切串1丁目地区	江田島市	江田島町 切串 1丁目	県(治山)	山腹工等		○	○	○		R2年9月
⑯	【1】	229	○		みずがわ 水ヶ浦地区	江田島市	江田島町 水ヶ浦	県(治山)	治山ダム		○	○	○		R2年12月
⑯	【1】	230	○	○	ながたにがわ 長谷川支川	江田島市	江田島町 切串	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○	○	
⑯	【1】	231	○		ながたにがわ 長谷川支川2	江田島市	江田島町 切串 2丁目	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○		R3年3月
⑯	【2】	232	○		みよし 三吉地区	江田島市	沖美町 三吉	市町(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○		R2年12月
⑯	【3】	233	○		わたがし 渡川隣	江田島市	江田島町 宮の原 1丁目	県(砂防)	山腹工		○	○	○	○	
⑯	【3】	234	○		おきろ 柿ノ木田地区	江田島市	江田島町 小用 2丁目	市町(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○		R2年12月
⑯	【3】	235	○		みやと 宮迫2号地区	江田島市	江田島町 中央 3丁目	市町(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○		R2年9月
⑯	【3】	236	○		こやうす コソウス地区	江田島市	江田島町 中央 3丁目	市町(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○		R2年9月
⑯	【3】	237	○		き 矢の浦1号地区	江田島市	江田島町 中央 4丁目	市町(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○		R2年9月
⑯	【3】	238	○		ばいし バイシ川隣	江田島市	江田島町 秋月 2丁目	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○		R3年3月
⑯	【4】	239	○		こなが 是長地区	江田島市	沖美町 是長	市町(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○		R3年3月
⑯	【4】	240	○		しもがわ 下野川地区	江田島市	沖美町 畑	県(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○	○	
⑯	【5】	241	○		ひよろ 飛渡瀬2号地区	江田島市	大柿町 飛渡瀬	市町(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○		R2年9月
⑯	【5】	242	○		ながたに 長谷地区	江田島市	大柿町 飛渡瀬	市町(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○		R2年9月
⑯	【5】	243	○		きたと 北迫4号1地区	江田島市	大柿町 柿浦	市町(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○		R2年12月
⑯	【5】	244	○		きたと 北迫4号2地区	江田島市	大柿町 柿浦	市町(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○		R3年3月
⑯	【5】	245	○		こら 郷地区	江田島市	大柿町 小古江	市町(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○			R3年3月
⑯	【6】	246	○		きたと 北迫1号地区	江田島市	大柿町 柿浦	市町(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○		R3年3月
⑯	【6】	247	○		おおだ 大原地区	江田島市	大柿町 大原	市町(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○	○	
⑯	【6】	248	○		ほり 堀2号地区	江田島市	大柿町 大原	市町(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○		R2年9月
⑯	【6】	249	○		ふかた 一反田地区	江田島市	大柿町 深江	市町(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○		R2年12月
⑯	【6】	250	○		ほまに 浜床1地区	江田島市	大柿町 大君	市町(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○			R3年3月
⑯	【6】	251	○		ほまに 浜床2地区	江田島市	大柿町 大君	市町(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○		R2年9月
⑯	【6】	252	○		おおき 大君2号地区	江田島市	大柿町 大君	市町(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○		R2年12月
⑯	【6】	253	○	○	おおき 大君地区	江田島市	大柿町 大君	県(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○		R2年9月
⑰	【1】	254	○	○	もろき 榎川支川5	府中町	みくまり 1丁目	県(砂防)	砂防ダム		○	○			R3年度
⑰	【1】	255	○		じやぬけ 蛇抜山地区	府中町	蛇抜山	県(治山)	治山ダム		○	○	○		R2年12月
⑰	【1】	256	○		やへだ 八幡四丁目地区	府中町	八幡 4丁目	市町(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○	○	
⑰	【1】	257	○		ほまに 浜田四丁目地区	府中町	浜田 4丁目	市町(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○	○	
⑰	【1】	258	○		おがき 柳ヶ丘地区	府中町	柳ヶ丘	市町(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○	○	
⑱	【1】	259	○	○	くすのき 楠木谷川	海田町	畝 2丁目	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○		R3年3月
⑱	【1】	260	○	○	みなみ 南幸町13地区	海田町	南幸町	県(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○	○	
⑲	【1】	261	○		ひらたに 平谷地区	熊野町	平谷	市町(治山)	山腹工等	令和2年度 第2四半期					R3年3月
⑲	【1】	262	○		やすみ 休ヶ迫山地区	熊野町	休ヶ迫山	県(治山)	治山ダム		○	○			R3年3月
⑲	【1】	263	○		なかむら 中倉山国有林	熊野町	平谷	国(治山)	治山ダム		○	○	○	○	
⑲	【1】	264	○		かんた 神田地区	熊野町	神田	市町(治山)	山腹工等	令和2年度 第2四半期					R3年3月

平成30年7月豪雨災害 砂防・治山施設整備計画(緊急事業・激特事業等)事業箇所一覧表

資料

令和2年6月末時点

※事業着手済とは、工事の公告または指名通知済の箇所を指す。

整備 計画図	詳細 番号	箇所 番号	緊急 事業	激特 等	渓流名・箇所名	市町名	所在	対応主体	施設概要	緊 急 事 業					緊急事業 概成目標 時期
										事業 着手時期	事業 着手済	契約済	現場着手	完了	
①⑨	【1】	265	○	○	にこうがわし.せん 二河川支川21隣	熊野町	川角 5丁目	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○	○	
①⑨	【1】	266	○	○	にこうがわし.せん 二河川支川21	熊野町	川角 5丁目	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○	○	
①⑨	【1】	267	○		かわすまご.ちよ.はら 川角5丁目19地区	熊野町	川角 5丁目	県(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○	○	
①⑨	【1】	268	○		いし.たけ 石タケ地区	熊野町	石タケ	県(治山)	治山ダム		○				R3年度
①⑨	【1】	269	○	○	くまのがわし.せん 熊野川支川36隣	熊野町	萩原	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○		R3年3月
①⑨	【1】	270	○	○	おま.やま 嵩山地区	熊野町	嵩山	県(治山)	治山ダム		○	○	○		R2年12月
①⑨	【2】	271	○		だ.り.こ.う.や.ま.ご.ち.よ.は.ら 堂所山国有林	熊野町	初神	国(治山)	治山ダム		○	○	○		R2年7月
①⑨	【2】	272	○		だ.り.こ.う.や.ま.ご.ち.よ.は.ら 堂所山国有林	熊野町	初神	国(治山)	山腹工		○	○	○		R2年7月
①⑨	【2】	273	○		だ.り.こ.う.や.ま.ご.ち.よ.は.ら 堂所山国有林	熊野町	初神	国(治山)	山腹工		○	○	○		R2年7月
①⑨	【2】	274	○		だ.り.こ.う.や.ま.ご.ち.よ.は.ら 堂所山国有林	熊野町	初神	国(治山)	治山ダム		○	○	○		R2年7月
①⑨	【2】	275	○		だ.り.こ.う.や.ま.ご.ち.よ.は.ら 堂所山国有林	熊野町	初神	国(治山)	治山ダム		○	○	○		R2年7月
①⑨	【2】	276	○	○	みた.に.が.わ 三谷川	熊野町	初神	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○		R3年3月
①⑨	【2】	277	○		は.つ.か.や.ま 初神山地区	熊野町	初神山	県(治山)	治山ダム		○				R3年度
①⑨	【2】	278	○		くまのがわし.せん 熊野川支川11	熊野町	新宮	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○		R3年3月
②⑩	【1】	279	○		よ.こ.は.ま.が.わ 横浜川12	坂町	平成ヶ浜 4丁目	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○		R3年3月
②⑩	【1】	280	○		よ.こ.は.ま 横浜5416地区	坂町	横浜中央 2丁目	市町(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○		R2年9月
②⑩	【1】	281	○		よ.こ.は.ま 横浜6259地区	坂町	横浜西 2丁目	市町(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○		R2年9月
②⑩	【1】	282	○		にし.に 西6441地区	坂町	横浜西 2丁目	県(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○	○	
②⑩	【1】	283	○		ほう.しん.に.ら 法大神地区	坂町	横浜東 2丁目	県(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○	○	
②⑩	【1】	284	○		か.ま.が.に 釜ヶ谷地区	坂町	横浜東 2丁目	県(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○	○	
②⑩	【1】	285	○		にし.が.わ 西側地区	坂町	坂西 2丁目	県(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○	○	
②⑩	【1】	286	○	○	あ.ら.じ.ん.が.わ 明神川	坂町	三田尾	国(砂防)	砂防ダム		○	○	○	○	
②⑩	【1】	287	○		にし.が.わ 西獄地区	坂町	西獄	県(治山)	治山ダム		○	○	○		R2年12月
②⑩	【2】	288	○	○	お.お.は.わ 大判川	坂町	総頭山	国(砂防)	砂防ダム		○	○	○	○	
②⑩	【2】	289	○	○	お.お.は.わ 総頭川	坂町	総頭山	国(砂防)	砂防ダム		○	○	○	○	
②⑩	【2】	290	○	○	み.ず.い.が.わし.せん 水尻川支川3	坂町	水尻	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○		R3年度
②⑩	【2】	291	○	○	み.ず.い.が.わし.せん 水尻川支川4	坂町	水尻	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○		R3年度
②⑩	【2】	292	○	○	み.ず.お.が.わ 水落川	坂町	水尻	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○		R3年3月
②⑩	【2】	293	○	○	て.ん.ら.が.わ 天地川	坂町	小屋浦 4丁目	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○		R3年3月
②⑩	【2】	294	○	○	て.ん.ら.が.わし.せん 天地川支川1	坂町	小屋浦 4丁目	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○		R3年3月
②⑩	【2】	295	○	○	て.ん.ら.が.わし.せん 天地川支川2	坂町	小屋浦 4丁目	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○		R3年3月
②⑩	【2】	296	○		て.ん.ら.が.わし.せん 天地川支川5	坂町	小屋浦 4丁目	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○	○	
②⑩	【2】	297	○	○	て.ん.ら.が.わし.せん 天地川支川6	坂町	小屋浦 4丁目	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○		R3年3月
②⑩	【2】	298	○	○	て.ん.ら.が.わし.せん 天地川支川8	坂町	小屋浦 4丁目	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○		R3年3月
②⑩	【2】	299	○		て.ん.ら.が.わし.せん 天地川支川9	坂町	小屋浦 3丁目	県(砂防)	砂防ダム		○	○			R3年3月
②⑩	【2】	300	○		て.ん.ら.が.わし.せん 天地川支川10	坂町	小屋浦 3丁目	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○		R3年3月
②⑪	【1】	301	○		こ.み.や 古見山地区	世羅町	津津戸 古見山	県(治山)	治山ダム		○	○	○		R2年9月
