

「平成 30 年 7 月豪雨災害 砂防・治山施設整備計画」における緊急事業の進捗状況について

令和 2 年 9 月 17 日
森 林 保 全 課
砂 防 課

1 要 旨

平成 30 年 7 月豪雨により土砂災害が発生し、甚大な被害を受けた箇所において、早期の復旧に向け、国・県・市町が連携を図り、緊急的な砂防・治山施設の施工箇所、工事内容等の事業計画に関して調整を進め、「平成 30 年 7 月豪雨災害 砂防・治山施設整備計画（緊急事業・激特事業等）」を作成し、令和元年 5 月 17 日に公表している。

砂防ダムなどの整備については、これに基づき事業実施しているところであり、この整備計画における緊急事業の 8 月末時点の進捗状況について報告する。

2 整備計画の進捗状況

(1) 緊急事業

施設整備計画にある砂防・治山の事業箇所のうち、住宅に直接被害のあった箇所や溪流内の不安定な土砂により崩壊が拡大するおそれがある箇所など、特に緊急性の高い 301 箇所については緊急事業として整備することとしている。

令和 2 年 8 月末時点で合計 296 箇所（砂防関係 198 箇所、治山関係 98 箇所）が工事契約済となり、そのうち 139 箇所（砂防関係 100 箇所、治山関係 39 箇所）は工事が完了している。

(2) 各機関の進捗状況（令和 2 年 8 月末時点）

各機関の進捗状況は、次のとおりである。

（単位：箇所）

区分	事業主体	事業種別	緊急事業 箇所数	地元調整 発注準備	契約済	前月からの 増	現場着手	完了	
								完了	前月からの 増
砂防	国土交通省	砂防事業	20	0	20	0	20	17	0
	広島県 (砂防課)	砂防事業	85	0	85	0	84	26	4
		急傾斜地崩壊対策事業	26	0	26	0	26	23	1
	広島県砂防事業計		111	0	111	0	110	49	5
	市町	急傾斜地崩壊対策事業	68	1	67	0	67	34	2
小 計(砂 防)			199	1	198	0	197	100	7
治山	農林水産省	治山事業	39	1	38	0	38	22	5
	広島県 (森林保全課)	治山事業	59	2	57	1	56	17	1
	市町	治山事業	4	1	3	0	3	0	0
小 計(治 山)			102	4	98	1	97	39	6
緊 急 事 業 合 計			301	5	296	1	294	139	13

(3) 各市町別の緊急事業の契約状況（令和2年8月末時点）

対応主体 市町	砂防事業								急傾斜事業								治山事業								市町箇所数 合計			
	国				県				県				市町				国				県				市町			
	緊急 事業 箇所	工事 契約 済	現場 着手	完了	緊急 事業 箇所	工事 契約 済	現場 着手	完了	緊急 事業 箇所	工事 契約 済	現場 着手	完了	緊急 事業 箇所	工事 契約 済	現場 着手	完了	緊急 事業 箇所	工事 契約 済	現場 着手	完了	緊急 事業 箇所	工事 契約 済	現場 着手	完了	緊急 事業 箇所	工事 契約 済	現場 着手	完了
広島市	12	12	12	9	8	8	7	2	3	3	3	3	5	4	4	3	4	4	4	4	12	11	11	4	-	-	-	-
①東区	2	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	3	3	3	0	-	-	-	-
②南区	-	-	-	-	2	2	2	0	1	1	1	1	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
③西区	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
④安佐北区	4	4	4	4	1	1	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	7	7	4	-	-	-	-
⑤安芸区	6	6	6	4	5	5	4	2	2	2	2	2	-	-	-	3	3	3	3	2	1	1	0	-	-	-	-	-
⑥呉市	5	5	5	5	22	22	22	4	6	6	6	5	1	1	1	1	7	7	7	7	6	6	6	2	1	1	0	49
⑦竹原市	-	-	-	-	4	4	4	2	4	4	4	3	9	9	9	6	1	1	1	1	8	8	8	0	-	-	-	-
⑧三原市	-	-	-	-	8	8	8	3	-	-	-	-	6	6	6	6	8	8	8	2	4	4	4	0	-	-	-	-
⑨尾道市	-	-	-	-	5	5	5	3	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-
⑩福山市	-	-	-	-	1	1	1	0	2	2	2	2	10	10	10	9	1	0	0	0	3	3	3	3	-	-	-	-
⑪府中市	-	-	-	-	1	1	1	0	1	1	1	1	4	4	4	1	-	-	-	-	2	2	2	1	-	-	-	-
⑫庄原市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
⑬東広島市	-	-	-	-	13	13	13	7	-	-	-	-	7	7	7	1	12	12	12	1	13	13	13	4	-	-	-	-
⑭廿日市市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
⑮安芸高田市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	1	1	1	0	-	-	-	-
⑯江田島市	-	-	-	-	4	4	4	2	2	2	2	1	18	18	18	2	-	-	-	-	2	2	2	1	-	-	-	-
⑰府中町	-	-	-	-	1	1	1	0	-	-	-	-	3	3	3	3	-	-	-	-	1	1	1	0	-	-	-	-
⑱海田町	-	-	-	-	1	1	1	0	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
⑲熊野町	-	-	-	-	5	5	5	2	1	1	1	1	-	-	-	-	6	6	6	6	4	3	2	1	2	2	2	0
⑳坂町	3	3	3	3	12	12	12	1	4	4	4	4	2	2	2	0	-	-	-	-	1	1	1	0	-	-	-	-
㉑世羅町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	0	-	-	-	-	-
合計	20	20	20	17	85	85	84	26	26	26	26	23	68	67	67	34	39	38	38	21	59	57	56	17	4	3	3	0

[緊急事業箇所の実施状況]



県砂防事業 南幸川
(広島市安芸区)



県急傾斜事業 大君地区
(江田島市大柿町)



県治山事業 白金山地区
(三原市本郷町)

(4) 令和2年8月に完了した箇所

令和2年8月に完了した箇所は次のとおりである。

(単位：箇所)

事業名	事業主体	箇所名	施工位置	概成年月日
災害関連緊急砂防事業	広島県	畑賀川支川7隣	広島市安芸区	R2.8.11
		鎌ヶ原左支溪	呉市押込6丁目	R2.8.31
		頭谷川2隣	三原市大和町	R2.8.31
		東鳴滝城川隣2	尾道市吉和町	R2.8.31
災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業	広島県	下為角4111地区	広島市安芸区	R2.8.11
災害関連 地域防災がけ崩れ対策事業	竹原市	青田9476-2地区	竹原市東野町	R2.8.4
	三原市	大長寺川2地区	三原市小坂町	R2.8.31
国有林野直轄治山災害関連緊急事業	農林水産省	堂所山国有林	熊野町初神	R2.8.31
		堂所山国有林	熊野町初神	R2.8.31
		堂所山国有林	熊野町初神	R2.8.31
		堂所山国有林	熊野町初神	R2.8.31
		堂所山国有林	熊野町初神	R2.8.31
災害関連緊急治山事業	広島県	水ヶ浦地区	江田島市水ヶ浦	R2.8.31
砂防激甚災害対策特別緊急事業	広島県	本頭川隣	東広島市西条町	R2.8.28

3 公表内容の詳細について

- ・砂防課のホームページ内で、令和元年5月17日公表済みの「平成30年7月豪雨災害 砂防・治山施設整備計画（緊急事業・激特事業等）事業箇所一覧表～災害関連緊急事業の進捗状況（契約済み、現場着手、完了）の情報を定期的に更新するとともに、概成した箇所についても積極的に情報発信する。
- ・各関係機関（国交省広島西部山系砂防事務所、林野庁近畿中国森林管理局、森林保全課、広島県西部建設事務所、呉支所、東広島支所、東部建設事務所、三原支所）のホームページへのリンクを貼り、緊急事業に関する進捗状況について情報発信の充実を図っている。

<https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/100/201807gousuiseitsuseibikeikaku-kinkyuugekitoku.html>

- ・引き続き、被災者の皆様、地域住民の方々への丁寧な説明により、ご理解をいただくとともに、あわせて、工事の進捗状況を写真で示すなど定期的な更新を行い、県民の皆様への情報発信の充実を図っていく。

【砂防課 ホームページ】

【森林保全課 ホームページ】

【西部建設 ホームページ】

【呉支所 ホームページ】

【東広島支所 ホームページ】


【東部建設 ホームページ】

【三原支所 ホームページ】

4 資料

平成30年7月豪雨災害 砂防・治山施設整備計画（緊急事業・激特事業等）事業箇所一覧表（緊急事業のみ抜粋）

平成30年7月豪雨に伴い、広島市安芸区畑賀町において発生した土砂災害（土石流）に対して、広島県が緊急的に実施している災害関連緊急砂防事業について、所定の高さまでの堰堤工事が完了しました。（令和2年8月11日）引き続き、地域の安全度を高めるため、激特事業により砂防ダムの高上げ工事などを実施します。

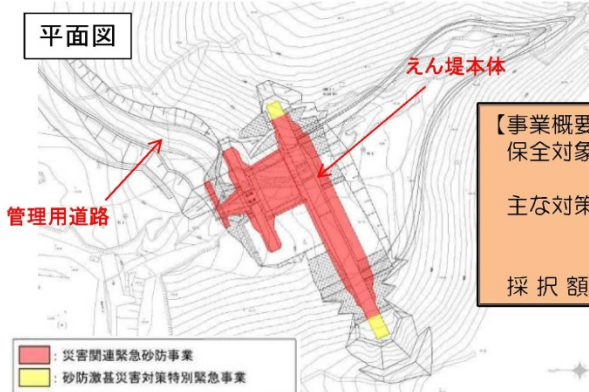


【事業概要】
 保全対象：人家41戸、市道、県道
 主な対策：砂防堰堤 1基
 高さ8.0m、幅58.0m
 （緊急事業分：高さ7.0m）
 採 択 額：約2.2億円（緊急事業）

【被害状況】
 土砂災害発生日：平成30年7月6日

被災状況




堰堤一般図



工事完了（令和2年8月11日）



平成30年7月豪雨に伴い、呉市押込6丁目において発生した土砂災害（土石流）に対して、広島県が緊急的に実施している災害関連緊急砂防事業について、堰堤工事（本堤部）が完了しました。（令和2年8月31日）引き続き、地域の安全確保のため、堰堤周辺部の工事を実施します。

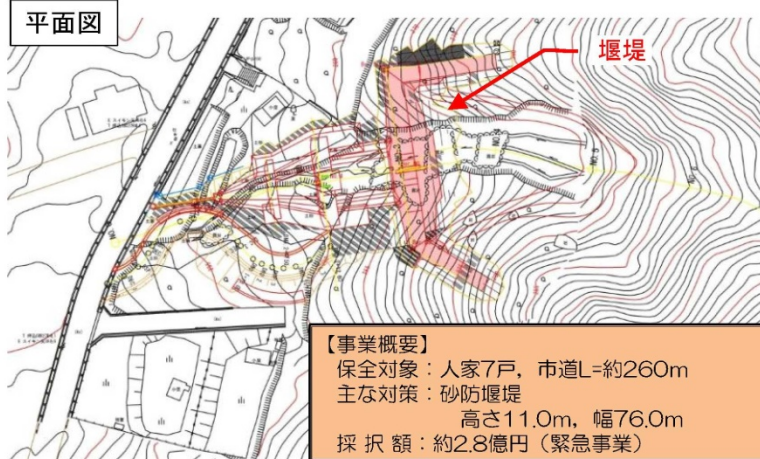


【被害状況】
 土砂災害発生日：平成30年7月6日
 半壊：1戸
 一部損壊：2戸
 市道：約250m

【事業概要】
 保全対象：人家7戸、市道L=約260m
 主な対策：砂防堰堤
 高さ11.0m、幅76.0m
 採 択 額：約2.8億円（緊急事業）

被災状況




堰堤一般図



設計：大日本コンサルタント株式会社
 施工：大日本建設株式会社
 発注：西部建設事務所呉支所

進捗状況

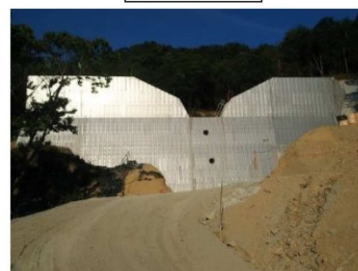

工事完了（令和2年8月31日）

平成30年7月豪雨に伴い、三原市大和町福田において発生した土砂災害（土石流）に対して、広島県が緊急的に実施している災害関連緊急砂防事業について、堰堤工事（本堤部）の工事が完了しました。（令和2年8月31日）引き続き、地域の安全確保のため、堰堤下流部の工事を実施します。

位置図



頭谷川2隣


【被害状況】

土砂災害発生日：平成30年7月6日
全壊：2戸
市道：約70m

被災状況




平面図

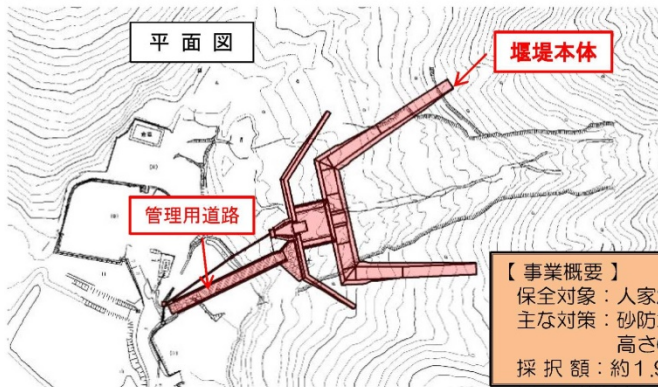

【事業概要】

保全対象：人家2戸
主な対策：砂防堰堤 1基
高さ6.5m、幅 122m
採択額：約1.9億円

堰堤一般図

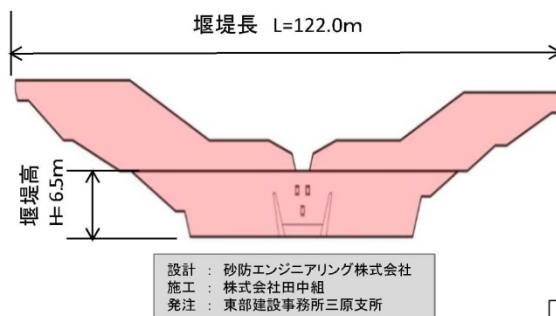

■進捗状況



工事完了（令和2年8月31日）

平成30年7月豪雨に伴い、尾道市吉和町において発生した土砂災害（土石流）に対して、広島県が緊急的に実施している災害関連緊急砂防事業について、所定の高さまでの堰堤工事が完了しました。（令和2年8月31日）引き続き、地域の安全度を高めるため、激特事業により砂防ダムの高上げ工事などを実施します。

位置図



東鳴滝城川隣2


【被害状況】

土砂災害発生日：平成30年7月7日
半壊：2戸
市道：約480m

被災状況




平面図

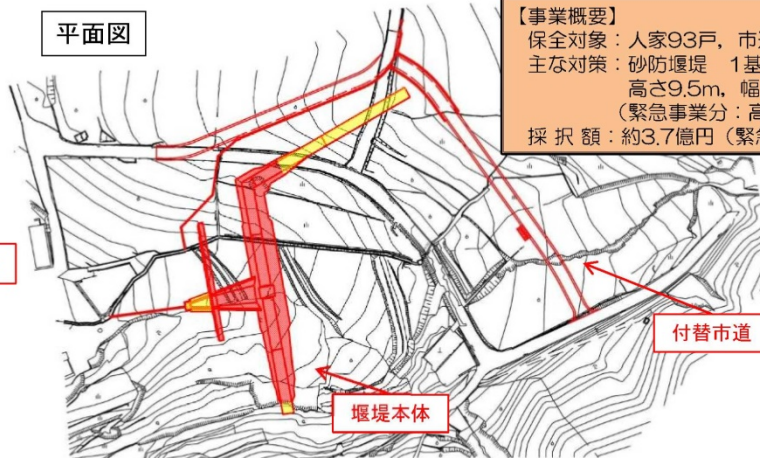

【事業概要】

保全対象：人家93戸、市道
主な対策：砂防堰堤 1基
高さ9.5m、幅 117.0m
（緊急事業分：高さ7.5m）
採択額：約3.7億円（緊急事業）

堰堤一般図

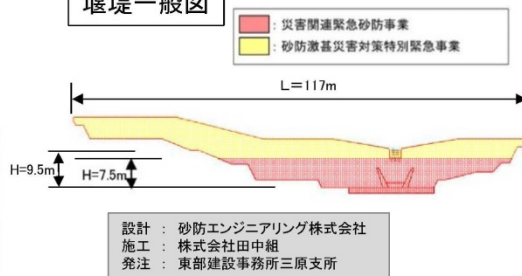

工事完了（令和2年8月31日）



【下為角4111地区】災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業の完了について 広島県

平成30年7月豪雨に伴い、広島市安芸区畑賀町において発生した土砂災害（がけ崩れ）に対して、広島県が緊急的に実施した急傾斜地崩壊対策事業が完了しました（令和2年8月11日）。


引き続き、地域の安全度を高めるため、隣接する範囲において、通常事業により法枠工などの対策工事を実施します。

位置図



下為角4111地区

平面図

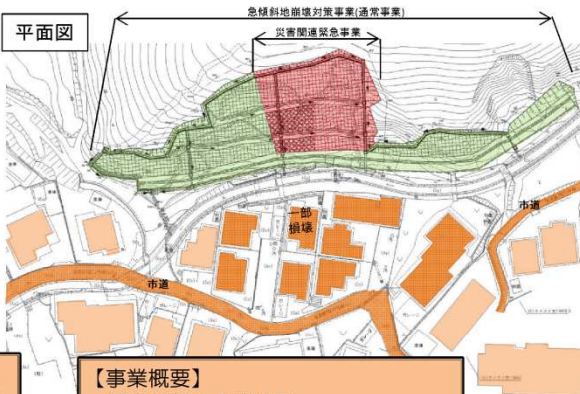

【被害状況】

土砂災害発生日：平成30年7月6日
一部損壊：1戸


【事業概要】

保全対象：人家8戸
主な対策：法枠工 約554㎡
事業費：約49,000千円

工事着手前




標準断面図

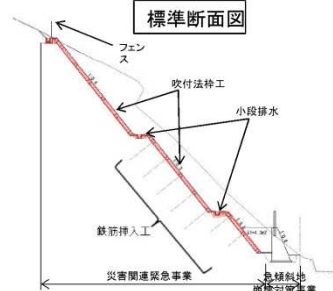

設計：復建調査設計株式会社
施工：アイワ産業株式会社

工事完了（令和2年8月11日）

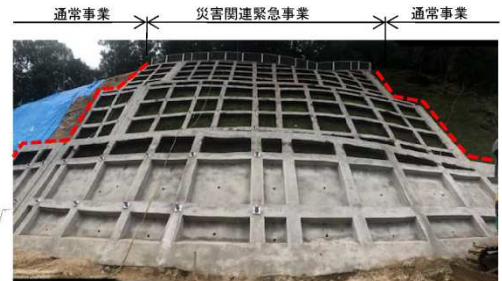

斜面崩壊・被災状況（H30年7月）



【青田9476-2地区】災害関連地域防災がけ崩れ対策事業の完了について（竹原市）


平成30年7月豪雨に伴い、竹原市東野町において発生した土砂災害（がけ崩れ）に対して、竹原市が緊急的に実施したがけ崩れ対策事業が完了しました（令和2年8月4日）。

位置図



青田9476-2地区

平面図

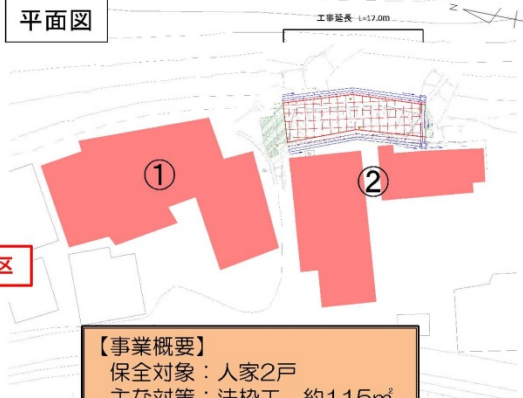

【被害状況】

土砂災害発生日：平成30年7月7日

【事業概要】

保全対象：人家2戸
主な対策：法枠工 約115㎡
事業費：約22,099千円

工事着手前



標準断面図



設計：株式会社間瀬コンサルタント
施工：株式会社青木建設

工事完了（令和2年8月4日）



斜面崩壊・被災状況（H30年7月）



【大長寺川2地区】災害関連地域防災がけ崩れ対策事業の完了について（三原市）

平成30年7月豪雨に伴い、三原市小坂町において発生した土砂災害（がけ崩れ）に対して、三原市が緊急的に実施したがけ崩れ対策事業が完了しました（令和2年8月31日）。


位置図



大長寺川2地区

【被害状況】
土砂災害発生日：平成30年7月6日
半壊：1戸

平面図

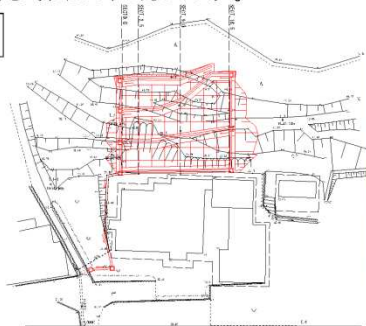

斜面崩壊・被災状況（H30年7月）



標準断面図



【事業概要】

保全対象：人家2戸
主な対策：法枠工 約253m²
事業費：約30,300千円

設計：有限会社 児玉測量設計
施工：先勝緑地建設有限会社



工事着手前



工事完了（令和2年8月31日）



【国有林野内直轄治山災害関連緊急事業】


堂所山災害復旧工事の完成について ①



国民の森林・国有林

平成30年7月豪雨災害で荒廃した溪流の復旧対策として施工中のコンクリート治山ダム3基が完成しました。治山ダムの完成により荒廃溪流の土砂流出を抑制することができるようになりました。

【位置図】

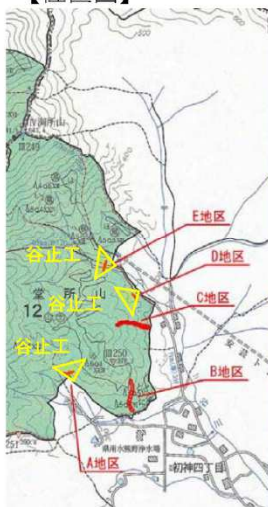

【工事前の荒廃状況】



【完成状況】



- 工事概要：治山ダム3基 コンクリート谷止工（A地区：高さ11.0m・延長52.0m D地区：高さ9.5m・延長36.0m E地区：高さ10.0m・延長48.0m）
- 事業費：308百万円（全体）
- 発注者：広島森林管理署
- 施工者：株式会社 日浦組
- 完成年月日：令和2年8月31日


【国有林野内直轄治山災害関連緊急事業】

堂所山災害復旧工事の完成について ②



平成30年7月豪雨災害で崩壊した山腹の復旧対策として施工中の山腹工2箇所が完成しました。
山腹工の完成により崩壊斜面の土砂流出の抑制及び緑化の促進することができるようになりました。

【位置図】

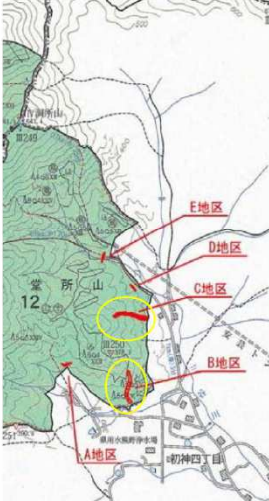

【工事前】



B地区 山腹工

【完成後】



【工事前】



C地区 山腹工

【完成後】



- 工事概要：山腹工2箇所（B地区：面積0.25ha C地区：面積0.25ha） ○事業費：308百万円（全体）
- 発注者：広島森林管理署 ○施工者：株式会社 日浦組 ○完成年月日：令和2年8月31日

広島県安芸郡熊野町 堂所山国有林（平成30年7月豪雨災害 砂防・治山施設整備計画番号 ⑨-【2】-272・273）

みずがうら 【水ヶ浦】災害関連緊急治山事業 溪間工事の本堤完了について




平成30年7月豪雨に伴い、江田島市江田島町において発生した土砂災害（土石流）に対して、広島県が緊急的に実施している、災害関連緊急治山事業溪間工事の治山ダム本堤が完了しました。（令和2年8月31日）

引き続き、流域の安全度を高めるため、洗堀防止対策を実施します。

位置図



平面図

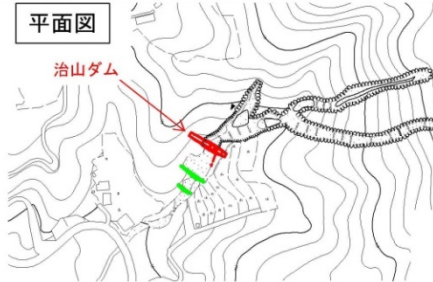

本堤完了



被災状況



本堤完了



【被害状況】
土砂災害発生日：平成30年7月6日
土砂流入：工場、国道

【事業概要】
谷止工 1基 高さ9.0m、幅41.5m、体積1,311.5m3
事業費：約90,000千円

設計：フォレスト（有）
施工：三興建設（株）

平成30年7月豪雨に伴い、東広島市西条町において発生した土砂災害（土石流）に対して、広島県が緊急に実施している災害関連緊急砂防事業・砂防激甚災害対策特別緊急事業について、堰堤工事（本堤部）が完了しました。（令和2年8月28日）引き続き、地域の安全度を高めるため、堰堤周辺部などの工事を実施します。

位置図



平面図



堰堤


【事業概要】

保全対象：人家5戸
国道L=約220m
市道L=約780m
主な対策：砂防堰堤 1基
高さ10.0m、幅68.0m
（緊急事業分：高さ8.0m）
採択額：約2.7億円（緊急事業）

【被害状況】

土砂災害発生日：平成30年7月7日
死者：3名
全壊：1戸
国道：約100m
市道：約200m

堰堤一般図



被災状況



工事完了（令和2年8月28日）

緊急事業完了高さ H=8.0m
令和2年6月30日

設計：株式会社荒谷建設コンサルタント
施工：シンクコンストラクション株式会社
発注：西部建設事務所東広島支所

平成30年7月豪雨災害 砂防・治山施設整備計画(緊急事業・激特事業等)事業箇所一覧表

資料

令和2年8月末時点

※事業着手済とは、工事の公告または指名通知済の箇所を指す。

整備 計画図	詳細 番号	箇所 番号	緊急 事業	激特 等	渓流名・箇所名	市町名	所在	対応主体	施設概要	緊 急 事 業					緊急事業 概成目標 時期
										事業 着手時期	事業 着手済	契約済	現場着手	完了	
①	【1】	1	○	○	おおたにがわ 大谷川	広島市	東区 馬木 8丁目	国(砂防)	砂防ダム		○	○	○	○	
①	【1】	2	○	○	てらにようがわ(支) 寺桑川右支	広島市	東区 福田 1丁目	国(砂防)	砂防ダム		○	○	○		R2年11月
①	【2】	3	○		うぶさきおおた 戸坂大上地区	広島市	東区 戸坂大上 1丁目	県(治山)	治山ダム		○	○	○		R2年12月
①	【2】	4	○		うしなひがしよんちようめ 牛田東4丁目①地区	広島市	東区 牛田東 4丁目	県(治山)	治山ダム		○	○	○		R2年12月
①	【2】	5	○		うしなひがしよんちようめ 牛田東4丁目②地区	広島市	東区 牛田東 4丁目	県(治山)	治山ダム		○	○	○		R2年12月
①	【2】	6	○		なかつやまにいちちようめ 中山西一丁目地区	広島市	東区 中山西 1丁目	市町(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○	○	
②	【1】	7	○		うにやのまこひめりん 宇品山園有林	広島市	南区 元宇品	国(治山)	山腹工		○	○	○	○	
②	【1】	8	○		くすねちよう 楠那町14地区	広島市	南区 楠那町	県(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○	○	
②	【1】	9	○	○	おおこうがわ(支) 左岸 大河川支川1隣	広島市	南区 日宇那町	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○		R3年3月
②	【2】	10	○	○	かたがわ 家下川2	広島市	南区 似島町	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○		R3年度
③	【1】	11	○	○	やまきたがわ 山田町34地区	広島市	西区 山田町	市町(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○	○	
③	【1】	12	○	○	こまへ上五丁目26地区	広島市	西区 己斐上 5丁目	市町(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○		R2年9月
③	【1】	13	○	○	みなぎんまふいちちようめ 三滝本町一丁目35地区	広島市	西区 三滝本町 1丁目	市町(急傾斜)	急傾斜地対策		○				R3年3月
③	【2】	14	○	○	いぬのちちちめ 井口二丁目4地区	広島市	西区 井口 3丁目	市町(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○	○	
④	【1】	15	○	○	あまがわ(支) 左岸 三篠川支川76	広島市	安佐北区 白木町 井原	県(砂防)	砂防ダム、地すべり 対策		○	○	○		R3年3月
④	【2】	16	○		にしよなが 西吉永地区	広島市	安佐北区 白木町 三田	県(治山)	治山ダム		○	○	○		R2年12月
④	【3】	17	○		みつかけやま 光掛山1地区	広島市	安佐北区 落合南町	県(治山)	治山ダム		○	○	○	○	
④	【3】	18	○		みつかけやま 光掛山2地区	広島市	安佐北区 落合南町	県(治山)	治山ダム		○	○	○	○	
④	【3】	19	○		みつかけやま 光掛山3地区	広島市	安佐北区 落合南町	県(治山)	治山ダム		○	○	○	○	
④	【3】	20	○		しんちよう 榎村地区	広島市	安佐北区 上深川町 榎村	県(治山)	治山ダム		○	○	○		R2年9月
④	【3】	21	○		きんがわ 木ノ宗地区	広島市	安佐北区 小河原町 木ノ宗	県(治山)	治山ダム		○	○	○		R2年9月
④	【4】	22	○		きんがわ 笹原地区	広島市	安佐北区 口田南町	県(治山)	治山ダム		○	○	○	○	R2年12月
④	【4】	23	○	○	おとがわ 小田川	広島市	安佐北区 口田南 3丁目	国(砂防)	砂防ダム		○	○	○	○	
④	【4】	24	○	○	やちがわ(支) 左岸 矢口川支川	広島市	安佐北区 口田南 5丁目	国(砂防)	砂防ダム		○	○	○	○	
④	【4】	25	○	○	いぬがわ(支) 左岸 一ヶ谷川(279-2)	広島市	安佐北区 口田南 5丁目	国(砂防)	砂防ダム		○	○	○	○	
④	【4】	26	○	○	いぬがわ(支) 左岸 一ヶ谷川(279-1)	広島市	安佐北区 口田南 5丁目	国(砂防)	砂防ダム		○	○	○	○	
⑤	【1】	27	○		たけしんやまこひめりん 立石山園有林	広島市	安芸区 瀬野町	国(治山)	治山ダム		○	○	○	○	
⑤	【2】	28	○	○	おおたにがわ 大元谷川	広島市	安芸区 上瀬野町	国(砂防)	砂防ダム		○	○	○	○	
⑤	【3】	29	○		ほろがわ(支) 左岸 畑賀川支川7隣	広島市	安芸区 畑賀町	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○	○	
⑤	【3】	30	○	○	ほろがわ(支) 左岸 畑賀川支川7	広島市	安芸区 畑賀町	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○	○	
⑤	【3】	31	○	○	しもがわ 下島角4111地区	広島市	安芸区 畑賀町	県(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○	○	
⑤	【3】	32	○		おかげやま 影山地区	広島市	安芸区 畑賀町 影山	県(治山)	治山ダム		○	○	○		R3年3月
⑤	【3】	33	○	○	きんのうがわ 山王川	広島市	安芸区 中野東 3丁目	国(砂防)	砂防ダム		○	○	○	○	
⑤	【4】	34	○	○	みなみふけいけがわ 南幸川	広島市	安芸区 矢野町	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○		R3年3月
⑤	【4】	35	○		にしきびら 西崎平地区	広島市	安芸区 矢野町 西崎平	県(治山)	治山ダム		○				R3年度
⑤	【4】	36	○	○	おのにしよんちようめ 矢野西三丁目37地区	広島市	安芸区 矢野西 3丁目	県(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○	○	
⑤	【4】	37	○	○	くまがわ 熊崎川	広島市	安芸区 矢野東 6丁目	県(砂防)	砂防ダム		○	○			R3年度
⑤	【5】	38	○	○	まほがわ 的場川	広島市	安芸区 矢野東 7丁目	国(砂防)	砂防ダム		○	○	○		R2年9月
⑤	【5】	39	○	○	かみながわ(支) 左岸 神長日広川	広島市	安芸区 矢野東 7丁目	国(砂防)	砂防ダム		○	○	○	○	
⑤	【5】	40	○	○	かみながわ(支) 左岸 神長川	広島市	安芸区 矢野東 7丁目	国(砂防)	砂防ダム		○	○	○	○	
⑤	【5】	41	○	○	かみながわ(支) 左岸 神長南川	広島市	安芸区 矢野東 7丁目	国(砂防)	砂防ダム		○	○	○		R2年11月
⑤	【5】	42	○	○	かみながわ(支) 左岸 樫木来屋南川	広島市	安芸区 矢野町	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○		R3年3月
⑤	【5】	43	○		おかげやまこひめりん 峠山園有林	広島市	安芸区 矢野町	国(治山)	治山ダム		○	○	○	○	
⑤	【5】	44	○		おかげやまこひめりん 峠山園有林	広島市	安芸区 矢野町	国(治山)	治山ダム		○	○	○	○	

平成30年7月豪雨災害 砂防・治山施設整備計画(緊急事業・激特事業等)事業箇所一覧表

資料

令和2年8月末時点

※事業着手済とは、工事の公告または指名通知済の箇所を指す。

整備 計画図	詳細 番号	箇所 番号	緊急 事業	激特 等	渓流名・箇所名	市町名	所在	対応主体	施設概要	緊 急 事 業					緊急事業 概成目標 時期
										事業 着手時期	事業 着手済	契約済	現場着手	完了	
⑥	【1】	45	○		たつのりやまごのやうり山 竜ノ口山国有林	呉市	焼山北	国(治山)	治山ダム		○	○	○	○	
⑥	【1】	46	○		たつがやね 龍ヶ畝地区	呉市	焼山町 龍ヶ畝	県(治山)	治山ダム		○	○	○	○	
⑥	【1】	47	○		おまがほみながわひびのしんけい 鎌ヶ原川左支溪	呉市	押込 6丁目	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○	○	
⑥	【1】	48	○		めうそやまごのやうり山 ノウツ山国有林	呉市	押込	国(治山)	治山ダム		○	○	○	○	
⑥	【2】	49	○		ふなきまご 船木迫地区	呉市	安浦町 中畑 船木迫	県(治山)	治山ダム		○	○	○		R3年3月
⑥	【2】	50	○	○	いずみのにがわ 泉谷川	呉市	安浦町 中畑	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○	○	
⑥	【2】	51	○	○	なかがほみながわ 中ヶ原川	呉市	安浦町 下垣内	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○	○	
⑥	【2】	52	○		もふのけに エフリ谷地区	呉市	安浦町 中畑 エフリ谷	県(治山)	治山ダム		○	○	○		R3年3月
⑥	【2】	53	○		おまがまご 釜ヶ迫地区	呉市	安浦町 中畑 釜ヶ迫	県(治山)	治山ダム		○	○	○		R3年3月
⑥	【2】	54	○		なかせやま 中山地区	呉市	安浦町 中畑 中山	県(治山)	治山ダム		○	○	○	○	
⑥	【3】	55	○		てんのかしらにしようさんちようめ 天応西条3丁目20地区	呉市	天応	県(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○	○	
⑥	【3】	56	○	○	おまがまご 青芦川支川(90d)	呉市	天応 西条 3丁目	国(砂防)	砂防ダム		○	○	○	○	
⑥	【3】	57	○	○	せとかわしせら 青芦川支川(90f)	呉市	天応 西条 3丁目	国(砂防)	砂防ダム		○	○	○	○	
⑥	【3】	58	○	○	おまがまご 大屋大川	呉市	焼山町	国(砂防)	砂防ダム		○	○	○	○	
⑥	【3】	59	○	○	おまがまご 大屋大川左支川	呉市	天応町	国(砂防)	砂防ダム		○	○	○	○	
⑥	【3】	60	○	○	おまがまご 大屋大川(92隣e)	呉市	天応 東久保 2丁目	国(砂防)	砂防ダム		○	○	○	○	
⑥	【3】	61	○	○	うめさがわしせら 梅木川支川	呉市	大山町	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○		R3年3月
⑥	【3】	62	○	○	うめさがわしせら 梅木川隣	呉市	長谷町	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○		R3年度
⑥	【3】	63	○		いのししやまごのやうり山 猪山国有林	呉市	吉浦町	国(治山)	治山ダム		○	○	○	○	
⑥	【3】	64	○		いのししやまごのやうり山 猪山国有林	呉市	狩留賀町	国(治山)	山腹工		○	○	○	○	
⑥	【3】	65	○		いのししやまごのやうり山 猪山国有林	呉市	狩留賀町	国(治山)	山腹工		○	○	○	○	
⑥	【3】	66	○		いのししやまごのやうり山 猪山国有林	呉市	狩留賀町	国(治山)	山腹工		○	○	○	○	
⑥	【3】	67	○		いのししやまごのやうり山 猪山国有林	呉市	狩留賀町	国(治山)	治山ダム		○	○	○	○	
⑥	【3】	68	○	○	うめさ 梅ノ木	呉市	焼山東 4丁目	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○		R3年3月
⑥	【4】	69	○		いのししやまごのやうり山 一ノ松光山地区	呉市	郷原町 一ノ松光山	市町(治山)	山腹工等	調整中					R3年3月
⑥	【5】	70	○	○	いしほがわ 石ヶ森川	呉市	安浦町 原畑	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○		R2年9月
⑥	【6】	71	○	○	みづはら 水尻川	呉市	安浦町 三津口	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○	○	
⑥	【7】	72	○	○	うねがわ-おまいり 宇根川・笠岩川	呉市	吉浦新出町	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○		R3年3月
⑥	【7】	73	○		おまがまご 西蔵川2丁目14地区	呉市	西蔵川 2丁目	県(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○	○	
⑥	【8】	74	○	○	あしかのやうり 芦冠川	呉市	広 三芦 1丁目	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○		R3年度
⑥	【8】	75	○	○	ひがしやうり 東両谷川	呉市	広 両谷	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○		R3年3月
⑥	【8】	76	○		ひろふつ神社 広船津神社東地区	呉市	広 両谷 3丁目	県(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○	○	
⑥	【8】	77	○		にがらぼんまらにもようり 仁方本町2丁目10地区	呉市	仁方本町 2丁目	県(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○	○	
⑥	【8】	78	○	○	おまがまご 大坪川	呉市	広町白石免田	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○		R3年3月
⑥	【8】	79	○		おまがまご 大壺川支川	呉市	広 長浜 1丁目	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○		R3年3月
⑥	【8】	80	○	○	こつばにがわ 小坪西川	呉市	広 小坪 1丁目	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○		R3年3月
⑥	【9】	81	○		こようり 小用一号	呉市	川尻町 小用 2丁目	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○		R3年3月
⑥	【9】	82	○		こようり 小用一号隣	呉市	川尻町 小用 2丁目	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○		R3年3月
⑥	【10】	83	○	○	すがわ 菅原川支川	呉市	普戸町 北隠渡 2丁目	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○		R3年3月
⑥	【11】	84	○		おまがまご 刈浜地区	呉市	蒲刈町 向	県(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○		R3年3月
⑥	【11】	85	○		あしかのやうり 後原川	呉市	蒲刈町 大浦	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○		R3年3月
⑥	【12】	86	○	○	こようり 鯉ノ浦川隣	呉市	普戸町 早瀬 2丁目	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○		R3年3月
⑥	【12】	87	○	○	こようり 鯉ノ浦川隣2	呉市	普戸町 早瀬 2丁目	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○		R3年3月
⑥	【12】	88	○	○	おまがまご 岡様川	呉市	普戸町 先奥 3丁目	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○		R3年3月

平成30年7月豪雨災害 砂防・治山施設整備計画(緊急事業・激特事業等)事業箇所一覧表

資料

令和2年8月末時点

※事業着手済とは、工事の公告または指名通知済の箇所を指す。

整備 計画図	詳細 番号	箇所 番号	緊急 事業	激特 等	渓流名・箇所名	市町名	所在	対応主体	施設概要	緊 急 事 業					緊急事業 概成目標 時期
										事業 着手時期	事業 着手済	契約済	現場着手	完了	
⑥	【12】	89	○		はなみ 渡多見地区	呉市	音戸町 波多見 10丁目	市町(治山)	山腹工等		○	○	○		R3年3月
⑥	【13】	90	○		こかわ 小宇和木地区	呉市	倉橋町 小宇和木	県(治山)	山腹工等		○	○	○		R2年12月
⑥	【13】	91	○		くさね 草部D地区	呉市	倉橋町 宇和木	県(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○	○	
⑥	【13】	92	○	○	こづね 小塚A地区	呉市	倉橋町 宇和木	市町(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○	○	
⑥	【13】	93	○		おまがわとより 納川隣	呉市	倉橋町	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○		R3年3月
⑦	【1】	94	○		きんが 背戸峯地区	竹原市	田万里町 背戸峯	県(治山)	治山ダム		○	○	○		R2年9月
⑦	【1】	95	○		ひがてんがに 東天下城地区	竹原市	西野町 東天下城	県(治山)	治山ダム		○	○	○		R2年12月
⑦	【1】	96	○		いせみやま 伊勢宮山地区	竹原市	西野町 伊勢宮山	県(治山)	治山ダム		○	○	○		R2年9月
⑦	【1】	97	○	○	おんがわしん 賀茂川支川7	竹原市	西野町	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○		R3年3月
⑦	【1】	98	○	○	おんがわしん 賀茂川支川8	竹原市	西野町	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○		R2年9月
⑦	【1】	99	○		にしきうし 西葛子地区	竹原市	新庄町 西葛子	県(治山)	治山ダム		○	○	○		R2年12月
⑦	【2】	100	○	○	かみ 下仁賀地区	竹原市	仁賀町	県(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○	○	
⑦	【2】	101	○		みつ 光時地区	竹原市	仁賀町 光時	県(治山)	治山ダム		○	○	○		R2年12月
⑦	【2】	102	○	○	おんがわしん 中条川	竹原市	東野町	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○	○	
⑦	【2】	103	○		なかじょう 中条山地区	竹原市	東野町 中条山	県(治山)	治山ダム		○	○	○		R2年12月
⑦	【2】	104	○		あお 青田9476-2地区	竹原市	東野町 青田	市町(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○	○	
⑦	【2】	105	○		かみやま 片山谷862地区	竹原市	新庄町 片山谷	県(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○		R2年9月
⑦	【2】	106	○		かみやま 片山谷9536地区	竹原市	新庄町 片山谷	市町(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○	○	
⑦	【2】	107	○		ひがしあに 東上条地区	竹原市	下野町 東上条	県(治山)	山腹工等		○	○	○		R2年9月
⑦	【2】	108	○		みやもと 宮原9457地区	竹原市	下野町 宮原	市町(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○	○	
⑦	【3】	109	○		きたに 北谷地区	竹原市	竹原町 北谷	県(治山)	山腹工等		○	○	○		R2年9月
⑦	【3】	110	○		こぶきやまこくゆり 小吹山国有林	竹原市	小梨町	国(治山)	治山ダム		○	○	○	○	
⑦	【3】	111	○	○	おんがわしん 飯屋谷川	竹原市	港町 5丁目	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○	○	
⑦	【3】	112	○		たかやま 高山671地区	竹原市	港町 5丁目	市町(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○	○	R2年9月
⑦	【3】	113	○		あき 皆実2319地区	竹原市	竹原町 皆実	市町(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○	○	
⑦	【4】	114	○		おんがわしん 観音谷地区	竹原市	吉名町	県(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○	○	
⑦	【4】	115	○		こふし 小浦尻2304地区	竹原市	吉名町 小浦尻	市町(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○		R2年12月
⑦	【4】	116	○		こふし 小浦尻2304-1地区	竹原市	吉名町 小浦尻	市町(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○		R2年9月
⑦	【4】	117	○		こふし 浦尻6344-1地区	竹原市	吉名町 浦尻	市町(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○		R2年9月
⑦	【4】	118	○		こふし 小平方地区	竹原市	吉名町	県(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○	○	
⑦	【4】	119	○		あき 曾井3721地区	竹原市	吉名町 曾井	市町(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○	○	
⑧	【1】	120	○		おんがわしん 頭谷川2隣	三原市	大和町 福田	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○	○	
⑧	【1】	121	○	○	あき 深見地区	三原市	大和町 下徳良 深見	県(治山)	治山ダム		○	○	○		R3年3月
⑧	【2】	122	○	○	おんがわしん 平沖隣	三原市	大和町 棟梨	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○		R3年3月
⑧	【2】	123	○		おんがわしん 和木地区	三原市	大和町 和木	県(治山)	治山ダム		○	○	○		R3年度
⑧	【2】	124	○		おんがわしん 東川	三原市	大和町 和木	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○		R2年9月
⑧	【3】	125	○		いしやま 石山沖東地区	三原市	久井町 羽倉	市町(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○	○	
⑧	【4】	126	○	○	おんがわしん 山岡西川隣	三原市	久井町 吉田行広	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○		R3年3月
⑧	【5】	127	○		おんがわしん 河頭隣	三原市	大和町 大草	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○		R3年3月
⑧	【5】	128	○		おんがわしん 河頭隣1	三原市	大和町 大草	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○		R2年9月
⑧	【5】	129	○		おんがわしん 姥ヶ原山国有林	三原市	大和町 姥ヶ原	国(治山)	治山ダム		○	○	○		R2年12月
⑧	【5】	130	○		おんがわしん 姥ヶ原山国有林	三原市	大和町 姥ヶ原	国(治山)	山腹工		○	○	○		R2年12月
⑧	【6】	131	○		おんがわしん 中西地区	三原市	八幡町 野串	市町(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○	○	
⑧	【7】	132	○		おんがわしん 用意山国有林	三原市	本郷町 船木	国(治山)	治山ダム		○	○	○		R3年1月

平成30年7月豪雨災害 砂防・治山施設整備計画(緊急事業・激特事業等)事業箇所一覧表

資料

令和2年8月末時点

※事業着手済とは、工事の公告または指名通知済の箇所を指す。

整備 計画図	詳細 番号	箇所 番号	緊急 事業	激特 等	渓流名・箇所名	市町名	所在	対応主体	施設概要	緊 急 事 業					緊急事業 概成目標 時期
										事業 着手時期	事業 着手済	契約済	現場着手	完了	
⑧	【7】	133	○		ようこうやまごのうりりん 用倉山国有林	三原市	本郷町 船木	国(治山)	治山ダム		○	○	○		R3年1月
⑧	【7】	134	○		ようこうやまごのうりりん 用倉山国有林	三原市	本郷町 船木	国(治山)	治山ダム		○	○	○		R3年1月
⑧	【7】	135	○	○	ぜんにせうにがわとせきん、よなひ 善入寺川支川3階	三原市	本郷町 善入寺	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○	○	
⑧	【8】	136	○		ぶつづうじやまごのうりりん 仏通寺山国有林	三原市	高坂町	国(治山)	山腹工		○	○	○	○	
⑧	【8】	137	○		ぶつづうじやまごのうりりん 仏通寺山国有林	三原市	高坂町	国(治山)	山腹工		○	○	○	○	
⑧	【8】	138	○		おおいしにがわ 大長寺川2地区	三原市	小坂町	市町(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○	○	
⑧	【9】	139	○		しろかねやま 白金山地区	三原市	本郷町 上北方 白金山	県(治山)	治山ダム		○	○	○		R3年3月
⑧	【9】	140	○	○	りゅうおうざん 龍王平地区	三原市	本郷町 上北方 龍王平	県(治山)	治山ダム		○	○	○		R2年12月
⑧	【9】	141	○		あふだん 油免地区	三原市	本郷町 南方	市町(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○	○	
⑧	【10】	142	○		ひらた 平佐地区	三原市	沼田東町 納所	市町(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○	○	
⑧	【10】	143	○		ひめさ 姫草地区	三原市	長谷 2丁目	市町(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○	○	
⑧	【11】	144	○	○	さいふく 西福地川	三原市	木原 6丁目	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○	○	
⑧	【12】	145	○		あみつやまごのうりりん 耳津山国有林	三原市	小泉町	国(治山)	治山ダム		○	○	○	○	
⑨	【1】	146	○		やまがき 山行地区	尾道市	栗原町 山行	県(治山)	治山ダム		○	○	○	○	
⑨	【1】	147	○		ぼろにがわとせきん 防地川隣	尾道市	防地町	県(砂防)	山腹工		○	○	○	○	
⑨	【1】	148	○	○	ひがしなるたせきとせきん 東鳴滝城川隣2	尾道市	吉和町	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○	○	
⑨	【1】	149	○		ひがしなるたせきとせきん 東五反田川隣	尾道市	吉和町	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○		R3年3月
⑨	【1】	150	○		しほ 瀬見G地区	尾道市	桜町	県(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○	○	
⑨	【2】	151	○		かねよにがわとせきん 兼吉川隣	尾道市	向島町	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○	○	
⑨	【2】	152	○		かわらし 川尻地区	尾道市	向島町 兼広	県(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○	○	
⑨	【2】	153	○	○	みなみなるたせきとせきん 南永谷川	尾道市	向島町 沖柴	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○		R3年3月
⑩	【1】	154	○		ながさ 長迫地区	福山市	神辺町 下竹田	市町(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○	○	
⑩	【2】	155	○	○	かみかき 上山守4地区	福山市	駅家町 上山守	県(治山)	治山ダム		○	○	○	○	
⑩	【2】	156	○		おおいにやまごのうりりん 大谷山国有林	福山市	神村町	国(治山)	治山ダム		○				R3年2月
⑩	【3】	157	○		こほり 横尾C地区	福山市	千田町 4丁目	市町(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○	○	
⑩	【3】	158	○		にしなづ 西深津地区	福山市	西深津町 7丁目	市町(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○	○	
⑩	【4】	159	○		かすがのうりりん 春日町浦上地区	福山市	春日町 浦上	市町(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○	○	
⑩	【4】	160	○		かすが 通り地区	福山市	春日町 浦上	市町(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○	○	
⑩	【4】	161	○		たけがわ 老都川地区	福山市	引野町	市町(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○	○	
⑩	【5】	162	○		よんく 西区地区	福山市	神村町	市町(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○	○	
⑩	【5】	163	○		かみかき 神村三区地区	福山市	神村町 生田	県(治山)	治山ダム		○	○	○	○	
⑩	【5】	164	○		かみかき 神村五区地区	福山市	神村町	県(治山)	山腹工等		○	○	○	○	
⑩	【5】	165	○	○	おおいなるたせきとせきん 秋之尾川隣	福山市	神村町	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○		R3年3月
⑩	【5】	166	○		しほ 鹿田地区	福山市	赤坂町 赤坂	市町(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○	○	
⑩	【6】	167	○		ながさ 長崎地区	福山市	引野町	市町(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○		R2年9月
⑩	【7】	168	○		いわふら 岩船地区	福山市	沼隈町 能登原	市町(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○	○	
⑩	【8】	169	○		しろね 白茅地区	福山市	鞆町	県(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○	○	
⑩	【8】	170	○		たきば 焚塚地区	福山市	鞆町	県(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○	○	
⑪	【1】	171	○		やたば 矢多田地区	府中市	上下町 矢多田	県(治山)	治山ダム		○	○	○	○	
⑪	【2】	172	○		かみかき 角目4地区	府中市	木野山町	県(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○	○	
⑪	【3】	173	○	○	みやのまがわ 宮ノ間川	府中市	河佐町	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○		R3年度
⑪	【3】	174	○		おおいにやまごのうりりん 別両路地区	府中市	荒谷町 別両路	県(治山)	治山ダム		○	○	○		R2年12月
⑪	【3】	175	○		ひがしなるたせき 東谷地区	府中市	本山町	市町(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○	○	
⑪	【3】	176	○		しほ 府中地区	府中市	府中町	市町(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○		R3年3月

平成30年7月豪雨災害 砂防・治山施設整備計画(緊急事業・激特事業等)事業箇所一覧表

資料

令和2年8月末時点

※事業着手済とは、工事の公告または指名通知済の箇所を指す。

整備 計画図	詳細 番号	箇所 番号	緊急 事業	激特 等	渓流名・箇所名	市町名	所在	対応主体	施設概要	緊 急 事 業					緊急事業 概成目標 時期
										事業 着手時期	事業 着手済	契約済	現場着手	完了	
⑪	【4】	177	○		はら 土生地区	府中市	土生町	市町(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○		R2年12月
⑪	【4】	178	○		くさ 栗柄地区	府中市	栗柄町	市町(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○		R2年9月
⑫	【1】	179	○		たな 高瀬(4040)地区	庄原市	口和町 永田	市町(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○		R2年9月
⑬	【1】	180	○	○	すまき 杉坂下川隣	東広島市	志和町 志和堀 杉坂下	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○	○	
⑬	【2】	181	○		おひめ 小竹4地区	東広島市	高屋町 造賀	市町(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○		R2年9月
⑬	【3】	182	○		おのろ 鷹之巣地区	東広島市	河内町 宇山 鷹之巣	県(治山)	治山ダム・山腹工		○	○	○		R2年12月
⑬	【3】	183	○		おひめ 小田地区	東広島市	河内町 小田	県(治山)	治山ダム		○	○	○		R2年12月
⑬	【4】	184	○	○	おのろ 小野川左3	東広島市	志和町 別府	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○		R3年3月
⑬	【4】	185	○	○	おのろ 員岡川	東広島市	志和町 別府	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○	○	
⑬	【4】	186	○		おのろ 扇迫川	東広島市	志和町 別府	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○	○	
⑬	【4】	187	○	○	おのろ 奥屋川右1	東広島市	志和町 奥屋	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○		R2年9月
⑬	【5】	188	○		おのろ 中筋4地区	東広島市	高屋町 高屋東	市町(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○		R2年9月
⑬	【5】	189	○		おのろ 上郷750地区	東広島市	河内町 入野	市町(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○		R2年9月
⑬	【6】	190	○	○	おのろ 奥屋川1	東広島市	河内町 中河内	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○	○	
⑬	【7】	191	○		おのろ 乗重地区	東広島市	志和町 七条栳坂 乗重	県(治山)	山腹工等		○	○	○		R2年12月
⑬	【7】	192	○		おのろ 八本松地区	東広島市	八本松西	国(治山)	治山ダム等		○	○	○		R3年2月
⑬	【7】	193	○		おのろ 八本松地区	東広島市	八本松町	国(治山)	治山ダム等		○	○	○		R3年2月
⑬	【8】	194	○		おのろ 寺家地区	東広島市	西条町 寺家	県(治山)	治山ダム		○	○	○		R2年9月
⑬	【8】	195	○		おのろ 坂井谷地区	東広島市	西条町 吉行 坂井谷	県(治山)	治山ダム		○	○	○	○	
⑬	【8】	196	○		おのろ 後迫地区	東広島市	西条町 吉行 後迫	県(治山)	治山ダム		○	○	○		R2年12月
⑬	【8】	197	○		おのろ 高屋地区	東広島市	高屋町 宮領	国(治山)	治山ダム等		○	○	○		R3年2月
⑬	【8】	198	○		おのろ 高屋地区	東広島市	高屋町 宮領	国(治山)	治山ダム等		○	○	○		R3年2月
⑬	【8】	199	○		おのろ 高屋地区	東広島市	高屋町 郷	国(治山)	治山ダム等		○	○	○		R3年2月
⑬	【9】	200	○		おのろ 高屋地区	東広島市	高屋町 溝口	国(治山)	山腹工等		○	○	○		R3年2月
⑬	【9】	201	○		おのろ 高屋地区	東広島市	高屋町 重兼	国(治山)	治山ダム等		○	○	○		R2年11月
⑬	【9】	202	○		おのろ 高屋地区	東広島市	高屋町 重兼	国(治山)	治山ダム等		○	○	○		R2年11月
⑬	【9】	203	○		おのろ 高屋地区	東広島市	高屋町 重兼	国(治山)	治山ダム等		○	○	○		R2年11月
⑬	【9】	204	○		おのろ 小谷地区	東広島市	高屋町 小谷	県(治山)	治山ダム		○	○	○		R2年9月
⑬	【9】	205	○		おのろ 2726地区	東広島市	河内町 入野	市町(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○		R2年9月
⑬	【10】	206	○		おのろ 下大内原隣	東広島市	河内町 入野	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○	○	
⑬	【10】	207	○		おのろ 東山地区	東広島市	河内町 入野 東山	県(治山)	山腹工等		○	○	○	○	
⑬	【11】	208	○		おのろ 古河川支川	東広島市	八本松町 原	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○		R2年9月
⑬	【11】	209	○		おのろ 吉川A地区	東広島市	八本松町 吉川	県(治山)	治山ダム		○	○	○		R3年3月
⑬	【11】	210	○		おのろ 吉川B地区	東広島市	八本松町 吉川	県(治山)	治山ダム		○	○	○		R3年3月
⑬	【11】	211	○		おのろ 吉川C地区	東広島市	八本松町 吉川	県(治山)	山腹工等		○	○	○		R3年3月
⑬	【12】	212	○		おのろ 小滝原1地区	東広島市	西条町 田口	市町(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○		R2年9月
⑬	【12】	213	○	○	おのろ 大宮川	東広島市	西条町 下三永	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○		R3年3月
⑬	【12】	214	○	○	おのろ 本頭川隣	東広島市	西条町 下三永	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○	○	
⑬	【13】	215	○		おのろ 黒瀬川左6隣	東広島市	西条町 郷曾	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○		R3年3月
⑬	【14】	216	○		おのろ 津江上流地区	東広島市	黒瀬町 津江	市町(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○	○	
⑬	【15】	217	○		おのろ 黒瀬地区	東広島市	黒瀬町 上保田	国(治山)	治山ダム等		○	○	○		R3年2月
⑬	【15】	218	○		おのろ 黒瀬地区	東広島市	黒瀬町 菅田	国(治山)	治山ダム等		○	○	○		R3年2月
⑬	【15】	219	○		おのろ 黒瀬地区	東広島市	黒瀬町 乃美尾	国(治山)	治山ダム等		○	○	○	○	
⑬	【15】	220	○		おのろ 乃美尾地区	東広島市	黒瀬町 乃美尾	県(治山)	治山ダム		○	○	○	○	

平成30年7月豪雨災害 砂防・治山施設整備計画(緊急事業・激特事業等)事業箇所一覧表

資料

令和2年8月末時点

※事業着手済とは、工事の公告または指名通知済の箇所を指す。

整備 計画図	詳細 番号	箇所 番号	緊急 事業	激特 等	渓流名・箇所名	市町名	所在	対応主体	施設概要	緊 急 事 業					緊急事業 概成目標 時期
										事業 着手時期	事業 着手済	契約済	現場着手	完了	
⑬	【15】	221	○		いけや、あみはらう 岩谷上梁2地区	東広島市	黒瀬町 宗近柳国	市町(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○		R2年9月
⑬	【16】	222	○		おおだ 大田地区	東広島市	安芸津町 大田	県(治山)	治山ダム		○	○	○	○	
⑬	【17】	223	○	○	あきあき、うしろに 萩無中西谷	東広島市	安芸津町 三津	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○		R2年9月
⑬	【18】	224	○	○	こたにがわ 小谷川	東広島市	黒瀬町 市飯田	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○	○	
⑭	【1】	225	○	○	あかき 赤崎C地区	廿日市市	宮島口 3丁目	市町(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○	○	
⑮	【1】	226	○		いしはら 石佛地区	安芸高田市	吉田町 中馬	市町(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○	○	
⑮	【2】	227	○		ほろき 保垣地区	安芸高田市	向原町 保垣	県(治山)	山腹工等		○	○	○		R3年3月
⑯	【1】	228	○		あきあき、いしはら 切串1丁目地区	江田島市	江田島町 切串 1丁目	県(治山)	山腹工等		○	○	○		R2年9月
⑯	【1】	229	○		あきあき 水ヶ浦地区	江田島市	江田島町 水ヶ浦	県(治山)	治山ダム		○	○	○	○	
⑯	【1】	230	○	○	ながたに、いしはら 長谷川支川	江田島市	江田島町 切串	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○	○	
⑯	【1】	231	○		ながたに、いしはら 長谷川支川2	江田島市	江田島町 切串 2丁目	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○		R3年3月
⑯	【2】	232	○		三吉 三吉地区	江田島市	沖美町 三吉	市町(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○		R2年12月
⑯	【3】	233	○		みやのり、とり 渡川隣	江田島市	江田島町 宮の原 1丁目	県(砂防)	山腹工		○	○	○	○	
⑯	【3】	234	○		柿ノ木田地区	江田島市	江田島町 小用 2丁目	市町(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○		R2年12月
⑯	【3】	235	○		あきあき、つ 宮迫2号地区	江田島市	江田島町 中央 3丁目	市町(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○		R2年9月
⑯	【3】	236	○		こやうす コソウス地区	江田島市	江田島町 中央 3丁目	市町(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○	○	
⑯	【3】	237	○		あきあき、つ 矢の浦1号地区	江田島市	江田島町 中央 4丁目	市町(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○		R2年9月
⑯	【3】	238	○		ばいし、かわらわ バイシ川隣	江田島市	江田島町 秋月 2丁目	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○		R3年3月
⑯	【4】	239	○		こまなが 是長地区	江田島市	沖美町 是長	市町(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○		R3年3月
⑯	【4】	240	○		しもな、あき 下野川地区	江田島市	沖美町 畑	県(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○	○	
⑯	【5】	241	○		こまなが 飛渡瀬2号地区	江田島市	大柿町 飛渡瀬	市町(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○		R2年9月
⑯	【5】	242	○		ながたに 長谷地区	江田島市	大柿町 飛渡瀬	市町(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○		R2年9月
⑯	【5】	243	○		ながたに、つ 北迫4号1地区	江田島市	大柿町 柿浦	市町(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○		R2年12月
⑯	【5】	244	○		ながたに、つ 北迫4号2地区	江田島市	大柿町 柿浦	市町(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○		R3年3月
⑯	【5】	245	○		つ 郷地区	江田島市	大柿町 小古江	市町(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○		R3年3月
⑯	【6】	246	○		ながたに、つ 北迫1号地区	江田島市	大柿町 柿浦	市町(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○		R3年3月
⑯	【6】	247	○		おおだ、つ 大原地区	江田島市	大柿町 大原	市町(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○	○	
⑯	【6】	248	○		ほろき 郷2号地区	江田島市	大柿町 大原	市町(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○		R2年9月
⑯	【6】	249	○		こまなが 一反田地区	江田島市	大柿町 深江	市町(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○		R2年12月
⑯	【6】	250	○		ほろき 浜床1地区	江田島市	大柿町 大君	市町(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○		R3年3月
⑯	【6】	251	○		ほろき 浜床2地区	江田島市	大柿町 大君	市町(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○		R2年9月
⑯	【6】	252	○		おおだ、つ 大君2号地区	江田島市	大柿町 大君	市町(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○		R2年12月
⑯	【6】	253	○	○	おおだ、つ 大君地区	江田島市	大柿町 大君	県(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○		R2年9月
⑰	【1】	254	○	○	あきあき、いしはら 榎川支川5	府中町	みくまり 1丁目	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○		R3年度
⑰	【1】	255	○		じや、あき、つ 蛇抜山地区	府中町	蛇抜山	県(治山)	治山ダム		○	○	○		R2年12月
⑰	【1】	256	○		あきあき、いしはら 八幡四丁目地区	府中町	八幡 4丁目	市町(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○	○	
⑰	【1】	257	○		ほろき、いしはら 浜田四丁目地区	府中町	浜田 4丁目	市町(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○	○	
⑰	【1】	258	○		おおだ、つ 柳ヶ丘地区	府中町	柳ヶ丘	市町(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○	○	
⑱	【1】	259	○	○	くさのき、つに 楠木谷川	海田町	畝 2丁目	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○		R3年3月
⑱	【1】	260	○	○	あきあき、いしはら 南幸町13地区	海田町	南幸町	県(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○	○	
⑲	【1】	261	○		ひらたに 平谷地区	熊野町	平谷	市町(治山)	山腹工等		○	○	○		R3年3月
⑲	【1】	262	○		あきあき、いしはら 休ヶ迫山地区	熊野町	休ヶ迫山	県(治山)	治山ダム		○	○	○		R3年3月
⑲	【1】	263	○		あきあき、いしはら 中倉山国有林	熊野町	平谷	国(治山)	治山ダム		○	○	○	○	
⑲	【1】	264	○		あきあき 神田地区	熊野町	神田	市町(治山)	山腹工等		○	○	○		R3年3月

平成30年7月豪雨災害 砂防・治山施設整備計画(緊急事業・激特事業等)事業箇所一覧表

資料

令和2年8月末時点

※事業着手済とは、工事の公告または指名通知済の箇所を指す。

整備 計画図	詳細 番号	箇所 番号	緊急 事業	激特 等	渓流名・箇所名	市町名	所在	対応主体	施設概要	緊 急 事 業					緊急事業 概成目標 時期
										事業 着手時期	事業 着手済	契約済	現場着手	完了	
⑪	【1】	265	○	○	にこうがわしせん 二河川支川21隣	熊野町	川角 5丁目	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○	○	
⑪	【1】	266	○	○	にこうがわしせん 二河川支川21	熊野町	川角 5丁目	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○	○	
⑪	【1】	267	○		かわすくごう 川角5丁目19地区	熊野町	川角 5丁目	県(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○	○	
⑪	【1】	268	○		いんたけ 石タケ地区	熊野町	石タケ	県(治山)	治山ダム		○	○			R3年度
⑪	【1】	269	○	○	くまのがわしせん 熊野川支川36隣	熊野町	萩原	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○		R3年3月
⑪	【1】	270	○	○	あまのやま 嵩山地区	熊野町	嵩山	県(治山)	治山ダム		○	○	○	○	
⑪	【2】	271	○		だいにこうやまごう 堂所山国有林	熊野町	初神	国(治山)	治山ダム		○	○	○	○	
⑪	【2】	272	○		だいにこうやまごう 堂所山国有林	熊野町	初神	国(治山)	山腹工		○	○	○	○	
⑪	【2】	273	○		だいにこうやまごう 堂所山国有林	熊野町	初神	国(治山)	山腹工		○	○	○	○	
⑪	【2】	274	○		だいにこうやまごう 堂所山国有林	熊野町	初神	国(治山)	治山ダム		○	○	○	○	
⑪	【2】	275	○		だいにこうやまごう 堂所山国有林	熊野町	初神	国(治山)	治山ダム		○	○	○	○	
⑪	【2】	276	○	○	おたにがわ 三谷川	熊野町	初神	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○		R3年3月
⑪	【2】	277	○		はつたけやま 初神山地区	熊野町	初神山	県(治山)	治山ダム		○				R3年度
⑪	【2】	278	○		くまのがわしせん 熊野川支川11	熊野町	新宮	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○		R3年3月
⑫	【1】	279	○		よこほまがわ 横浜川12	坂町	平成ヶ浜 4丁目	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○		R3年3月
⑫	【1】	280	○		よこほま 横浜5416地区	坂町	横浜中央 2丁目	市町(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○		R2年9月
⑫	【1】	281	○		よこほま 横浜6259地区	坂町	横浜西 2丁目	市町(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○		R2年9月
⑫	【1】	282	○		にし 西6441地区	坂町	横浜西 2丁目	県(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○	○	
⑫	【1】	283	○		ほうしん 法大神地区	坂町	横浜東 2丁目	県(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○	○	
⑫	【1】	284	○		かまがに 釜ヶ谷地区	坂町	横浜東 2丁目	県(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○	○	
⑫	【1】	285	○		にしがわ 西側地区	坂町	坂西 2丁目	県(急傾斜)	急傾斜地対策		○	○	○	○	
⑫	【1】	286	○	○	あまのじんがわ 明神川	坂町	三田尾	国(砂防)	砂防ダム		○	○	○	○	
⑫	【1】	287	○		にしがわ 西獄地区	坂町	西獄	県(治山)	治山ダム		○	○	○		R2年12月
⑫	【2】	288	○	○	おねぼかわ 大判川	坂町	総頭山	国(砂防)	砂防ダム		○	○	○	○	
⑫	【2】	289	○	○	おねぼかわ 総頭川	坂町	総頭山	国(砂防)	砂防ダム		○	○	○	○	
⑫	【2】	290	○	○	みづのいがわしせん 水尻川支川3	坂町	水尻	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○		R3年度
⑫	【2】	291	○	○	みづのいがわしせん 水尻川支川4	坂町	水尻	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○		R3年度
⑫	【2】	292	○	○	みづのいがわ 水落川	坂町	水尻	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○		R3年3月
⑫	【2】	293	○	○	こやまがわ 天地川	坂町	小屋浦 4丁目	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○		R3年3月
⑫	【2】	294	○	○	てんちがわしせん 天地川支川1	坂町	小屋浦 4丁目	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○		R3年3月
⑫	【2】	295	○	○	てんちがわしせん 天地川支川2	坂町	小屋浦 4丁目	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○		R3年3月
⑫	【2】	296	○		てんちがわしせん 天地川支川5	坂町	小屋浦 4丁目	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○	○	
⑫	【2】	297	○	○	てんちがわしせん 天地川支川6	坂町	小屋浦 4丁目	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○		R3年3月
⑫	【2】	298	○	○	てんちがわしせん 天地川支川8	坂町	小屋浦 4丁目	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○		R3年3月
⑫	【2】	299	○		てんちがわしせん 天地川支川9	坂町	小屋浦 3丁目	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○		R3年3月
⑫	【2】	300	○		てんちがわしせん 天地川支川10	坂町	小屋浦 3丁目	県(砂防)	砂防ダム		○	○	○		R3年3月
⑬	【1】	301	○		こみやま 古見山地区	世羅町	津津戸 古見山	県(治山)	治山ダム		○	○	○		R2年9月
