

《 道路事業 》

広島県

橋梁修繕方針

トンネル修繕方針

舗装修繕方針

道路附属物修繕方針



道路



河川



ダム



砂防



港湾・漁港



海岸



公園



広島県土木建築局

道路整備課

目 次

I 修繕方針の概要

- 1 修繕方針の対象施設
- 2 修繕方針の期間
- 3 アセットマネジメントの導入効果
- 4 PDCA 型のマネジメント

II 橋梁修繕方針

- 1 施設の現状
- 2 メンテナンスサイクルの実施
 2. 1 点検
 2. 2 診断
 2. 3 措置(主な対策)
 2. 4 記録
- 3 これまでの取組の評価
 3. 1 対象期間
 3. 2 修繕費の推移
 3. 3 健全度および修繕状況
 3. 4 維持管理水準に対する評価
 3. 5 課題
- 4 基本方針
 4. 1 施設の維持管理水準
 4. 2 対策優先順位
 4. 3 対策費用の試算
 4. 4 実施方針
 4. 5 今後の取組

III トンネル修繕方針

- 1 施設の現状
- 2 メンテナンスサイクルの実施
 2. 1 点検
 2. 2 診断
 2. 3 措置(主な対策)
 2. 4 記録
- 3 これまでの取組の評価
 3. 1 対象期間
 3. 2 修繕費の推移
 3. 3 健全度および修繕状況
 3. 4 維持管理水準に対する評価
 3. 5 課題
- 4 基本方針
 4. 1 施設の維持管理水準
 4. 2 対策優先順位
 4. 3 対策費用の試算
 4. 4 実施方針
 4. 5 今後の取組

IV. 舗装修繕方針

- 1 施設の現状
- 2 メンテナンスサイクルの実施
 2. 1 点検
 2. 2 診断
 2. 3 措置(主な対策)
 2. 4 記録
- 3 これまでの取組の評価
 3. 1 対象期間
 3. 2 修繕費の推移
 3. 3 健全度および修繕状況
 3. 4 維持管理水準に対する評価
 3. 5 課題
- 4 基本方針
 4. 1 施設の維持管理水準
 4. 2 対策費用の試算
 4. 3 実施方針
 4. 4 今後の取組

V. 道路附属物修繕方針

- 1 施設の現状
- 2 メンテナンスサイクルの実施
 2. 1 点検
 2. 2 診断
 2. 3 措置(主な対策)
 2. 4 記録
- 3 これまでの取組の評価
- 4 基本方針
 4. 1 施設の維持管理水準
 4. 2 対策費用の試算
 4. 3 実施方針
 4. 4 今後の取組

VI. 今後の予定

別紙 構造物ごとの一覧表

- 1 橋梁
- 2 トンネル
- 3 門型標識等

I 修繕方針の概要

1 修繕方針の対象施設

本修繕方針では、道路施設のうち、橋梁、トンネル、舗装、道路附属物の施設を対象としており、橋梁、トンネルは予防保全型、舗装は事後保全型、道路附属物は事後保全型または事後交換型の維持管理手法により維持管理を行っています。

これら施設の機能を長期的に確保するために必要な工事として、表 I－1 の3つが挙げられますが、修繕方針では「修繕工事」を対象とします。

- ① 日常的な清掃や草刈、部分的な補修等を行う「維持工事」
- ② 維持工事では対応できない施設の構造上影響のあるひび割れ等、損傷を回復・予防するための修復や設備の交換等を行う「修繕工事」
- ③ 施設の全部を再建設あるいは取替を行う「更新工事」

表 I－1 修繕方針の対象

施設名	施設数	維持管理手法			維持工事	修繕工事		更新工事
		予防保全	事後保全	事後交換		修繕	設備の交換	
橋梁	4,222 橋 (R1.4)	●			・橋梁清掃 ・部分補修	・塗装塗り替え ・断面修復 ・ひび割れ補修	・支承交換 ・伸縮装置交換	・橋梁架換
トンネル (ロックシェ ット・スノ ーシェルタ ー含む)	174 箇所 (R1.4)	●			・トンネル清掃 ・部分補修	・断面修復 ・ひび割れ注入 ・裏込め注入 ・導水工	・附属物の交換 等	—
舗装	4,173 km (R2.4)		●		・路面清掃 ・ポットホール補 修	・切削オーバー レイ ・オーバーレイ ・クラックシール	・打ち換え工法 ・路上再生路盤 工	—
道路附 属物	30,817 基 (R3.3)		●	●	・道路附属物清 掃	・塗装塗り替え 等	・部品の交換等	・施設の新設

2 修繕方針の期間

修繕方針の期間は、令和3年度から令和8年度までとします。また、修繕費の算定期間は、令和3年度から令和62年度までの60年間とします。

3 アセットマネジメントの導入効果

近年、老朽化した施設の増加により、維持・修繕・更新に係る費用の増大が懸念されています。

アセットマネジメントを導入することで、対象施設の状態や特性を把握・評価し、効率的・効果的な維持管理を行うことが可能となります。

4 PDCA 型のマネジメント

本修繕方針は、修繕方針(Plan)に基づき各道路施設のメンテナンスサイクルを実施(Do)したのち、計画の進捗状況を評価(Check)し、評価結果に基づく修繕方針の見直し(Action)を行うPDCA 型のサイクルにより実践します。

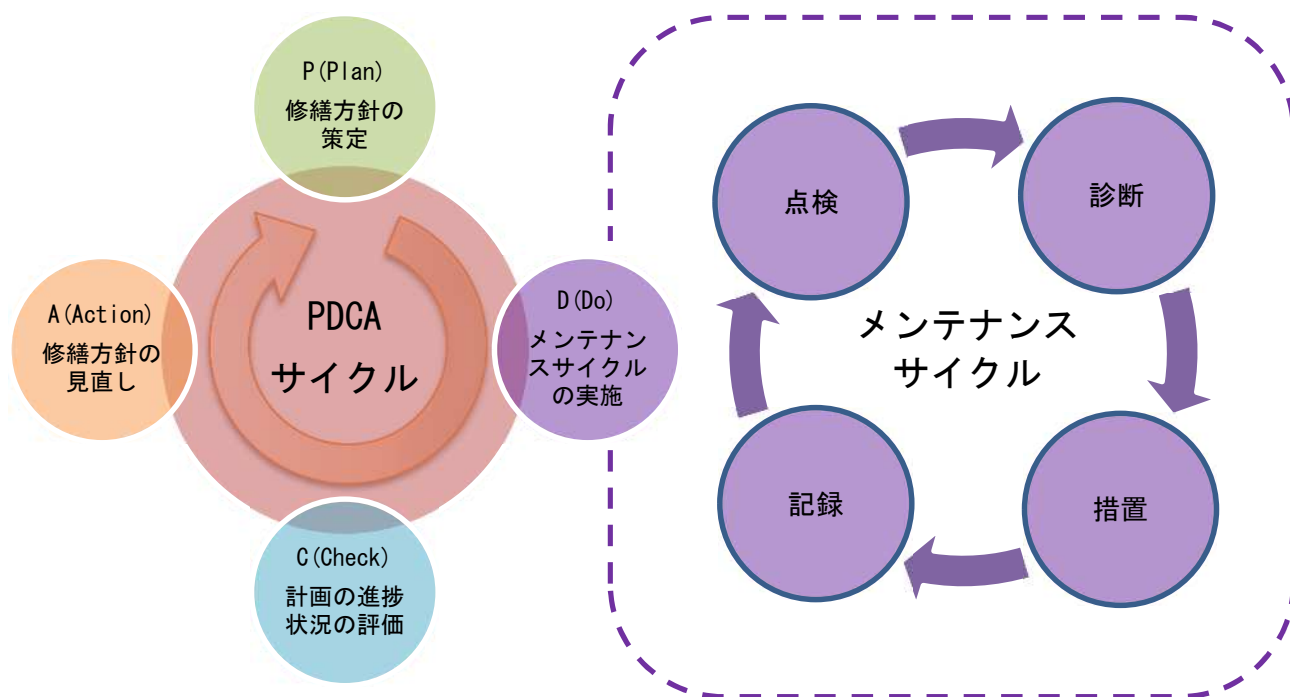


図 I - 1 PDCA 型のサイクルとメンテナンスサイクル

Ⅱ 橋梁修繕方針

1 施設の現状

橋梁は、道路と交差している河川、海、鉄道、他の道路等を横断するための施設で、一旦機能不全に陥ると、交通が遮断されることになり、県民生活の安全あるいは経済・産業活動に大きな影響を及ぼす大変重要な施設です。

本県は、県土の約 80%が山地で、河川や谷間が発達した複雑な地形を形成しているため、橋梁等の道路施設が比較的多い状況です。


(1) 対象橋梁数

本県が管理する橋梁は、4,222 橋となっており、このうち、緊急輸送道路上に、1,722 橋があります。また、全体の 4,222 橋のうち、跨線橋もしくは跨道橋、渡海橋は 216 橋となっています。

表Ⅱ－１ 本県の管理する橋梁数（令和元年４月現在）

	橋梁数	跨線橋 跨道橋 渡海橋	その他
緊急輸送道路※	1,722	119	1,603
緊急輸送道路以外	2,500	97	2,403
計	4,222	216	4,006


※：地震直後から発生する緊急輸送を円滑かつ確実に実施することを目的とする道路

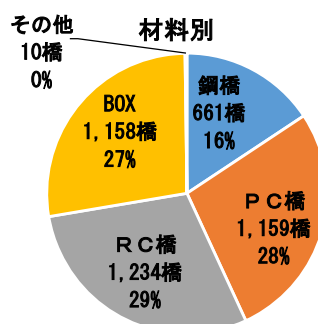


図Ⅱ－１ 橋梁数の材料別分布（令和元年４月現在）

（２）建設年度別橋梁数

本県の管理する橋梁は、1960年代～1970年代の高度経済成長期に大量に建設されています。このうち、建設後50年を経過する高齢化した橋梁は2,264橋で、全体の約54%を占めています。この割合は、20年後には、3,400橋となり全体の約81%を占めます。高齢化した橋梁の増加に伴い、老朽化した橋梁が急速に増大することが予想されます。

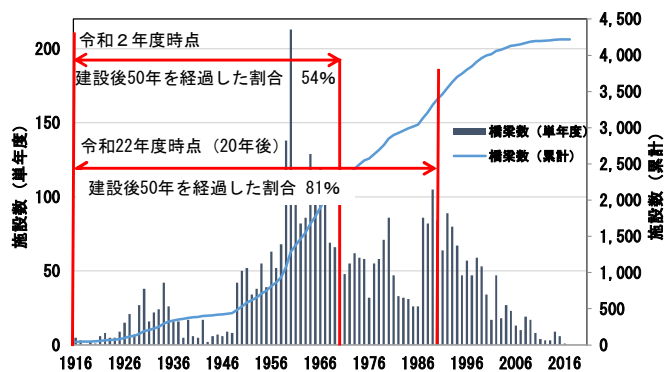

図Ⅱ－２ 建設年別橋梁数の分布

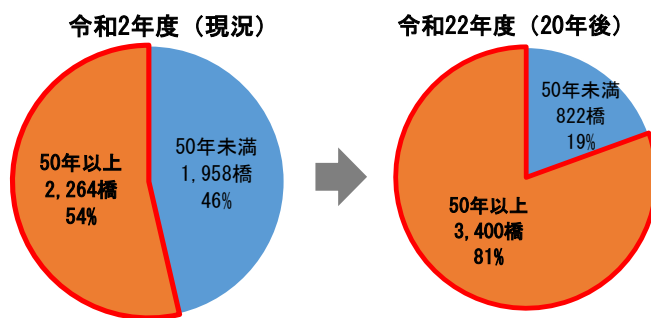

図Ⅱ－３ 建設後50年以上の橋梁数

2 メンテナンスサイクルの実施

2.1 点検

(1) 点検の種類

橋梁点検は、日常点検、定期点検、異常時点検、詳細調査に分類されます。定期点検（5年に1回の実施を基本）により、橋梁の健全度を確認します。

表Ⅱ－2 橋梁点検の種類と内容

点検の区分	頻度	内容
日常点検	道路巡視、道路パトロールにあわせ随時	異常や損傷等の状況を把握し、必要に応じて応急的な措置を実施
定期点検	5年に1回	橋梁の損傷度を定量的に評価 近接目視による点検 必要に応じて触診や打音、床版点検車での点検※を併用 損傷状況を「広島県橋梁定期点検要領」に従って適切な方法で定期点検調書に記録 点検結果に基づいて健全度を評価
異常時点検	適宜	地震時や異常気象時、点検リストに記載された橋梁について点検を実施（一次点検、二次点検）
詳細調査	適宜	定期点検等で異常が見つかった橋梁について、各種試験等を実施して損傷の状態をより精度良く把握し、補修・補強工法を検討するために実施

※：橋齢が50年以上で大型車交通量1,000台/日以上コンクリート床版を有する鋼橋で実施



職員による点検（直営）



橋梁点検車による点検（委託）



床版点検車による点検（委託）

(2) 新技術を活用した点検

本県で実施している新技術を活用した点検は次のとおりです。



斜張橋のロボットによる点検



DSカメラによる点検

(3) 定期点検による評価

定期点検は、定期的に実施する点検を通じて橋梁の変状や劣化の兆候を把握することを目的とします。定期点検で実施する点検項目は橋梁の損傷状況を定量的に評価できるものとし、損傷の状況は近接目視により把握するか、または、自らの近接目視によるときと同等の健全性の診断を行うことができる情報が得られると点検技術者が判断した方法により把握し、必要に応じて触診や打音での点検を併用して行います。橋梁の部材ごとの対策（損傷度）区分は次に示す5段階で評価します。

表Ⅱ－3 対策（損傷度）区分

判定区分	判定の内容
A	損傷が認められないか、損傷が軽微で補修を行う必要がない。
B	状況に応じて補修を行う必要がある。
C1	予防保全の観点から、速やかに補修等を行う必要がある。
C2	橋梁構造の安全性の観点から、速やかに補修等を行う必要がある。
E	橋梁構造の安全性の観点から、緊急対応の必要がある。 交通障害または第三者等への被害が懸念され緊急性がある。

2.2 診断

(1) 部材単位での診断

定期点検では、部材単位での健全性の診断を行います。構造上の部材等の健全性の診断は、表Ⅱ－4の判定区分により行うことを基本とします。なお、部材単位の診断は、構造上の部材区分あるいは部位ごと、損傷種類ごとに行います。

表Ⅱ－4 部材の健全性の診断

良 ↓ 悪	健全度区分		定義
	I (4・5)	健全	橋梁の機能に支障が生じていない状態
	II (3)	予防保全段階	橋梁の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態
	III (2)	早期措置段階	橋梁の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態
	IV (1)	緊急措置段階	橋梁の機能に支障が生じている、または生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態

※：健全度区分の（）内はインフラ老朽化対策の中長期的な枠組みの健全度区分

(2) 橋梁ごとの診断

橋梁ごとの健全性の診断は、橋梁単位で総合的な評価を行います。部材単位の健全度が橋梁全体の健全度に及ぼす影響は、構造特性や架橋環境条件、当該橋梁の重要度等によっても異なるため、総合的に判断する必要があります。本県では、構造物の性能に影響を及ぼす主要な部材に着目して、最も厳しい評価を橋梁単位での評価としています。

(3) 主な損傷事例

県内で確認された主な損傷事例は表Ⅱ－５のとおりです。




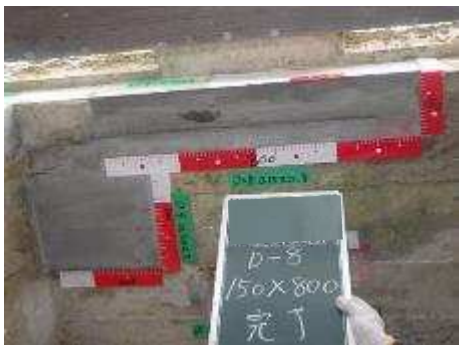

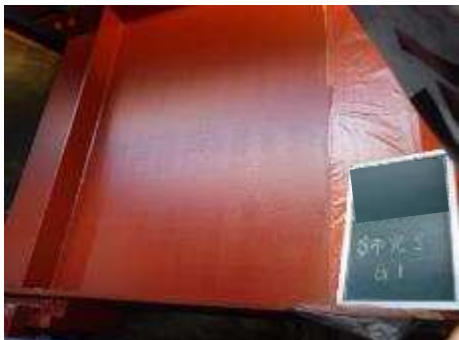
表Ⅱ－５ 主な損傷事例

	鋼橋	コンクリート橋
床版	 <p>鋼床版の腐食・欠損</p>	 <p>コンクリート床版の鉄筋露出・腐食</p>
主桁	 <p>主桁の腐食</p>	 <p>コンクリートのはく離・鉄筋露出・浮き</p>
橋台・橋脚	 <p>橋台のひび割れ・鉄筋露出</p>	 <p>橋脚の鉄筋露出</p>
支承	 <p>支承の腐食</p>	 <p>支承のゴム劣化・変色</p>

2.3 措置(主な対策)

橋梁の主な損傷は、老朽化等によるコンクリート部材のひび割れ等であり、主な対策内容は表Ⅱ－6のとおりです。

表Ⅱ－6 主な対策内容

	施 工 前	施 工 後
ひび割れ補修		
断面修復		
塗装塗り替え		

2.4 記録

効率的にメンテナンスサイクルを実施するため、点検、診断、措置の結果をデータとして、蓄積します。

本県では、橋梁の諸元とともに、点検、診断、修繕の履歴等のデータを蓄積する「橋梁アセットマネジメント支援システム」を平成 21 年度から運用しています。


3 これまでの取組の評価

3.1 対象期間

平成 26 年度から令和 2 年度までの 7 年間

3.2 修繕費の推移

平成 26 年度にとりまとめた修繕費の試算額は、平成 26 年度から令和 2 年度までの期間で各年度の平均は 12.6 億円となっているのに対し、予算額（当初および補正）は各年度の平均で 15.0 億円となっており、令和 2 年度時点で、各年度の平均の試算額に比べて 2.4 億円以上の予算を確保しています。

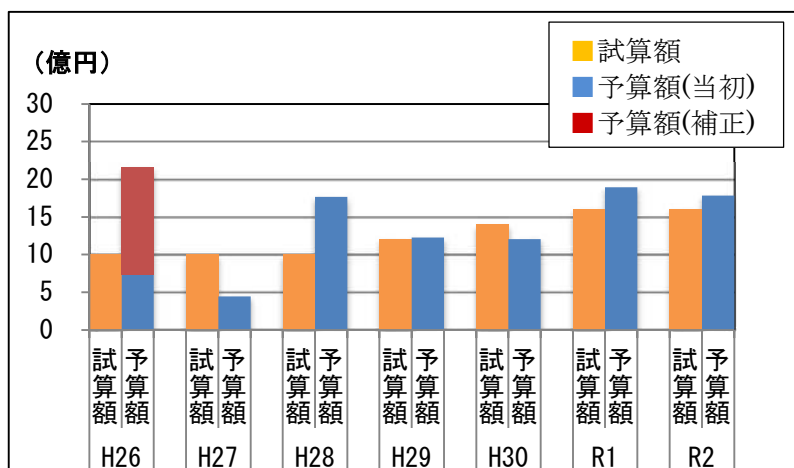


図Ⅱ－４ 橋梁の修繕費の推移

3.3 健全度および修繕状況

(1) 健全度の状況

5 年に 1 回の法定点検が義務付けられた後の平成 26 年度から平成 30 年度までの 1 巡目の点検結果では、早期に修繕が必要である健全度Ⅲと判定された橋梁が、全体の 4、222 橋のうちの約 11%である 485 橋となっています。

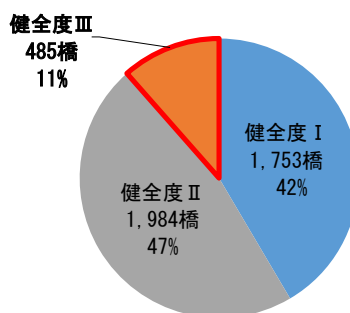

図Ⅱ－５ 橋梁の健全度Ⅲの割合

（２）修繕状況

これまでの橋梁修繕方針に基づき、点検において健全度Ⅲと判定された橋梁を優先的に修繕した結果、1巡目の点検で健全度Ⅲと判定された485橋のうち、令和元年度末時点で、55%の橋梁で修繕に着手しており、22%の橋梁の修繕が完了しています。

表Ⅱ－７ 1巡目の点検結果と修繕状況


(令和元年度末時点)

管理 施設数	点検結果(健全度)				修繕 着手率	修繕 完了率
	I	II	III	IV		
4,222	1,753	1,984	485	0	55%	22%

3.4 維持管理水準に対する評価

橋梁施設数に対する健全度Ⅰ、Ⅱの占める割合は、令和元年度時点で目標92.0%に対し、実績90.8%となっており、目標を達成していない※ものの、健全度Ⅲの施設の数に着実に減少しています。

※：平成30年7月豪雨災害の被災箇所の対応を最優先で実施したため未達成

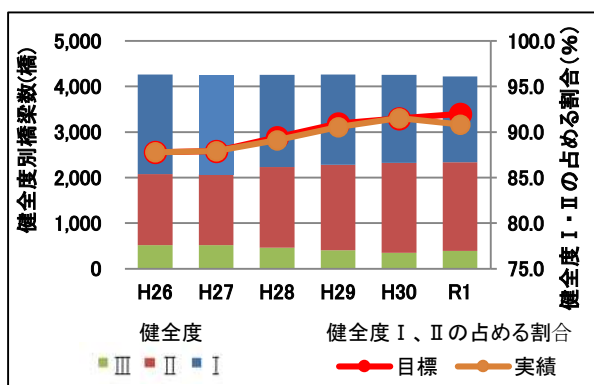

図Ⅱ－6 健全度の推移

3.5 課題

今後、老朽化した橋梁が急速に増大することが予想され、機能を維持するために必要な施設点検や修繕に係る費用や労力の増加が見込まれることから、更なる計画的な修繕とそれに必要な予算確保に努めるとともに、維持管理の高度化、効率化を進めるためのA I / I o T等のデジタル技術の導入を進める必要があります。

4 基本方針


4.1 施設の維持管理水準

(1) 維持管理手法

定期的な点検等により変状を把握し、コンクリートのはく離や鋼材の腐食等、道路利用者へ危険を及ぼすおそれのある変状について、「予防保全型」の維持管理により、効果的な修繕を目指します。

事後保全型の維持管理から予防保全型の維持管理に移行することにより、60年間で約5割の修繕費用の削減が可能となります。

健全度Ⅲの修繕が収束するまでの間は、健全度Ⅱの修繕に着手せず、健全度Ⅲの修繕を優先的に行い、その後は、新たに発生する健全度Ⅲと健全度Ⅱの箇所の修繕を行います。

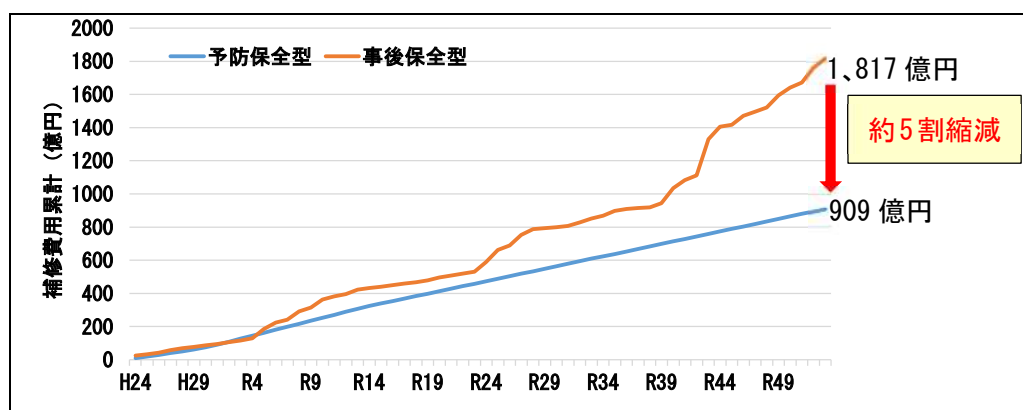

図Ⅱ-7 予防保全型（橋梁）の維持管理を行った場合の効果

(2) 維持管理水準の目標

【計画期間中（令和3年度～令和8年度）の具体的な目標】

1 巡目点検で健全度Ⅲであった箇所の修繕を完了します。

【修繕完了率】

令和2年度末（見込）：30%（147 橋） → 令和8年度末：100%（485 橋）

4.2 対策優先順位

安全で円滑な道路交通環境が阻害されることにより生じる影響を考慮し、跨線橋・跨道橋・渡海橋、緊急輸送道路に指定されている路線の橋梁を優先して対策を行います。


4.3 対策費用の試算

(1) 算定条件

- 部材を①劣化予測する部材(床版、主桁・横桁、橋脚、橋台)と②取替サイクルに基づいて取り替える部材(支承、伸縮装置)に分けます。
- ①については、健全度が修繕時期に達した時点で修繕単価に橋面積等と修繕率を乗じて修繕費を算出し、それを積み上げることで各年度の修繕費を算定します。
- 各部材に対する補修工法・補修工費は、点検健全度ランクごとに代表的な工法および標準的な単価を設定します。
- ②については、設定した取替サイクルを基に、取替年度となった時点で標準的な取替単価を積み上げることで各年度の修繕費を算定します。
- 補修後の健全度は、健全度Ⅰになるものとします。

(2) 算定結果

上記の算定条件による対策費用試算結果は図Ⅱ－８のとおりです。

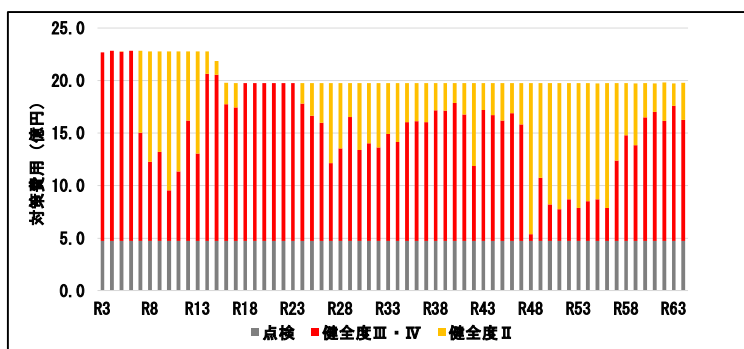

図Ⅱ－８ 対策費用の試算結果

4.4 費用縮減に関する具体的な方針

(1) 予防保全型の維持管理への移行

事後保全型の維持管理から予防保全型の維持管理に移行することにより、中長期的な修繕費用の縮減を図ります。

(2) 集約化・撤去等

【橋梁】

集約化・撤去の検討を行った結果、管理する施設は、緊急輸送道路や集落間を結ぶ道路など、道路ネットワークとして必要不可欠であり、隣接する迂回路を通行した場合、約9km(所要時間10分)を迂回することとなることから、地域住民の利便性や経済活動等に影響を与えるため集約化・撤去を行うことが困難です。

今後も、社会情勢や利用状況の変化を踏まえ、適宜検討します。

【横断歩道橋】

令和8年度までに横断歩道橋1橋の撤去により、維持管理費用(定期点検費用の約60万円)のコスト縮減を目指します。

4. 5 新技術の活用方針

維持管理に係るコスト縮減等に取り組むため、「広島県建設分野の革新技术活用制度」の登録技術や国土交通省の「点検支援技術性能カタログ（案）」に記載されている新技術、新技術情報提供システム（NETIS）の登録技術等を活用します。

【新技術等の活用の令和3年度から令和8年度までの短期的な数値目標】

管理する全ての橋梁及び横断歩道橋のうち、それぞれ約1割の施設で新技術を活用し、従来技術を活用した場合と比較して、橋梁約9,300万円、横断歩道橋約700万円のコスト縮減を目指します。

4. 6 実施方針

令和3年度から令和8年度までの実施方針は次のとおりです。

本県では5年に1回の頻度で橋梁の定期点検を実施しており、その点検結果により健全度を評価します。健全度評価の結果から修繕が必要な橋梁を選定したのち、新技術を活用する等、LCCを含めた費用比較により適切な修繕方法または更新を決定し、修繕等を実施します。

なお、定期点検の結果から、健全度Ⅳと判定された橋梁は、早期に対策が必要なため、速やかに修繕等を実施します。また、道路利用者および第三者への被害が懸念される損傷が発見された場合には、健全度にかかわらず、速やかに修繕等を実施します。

4. 7 今後の取組

（1）維持管理の更なる高度化、効率化


予測保全[※]の導入に向けて、維持管理の高度化、効率化を図ることとし、AI/IoT等のデジタル技術等の導入を進めます。

- ドローンや3次元データを活用した施設点検等の効率化
- 床版点検車を活用した非破壊検査による点検の高度化
- センシング技術等による劣化状態の把握や劣化予測技術の構築

※：これまでの予防保全型や事後保全型の維持管理について、センサーデータ等の蓄積・分析によりインフラの劣化予測精度を向上させ、最適な時期に最適な工法で補修していく考え方



図Ⅱ－9 ドローンによる点検状況

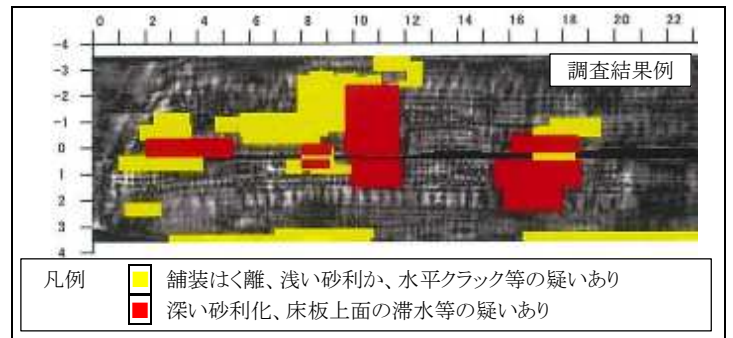

図Ⅱ－１０ 床版点検車とその解析画像

（２）適切な維持管理に向けた修繕費確保への取組

「道路メンテナンス事業補助制度（国土交通省）」を積極的に活用し、修繕費の確保に努めます。

（３）関係機関との情報共有

「広島県道路メンテナンス会議」や広島県主催のアセットマネジメントに関する研修等を通じて国・県・市町との情報共有を行いながら老朽化対策を推進します。

（４）フォローアップ


修繕方針で示した維持管理水準の達成に向けた取組状況等について、フォローアップを行い公表します。

Ⅲ トンネル修繕方針

1 施設の現状

山などを貫通して道路としているトンネルのほか、落石、積雪等の交通障害物を防ぐために道路全体を覆っている施設（ロックシェッド、スノーシェッド等）は、橋梁と同じく一旦機能不全に陥ると、交通遮断等により県民生活の安全あるいは経済・産業活動に大きな影響を及ぼす大変重要な施設です。

県が管理するトンネルは、174 箇所です。このうち、建設後 50 年を経過する高齢化したトンネルは 35 箇所、全体の約 20%を占めています。この割合は、20 年後には、101 箇所となり全体の約 58%を占めます。高齢化したトンネルの増加に伴い、老朽化したトンネルが急速に増大することが予想されます。

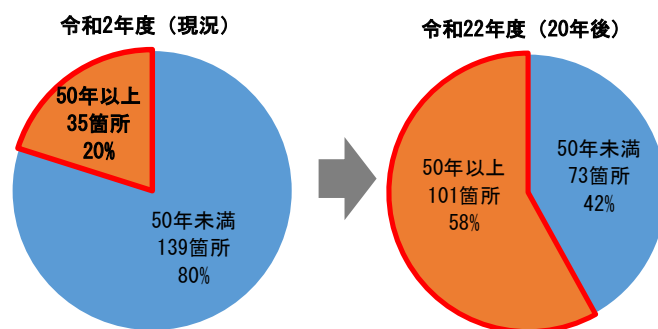

図Ⅲ－1 建設後 50 年以上のトンネル数

2 メンテナンスサイクルの実施

2.1 点検

(1) 点検の種類

トンネル点検は、日常点検、定期点検、異常時点検に分類しています。定期点検（5年に1回の実施を基本）により、トンネルの健全度を確認します。

表Ⅲ－1 トンネル点検の種類と内容

点検の区分	頻度	内容
日常点検	道路巡視、道路パトロールにあわせ随時	異常や損傷等の状況を把握し、必要に応じて応急的な措置を実施
定期点検	5年に1回	近接目視による点検 必要に応じて触診や打音での点検を併用
異常時点検	適宜	地震時や異常気象時、点検リストに記載されたトンネルについて点検を実施（一次点検、二次点検）

(2) 定期点検による評価

トンネルの健全度は、4段階に区分しています。内容は、「Ⅰ」を健全の状態とし、「Ⅲ」と「Ⅳ」が大きな変状が認められ、損傷度合いが大きい状態としています。

表Ⅲ－2 定期点検結果の判定区分

区分	定 義
Ⅰ	利用者に対して影響が及ぶ可能性がないため、措置を必要としない状態
Ⅱ	将来的に、利用者に対して影響が及ぶ可能性があるため、監視、または予防保全の観点から対策を必要とする状態
Ⅲ	早晩、利用者に対して影響が及ぶ可能性が高いため、早期に対策を講じる必要がある状態
Ⅳ	利用者に対して影響が及ぶ可能性が高いため、緊急に対策を講じる必要がある状態

2.2 診断

(1) トンネルごとの診断

各トンネルの覆工スパン単位での最も評価の厳しい健全度を採用し、そのトンネルの健全度とします。

表Ⅲ－3 トンネルごとの健全度の診断における判定区分

良 ↓ 悪	健全度区分		定義
	I (4・5)	健全	トンネルの機能に支障が生じていない状態。
	II (3)	予防保全段階	トンネルの機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。
	III (2)	早期措置段階	トンネルの機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態。
	IV (1)	緊急措置段階	トンネルの機能に支障が生じている、または生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。

※：健全度区分の () 内は「インフラ老朽化対策の中長期的な枠組み」における健全度区分

(2) 主な損傷事例

県内で確認された主な損傷事例は次のとおりです。



覆工アーチ部のはく落・鉄筋露出



目地の浮き

2.3 措置(主な対策)

トンネルの主な損傷は、老朽化等によるコンクリート部材の浮きやひび割れ等であり、主な対策内容は表Ⅲ-4のとおりです。

表Ⅲ-4 主な対策内容

	施 工 前	施 工 後
ひび割れ補修		
F R P ネット工		
断面修復工		

2.4 記録

効率的にメンテナンスサイクルを実施するため、点検、診断、措置の結果をデータとして、蓄積します。

本県では、トンネルの諸元とともに、点検、診断、修繕の履歴等のデータを蓄積する「トンネルアセットマネジメント支援システム」を平成21年度から運用しています。


3 これまでの取組の評価

3.1 対象期間

平成 26 年度から令和 2 年度までの 7 年間

3.2 修繕費の推移

平成 26 年度にとりまとめた修繕費の試算額は、平成 26 年度から令和 2 年度までの期間で各年度の平均は 4.3 億円となっているのに対し、予算額は各年度の平均で 2.4 億円となっており、令和 2 年度時点で、各年度の平均の試算額に比べ 1.9 億円下回っています。

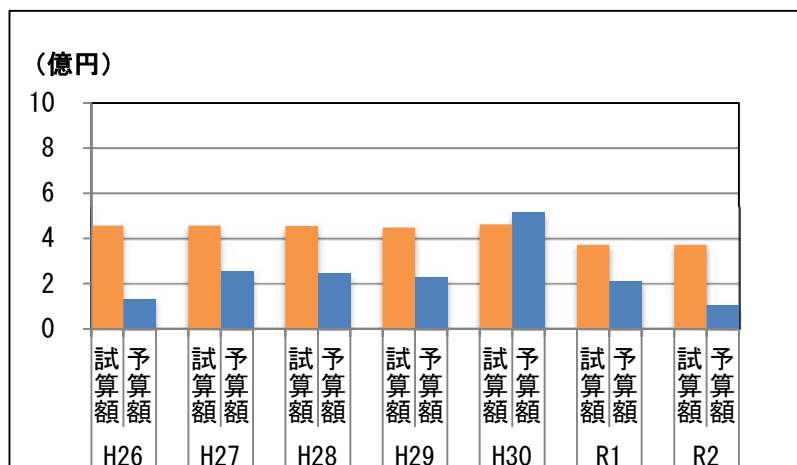


図Ⅲ－2 トンネルの修繕費の推移

3.3 健全度および修繕状況

(1) 健全度の状況

5 年に 1 回の法定点検が義務付けられた後の平成 26 年度から平成 30 年度までの 1 巡目の点検結果では、早期に修繕が必要である健全度Ⅲと判定されたトンネルが、全体の 174 箇所うちの約 45%である 78 箇所となっています。

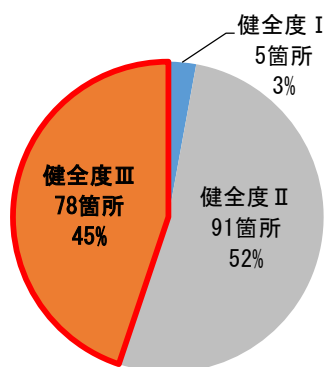

図Ⅲ－3 トンネルの健全度Ⅲの割合

(2) 修繕状況


これまでのトンネル修繕方針に基づき、点検において健全度Ⅲと判定されたトンネルを優先的に修繕した結果、1巡目の点検で健全度Ⅲと判定された78箇所のうち、平成30年度末時点で、全てのトンネルの修繕を完了しており、それ以降の点検により新たに健全度Ⅲと判定された箇所についても着実に修繕しています。

表Ⅲ－5 1巡目の点検結果と修繕状況

管理 施設数	点検結果(健全度)				修繕 着手率	修繕 完了率
	I	II	III	IV		
174	5	91	78	0	100%	100%

3.4 維持管理水準に対する評価

トンネル修繕方針に基づき、点検において健全度Ⅲと判定されたトンネルを優先的に修繕しました。トンネル施設数に対する健全度Ⅰ、Ⅱの占める割合は、平成30年度で100%となり、目標を達成しました。令和元年度以降は、点検により新たに健全度Ⅲと判定された箇所の修繕を実施しています。

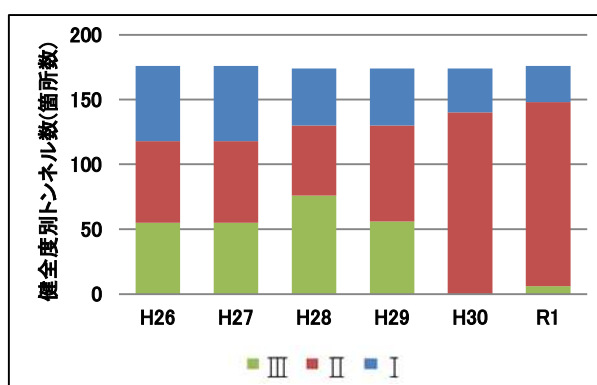

図Ⅲ－4 トンネルの健全度の推移

3.5 課題

今後、老朽化したトンネルが急速に増大することが予想され、機能を維持するために必要な施設点検や修繕に係る費用や労力の増加が見込まれることから、更なる計画的な修繕とそれに必要な予算確保に努めるとともに、維持管理の高度化、効率化を進めるためのAI/IoT等のデジタル技術等の導入を進める必要があります。

4 基本方針


4.1 施設の維持管理水準

(1) 維持管理手法

定期的な点検等により変状を把握し、覆工コンクリートの浮きやはく離等、道路利用者へ危険を及ぼすおそれのある変状について、「予防保全型」の維持管理により、効果的な修繕を目指します。

事後保全型の維持管理から予防保全型の維持管理に移行することにより、60年間で約5割の修繕費用の削減が可能となります。

点検において新たに健全度Ⅲと判定されたトンネルの修繕を優先的に行いながら、健全度Ⅱのトンネルの修繕を行います。

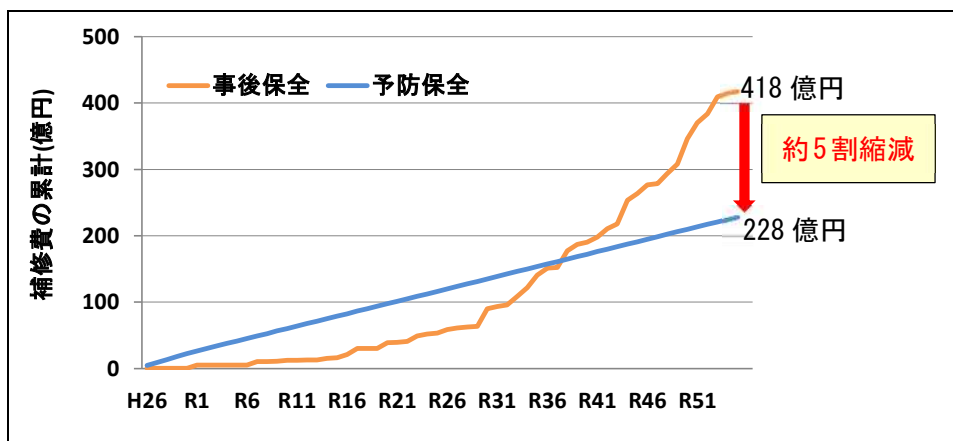

図Ⅲ-5 予防保全型（トンネル）の維持管理を行った場合の効果

(2) 維持管理水準の目標

【計画期間中（令和3年度～令和8年度）の具体的な目標】

2巡目点検の結果、令和2年度末までに健全度Ⅲであった21箇所の修繕を完了します。

4.2 対策優先順位

トンネルの対策順位は、定期点検の結果により健全度Ⅳと判定されたトンネルを優先的に実施し、続いて健全度Ⅲのトンネルを実施します。


4.3 対策費用の試算

(1) 算定条件

- 点検の結果、健全度Ⅲになったものから修繕するものとします。また、建設（前回修繕）から20年経過した時点で健全度Ⅲに達したものとし、修繕することとします。
- 補修後の健全度は、全て健全度Ⅰになるものとします。
- 修繕方法は損傷原因によって異なり、現時点では各トンネルで必要となる修繕工法の分類は困難であり、過去のトンネル修繕実績を標準修繕単価として設定します。

(2) 算定結果

上記の算定条件による対策費用の試算結果は図Ⅲ－6のとおりです。

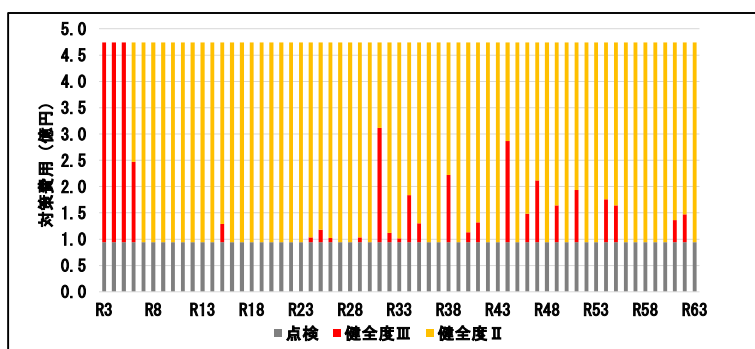

図Ⅲ－6 対策費用の試算状況

4.4 費用縮減に関する具体的な方針

(1) 予防保全型の維持管理への移行

事後保全型の維持管理から予防保全型の維持管理に移行することにより、中長期的な修繕費用の縮減を図ります。

(2) 集約化・撤去等

【トンネル】

集約化・撤去の検討を行った結果、管理する施設は、緊急輸送道路や集落間を結ぶ道路など、道路ネットワークとして必要不可欠であり、隣接する迂回路を通行した場合、約18km（所要時間30分）を迂回することとなることから、地域住民の利便性や経済活動等に影響を与えるため集約化・撤去を行うことが困難です。

今後も、社会情勢や利用状況の変化を踏まえ、適宜検討します。

【シェッド】

集約化・撤去の検討を行った結果、管理する施設は、落石や雪崩等が路面に落下することを防止し、安全な通行を確保するために設置されており、必要不可欠な施設であるため、集約化・撤去を行うことが困難です。

今後も、道路整備状況や周辺環境の変化等により不要と判断した場合は、状況に応じて撤去を検討します。

4.5 新技術の活用方針

維持管理に係るコスト縮減等に取り組むため、「広島県建設分野の革新技术活用制度」の登録技術や国土交通省の「点検支援技術性能カタログ（案）」に記載されている新技術、新技術情報提供システム（NETIS）の登録技術等を活用します。

【新技術等の活用の令和3年度から令和8年度までの短期的な数値目標】

管理する全てのトンネル・シェッドのうち、それぞれ約1割の施設で新技術を活用し、従来技術を活用した場合と比較して、トンネル約550万円、シェッド約100万円のコスト縮減を目指します。

4.6 実施方針

令和3年度から令和8年度までの実施方針は次のとおりです。

本県では5年に1回の頻度でトンネルの定期点検を実施しており、その点検結果により健全度を評価します。健全度評価の結果から修繕が必要なトンネルを選定したのち、新技術を活用する等、LCCを含めた費用比較により適切な修繕方法を決定し、修繕等を実施します。

なお、定期点検の結果から、健全度Ⅳと判定されたトンネルは、早期に対策が必要なため、速やかに修繕等を実施します。また、道路利用者および第三者への被害が懸念される損傷が発見された場合には、健全度にかかわらず、速やかに修繕等を実施します。

4.7 今後の取組

（1）維持管理の更なる高度化、効率化

予測保全の導入に向けて、維持管理の高度化、効率化を図ることとし、AI/IoT等のデジタル技術等の導入を進めます。

- 走行型計測車両によるトンネル覆工の3次元画像の活用等点検の高度化、効率化
- トンネル内の附属物の落下防止のため、センシング技術等による劣化状態の把握や劣化予測技術の構築



図Ⅳ－7 走行計測車両による覆工画像撮影状況

（2）適切な維持管理に向けた修繕費確保への取組

「道路メンテナンス事業補助制度（国土交通省）」を積極的に活用し、修繕費の確保に努めます。

（３）関係機関との情報共有

「広島県道路メンテナンス会議」や広島県主催のアセットマネジメントに関する研修等を通じて国・県・市町との情報共有を行いながら老朽化対策を推進します。

（４）フォローアップ

修繕方針で示した維持管理水準の達成に向けた取組状況等について、フォローアップを行い公表します。

Ⅳ. 舗装修繕方針

1 施設の現状

本県の管理する道路延長は 4,173 kmにおよび、舗装面積では 3,844 万㎡と膨大な施設量を有しています。

舗装は道路利用者が安全で快適に走行でき、沿道への影響や道路の耐久性を保つためのアスファルトやコンクリートの施設で、機能不全に陥ると、走行性が低下するほか、場合によっては事故を引き起こす原因ともなり、県民生活の安全あるいは経済・産業活動に大きな影響を及ぼす重要な施設です。

表Ⅳ－１ 本県の管理する道路延長等

令和2年4月現在

種別	距離	面積
一般国道	982km	1,102 万㎡
主要地方道	1,384km	1,345 万㎡
一般県道	1,807km	1,397 万㎡
合計	4,173km	3,844 万㎡

2 メンテナンスサイクルの実施

2.1 点検


膨大な施設ストックに対して、効率的・効果的に路面性状の把握を行うため、大型車交通量による管理分類の分けを行い、各分類（B、C、D）の道路特性に応じ、日常点検、定期点検を行います。

表Ⅳ－2 舗装の管理分類

管理分類		特性	大型車交通量 (24h)
分類	延長(割合)		
A	— (該当無し)	損傷の進行が早い道路等 (高速道路)	—
B	約 475km (11%)	損傷の進行が早い道路等	1,000 台以上
C	約 580km (14%)	損傷の進行が緩やかな道路等	1,000 台未満 500 台以上
D	約 3,115km (75%)	損傷の進行が極めて緩やかな道路等	500 台未満

表Ⅳ－3 舗装点検の種類と内容

点検の区分	管理分類	頻度	内容
日常点検	B、C、D	道路巡視、道路パトロールにあわせ随時	異常や損傷等の状況を把握し、必要に応じて応急的な措置を実施
定期点検	B (C、Dは適宜)	5年に1回	目視または機器を用いた手法により舗装の状態を把握する

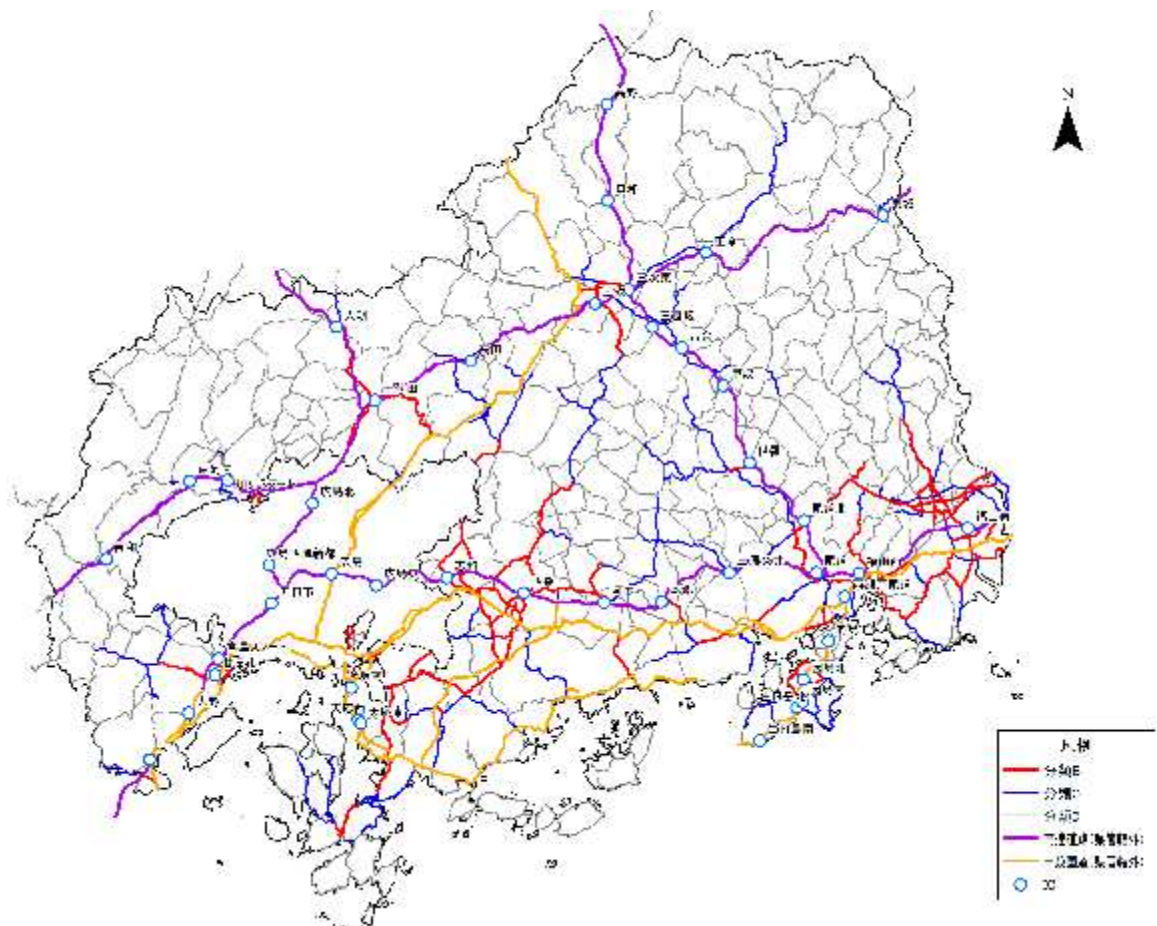

図IV-1 管理分類図

2.2 診断

(1) 舗装の健全度

舗装の健全度は、管理分類により表IV-4～表IV-6のとおり分類しています。

表IV-4 舗装定期点検結果の健全度区分（アスファルト舗装）〔管理分類B〕

健全度区分		内容		管理指標 (参考)
良 ↓ 悪	I (4・5)	健全	舗装表面に軽微な劣化や変状が見られるが、施設の機能低下はなく、経過観察を行う(損傷レベル小)。	$5 \leq MCI$
	II (3)	表層機能保持段階	舗装表面に劣化や変状が進行しており、施設の機能低下を起こさないよう予防対策を行う必要がある(損傷レベル中)。	$3 < MCI < 5$
	III-1 (1・2)	修繕段階/ 表層等修繕	表層の供用年数が使用目標年数を超える場合(路盤以下の層が健全であると想定される場合)	$MCI \leq 3$
	III-2 (1・2)	修繕段階/ 路盤打換等	表層の供用年数が使用目標年数未満である場合(路盤以下の層が損傷していると想定される場合)	

※:健全度区分の()内は「インフラ老朽化対策の中長期的な枠組み」における健全度区分

表Ⅳ－５ 舗装定期点検結果の健全度区分（アスファルト舗装）〔管理分類C・D〕

良
↓
悪

健全度区分		内容	管理指標 (参考)
I (4・5)	健全	舗装表面に軽微な劣化や変状が見られるが、施設の機能低下はなく、経過観察を行う(損傷レベル小)。	5 ≤ MCI
II (3)	表層機能 保持段階	舗装表面に劣化や変状が進行しており、施設の機能低下を起こさないよう予防対策を行う必要がある(損傷レベル中)。	3 < MCI < 5
III (1・2)	修繕段階	舗装表面に劣化や変状が広範囲に進行し、施設の機能が低下しているため、速やかに対策を行う必要がある(損傷レベル大)。	MCI ≤ 3

※：健全度区分の（）内は「インフラ老朽化対策の中長期的な枠組み」における健全度区分

表Ⅳ－６ 舗装定期点検結果の健全度区分（コンクリート舗装）

良
↓
悪

健全度区分		内容
I (4・5)	健全	目地部に目地材が充填されている状態を保持し、路盤以下への雨水の浸入や目地溝に土砂や異物が詰まることがないと想定される状態であり、ひび割れも認められない状態(損傷レベル小)。
II (3)	補修段階	目地部の目地材が飛散等しており、路盤以下への雨水の浸入や目地溝に土砂や異物が詰まるおそれがあると想定される状態、目地部で角欠けが生じている状態(損傷レベル中)。
III (1・2)	修繕段階	コンクリート版において、版央付近またはその前後に横断ひび割れが全幅員にわたって、一枚の版として輪荷重を支える機能が失われている可能性が高いと考えられる状態。または、目地部の段差やコンクリート版の隅角部に角欠けへの進展が想定されるひび割れが生じている等、コンクリート版と路盤の間に隙間が存在する可能性が高いと考えられる状態(損傷レベル大)。

※：健全度区分の（）内は「インフラ老朽化対策の中長期的な枠組み」における健全度区分

（２）主な損傷事例

アスファルト舗装の主な損傷事例は次のとおりです。



路面の損傷（ひび割れ）

2.3 措置(主な対策)

舗装の主な損傷は、大型車等が繰り返し通過することにより舗装面にひび割れ等であり、主な対策内容は次のとおりです。

(1) 切削オーバーレイ

切削オーバーレイは、舗装面にひび割れ等が発生した箇所を削り取り、新しいアスファルト舗装を施工する工事です。

(2) 路上再生路盤工

路上再生路盤工は、既設アスファルト混合物層を路上破砕混合機等によって破砕すると同時に、セメントやアスファルト乳剤等の添加材料を加え、破砕した既設路盤材とともに混合し、締め固めて安定処理した路盤を構築する工事です。

表Ⅳ－７ 主な対策内容

	施 工 中	施 工 後
切削オーバーレイ		
路上再生路盤工		

2.4 記録

効率的にメンテナンスサイクルを実施するため、点検、診断、措置の結果をデータとして、蓄積します。

本県では、舗装の諸元とともに、点検、診断、修繕の履歴等のデータを蓄積する「道路維持管理システム」を平成28年度から運用しています。


3 これまでの取組の評価

3.1 対象期間

平成 26 年度から令和 2 年度までの 7 年間

3.2 修繕費の推移

平成 26 年度にとりまとめた修繕費の試算額は、平成 26 年度から令和 2 年度までの期間で各年度の平均は 28.0 億円となっているのに対し、予算額は各年度の平均で 14.5 億円となっており、令和 2 年度時点で、各年度の平均の試算額から 13.5 億円下回っています。

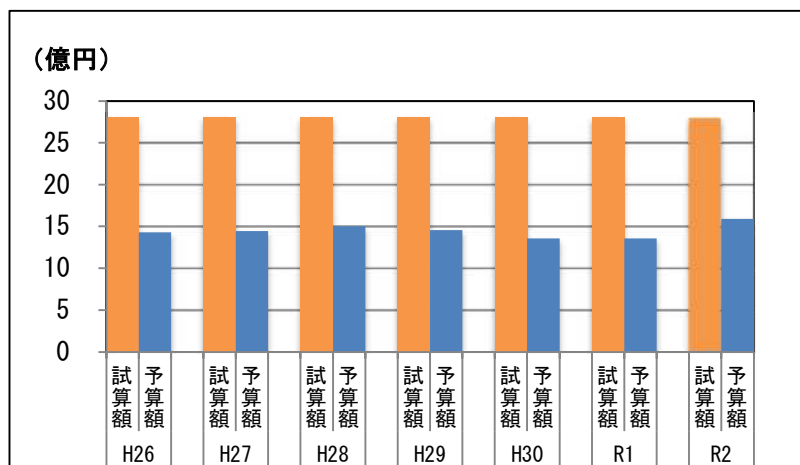


図Ⅳ－2 舗装の修繕費の推移

3.3 健全度および修繕状況

(1) 健全度の状況

管理分類Bにおいて、令和元年度および令和 2 年度に実施した点検の結果では、修繕が必要である健全度Ⅲと判定された区間は、全体の約 7 %である 32.6km となっています。

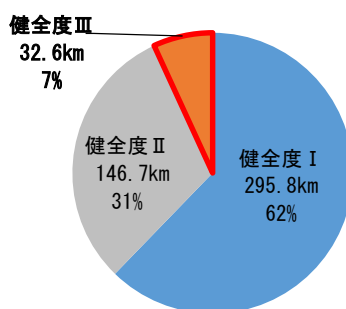

図Ⅳ－3 舗装の健全度Ⅲの割合（管理分類B）

（２）修繕の状況

管理分類Ｂの道路においては、健全度Ⅲと判定された区間を優先的に修繕した結果、健全度Ⅲが占める割合は、平成 26 年度時点では 10.6%であったが、令和元年度から 2 年度の点検結果では 7.1%に低減しました。


更に管理分類Ｃ、Ｄの道路においては、日常的な点検により現地の損傷状況等を把握しながら、適切に修繕を行いました。

図Ⅳ－４ 平成 26 の点検結果と令和元・２年度の点検結果

	I	II	III
H26 点検	56.8%	32.6%	10.6%
↓			
R 1・2 点検	61.5%	31.4%	7.1%

3. 4 維持管理水準に対する評価

定期点検を実施している管理分類Ｂの道路のうち、健全度Ⅲが占める割合は、平成 26 年度時点では 10.6%であったが、令和元年度から令和 2 年度の点検結果では 7.1%となっており、健全度Ⅲの区間は着実に減少しました。

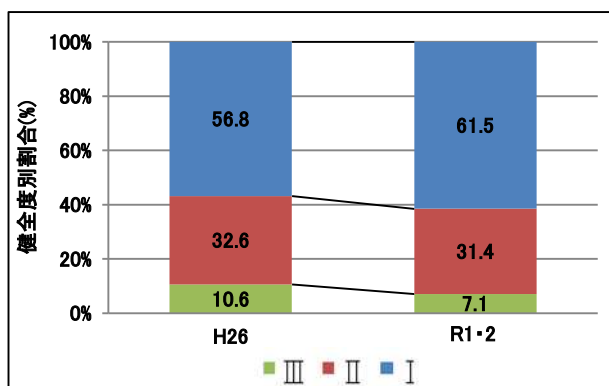

図Ⅳ－５ 舗装の健全度の推移

3. 5 課題

舗装の修繕においては、定期的な点検や日常の点検により劣化・損傷の状況を適切に把握し、更なる計画的な修繕とそれに必要な予算確保に努める必要があります。また、管理分類Ｂ以外は定量的な健全度の把握をしていないため、デジタル技術等を活用して路面性状を把握する必要があります。

4 基本方針

4.1 施設の維持管理水準

(1) 維持管理手法

日常的な点検や定期的な点検等により損傷を把握し、「事後保全型」の維持管理により効果的な修繕を目指します。

点検において、健全度Ⅲと判定された区間を修繕します。なお、緊急対応が必要な箇所については、点検の結果によらず修繕を実施します。

(2) 維持管理水準の目標

【計画期間中（令和3年度～令和8年度）の具体的な目標】

大型車交通量が1,000台/日以上以上の区間について、令和元年度から令和2年度の点検で健全度Ⅲであった区間の修繕を完了します。


4.2 対策費用の試算

(1) 算定条件

- 定期点検の結果を基に、管理区分ごとに健全度Ⅲになるとただちに修繕するよう修繕サイクルを設定しています。
- 修繕を実施した舗装は健全度Ⅰになると仮定し、また、修繕を実施した舗装の次回修繕時期は、補修工法別に定期点検の結果の劣化予測から補修時期を推定します。ただし、標準の補修サイクルより早期に劣化する場合においては、現地の詳細調査を行い、その結果により補修工法を見直します。

(2) 算定結果

上記の算定条件による対策費用の試算結果は図Ⅳ－6のとおりです。

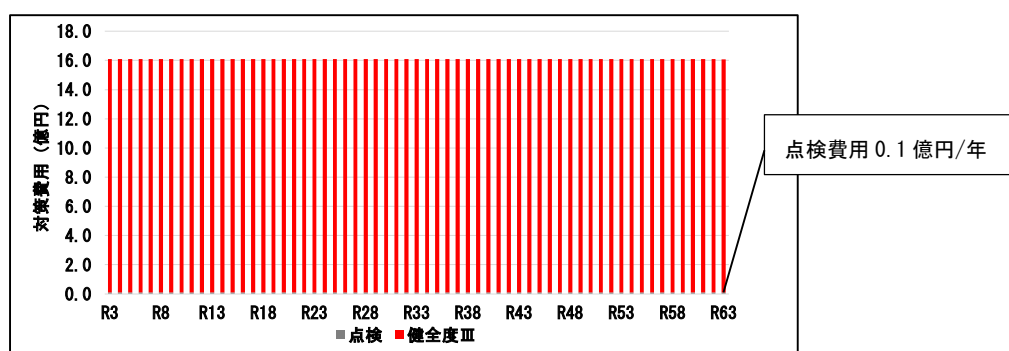

図Ⅳ－6 対策費用の試算

4.3 費用縮減に関する具体的な方針

LCCを含めた費用比較により適切な修繕方法を決定し、修繕等を実施することにより、中長期的な維持管理費用の縮減を図ります。

4.4 新技術の活用方針

維持管理に係るコスト縮減等に取り組むため、「広島県建設分野の革新技術活用制度」の登録技術に記載されている新技術、新技術情報提供システム（NETIS）の登録技術等の新技術を活用するとともに、AI/IoT等のデジタル技術等の活用を推進します。

【新技術等の活用の令和3年度から令和8年度までの短期的な数値目標】

管理する全路線で新技術の活用を目指します。

4.5 実施方針

令和3年度から令和8年度までの実施方針は次のとおりです。

本県では、舗装の管理分類に従い効果的な点検を実施することとしており、その点検結果により健全度を評価します。健全度評価の結果から修繕が必要な箇所を選定したのち、新技術を活用する等、LCCを含めた費用比較により適切な修繕方法を決定し、修繕等を実施します。

なお、路面陥没（穴ぼこ）の発生等、道路利用者および第三者への被害が懸念される場合には、健全度にかかわらず、速やかに補修等の維持工事を実施します。

4.6 今後の取組

（１）維持管理の更なる高度化、効率化

維持管理の更なる効率化を図ることとし、AI/IoT等のデジタル技術等の導入を進めます。

- ドライブレコーダーの画像をAI解析する等効率的かつ低廉な点検・調査手法の構築や路面陥没（穴ぼこ）を予測する技術を構築



図IV-7 ドライブレコーダーの画像解析による点検イメージ

- FWD（路盤構造評価装置）を用いた非破壊検査により点検の高度化および路盤の状態に合わせた工法選定

（２）適切な維持管理に向けた修繕費確保への取組

「公共施設等適正管理推進事業債」および「緊急自然災害防止対策事業債」等を積極的に活用し、修繕費の確保に努めます。

(3) フォローアップ

修繕方針で示した維持管理水準の達成に向けた取組状況等について、フォローアップを行い公表します。

V. 道路附属物修繕方針

1 施設の現状

本県が管理する道路には、全 30,817 基の道路照明、道路標識、門型標識、道路情報提供装置および防護柵等の道路附属物があります。

これらの大半は、高度経済成長期の道路整備にあわせて設置されており、今後大量の道路附属物の修繕や更新が必要となることが想定されます。












また平成 26 年 6 月には、門型支柱を有する大型の道路附属物に関しての定期点検が義務化される等、老朽化に対する適切な維持管理が求められています。

表 V-1 本県の管理する道路附属物の数（令和 3 年 3 月現在）

道路附属物		合 計	備考
道路照明		9,499 基	令和 3 年 3 月
道路標識	門型標識	9 基※	法定点検実施数（令和 2 年 4 月）
	道路標識	21,013 基	H25 道路ストック総点検実施数
道路情報提供装置		296 基※	保守管理実施数

※：法定点検の対象となる門型支柱（オーバーヘッド式）を有する大型の道路標識および道路情報提供装置は 21 基

表 V-2 道路附属物の事例

道路照明	 逆L型	 直線型	 Y型	 共架式	
道路標識	 門型標識	 F型	 逆L型	 複柱式	 単柱式
道路情報提供装置					
防護柵					

2 メンテナンスサイクルの実施

2.1 点検

(1) 点検の基本的な考え方

特定された弱点部を点検することにより、落下や倒壊等第三者被害のおそれがある事故や不具合を未然に防止することを目的としています。

1) 道路照明、道路標識（片持ち式、路側式）、道路情報提供装置

点検は、日常点検、定期点検（詳細点検・中間点検）、異常時点検に分類し、健全性の評価を行います。

また、道路照明、道路標識（片持ち式、路側式）については、形式によって弱点部の箇所や想定される変状、発生する事象を特定し、できるだけ効率的となるよう点検の基本的な考え方を次のとおりとします。

【片持ち式】

片持ち式の附属物は、落下や倒壊事象を防止する必要があることから、支柱、横梁、標識板または灯具取付部、ブラケット取付部等の弱点部を点検することとし、その他必要に応じ第三者被害のおそれのある部材を点検します。

【路側式】

路側式の附属物は、倒壊事象を防止する必要があることから、支柱等の弱点部を点検します。

表 V-3 道路照明、道路標識道路標識（片持ち式、路側式）の分類

区分	事象	代表的な附属物の種類
片持ち式	落下、倒壊事象のおそれがある附属物	標識:F型、逆L型、T型および高所に設置された単柱式または複柱式 照明:逆L型、直線型、Y型、共架式
路側式	倒壊事象のおそれがある附属物	標識:単柱式※、複柱式※

※:片持ち式に分類したものは除く

2) 門型標識

点検は、日常点検、定期点検、異常時点検に分類し、健全性の評価を行います。

また、必要に応じて、触診や打音、土中部等の部材について変状が疑われる場合は、試掘や非破壊検査を併用して行います。

3) 防護柵

点検は、日常点検を基本とし、変状の有無を確認します。

(2) 点検の種類

道路附属物の点検は、施設ごとに表V-4の分類のとおり実施します。

表V-4 道路附属物点検の種類と内容

【共通】

点検の区分	頻度	内容
日常点検	道路巡視、道路パトロールにあわせ随時	パトロール車内から目視を基本として、変状の有無を点検する。また、必要に応じて対象物に近づき、附属物の状態を確認
異常時点検	必要に応じて実施	地震時や異常気象時等に、必要に応じて点検を実施

【道路照明、道路標識(片持ち式、路側式)、道路情報提供装置】

点検の区分	頻度	内容
定期点検 (詳細点検)	1回/10年※	附属物構造全体の損傷を発見しその程度を把握するとともに、次回の定期点検までに必要な措置等の判断を行う上で必要な情報を得るために実施 ・近接目視による点検 ・必要に応じて、触診や打音等を併用 ・近接目視結果から必要に応じて非破壊検査を実施 ・点検の結果並びに措置の内容等を適切な方法で記録
定期点検 (中間点検)	必要に応じて中間的な時期を目途に実施	詳細点検を補完するために実施 ・外観目視を基本とした点検 ・合いマーク等の確認、合いマークがないものはゆるみの確認と合いマークの施工 ・点検の結果並びに措置の内容等を適切な方法で記録

※：路側式(標識)は、必要に応じ、片持ち式に準じて点検します。

【道路標識(門型標識)】

点検の区分	頻度	内容
定期点検	1回/5年	附属物構造全体の損傷を発見しその程度を把握するとともに、次回の定期点検までに必要な措置等の判断を行う上で必要な情報を得るために実施 ・近接目視による点検 ・必要に応じて、触診や打音等を併用 ・近接目視結果から必要に応じて非破壊検査を実施 ・点検の結果並びに措置の内容等を適切な方法で記録

【防護柵】

点検の区分	頻度	内容
日常点検	道路巡視、道路パトロールにあわせ随時	パトロール車内から目視を基本として、変状の有無を点検する。また、必要に応じて対象物に近づき、防護柵の状態を確認

2.2 診断

(1) 附属物ごとの健全性の診断

道路附属物（道路照明、道路標識、門型標識、道路情報提供装置）の健全度は、4段階に区分しています。

表Ⅴ－5 道路附属物の健全度区分

健全度区分		判定の内容
良 ↓ 悪	I (4・5)	健全
	II (3)	予防保全段階
	III (2)	早期措置段階
	IV (1)	緊急措置段階

※：健全度区分の（）内は「インフラ老朽化対策の中長期的な枠組み」における健全度区分

(2) 主な損傷事例

県内で確認された主な損傷事例は表V-6のとおりです。

表V-6 主な損傷事例

損 傷 事 例		
標 識	 <p>き裂</p>	 <p>腐食</p>
	 <p>変形・欠損</p>	 <p>破断</p>
照 明	 <p>ボルト脱落</p>	 <p>破断</p>
防 護 柵	 <p>変形</p>	 <p>腐食</p>

2.3 措置(主な対策)

道路附属物の主な損傷は、老朽化等による部材のき裂、腐食、変形・欠損、ボルト・ナットのゆるみ・脱落、破断等であり、主な対策内容は次のとおりです。

(1) ボルト・ナットのゆるみ・脱落対策

ボルト・ナットのゆるみに対して締め付ける作業です。ボルト・ナットの締め付け後、以後の点検効率化のため、合いマークを施した事例です。



図 V-1 合いマーク施工状況

(2) 塗装処理

塗装処理は、腐食が発生した部材に対し、耐腐食性の高い塗料を施す工事です。



図 V-2 塗装処理状況

2.4 記録


効率的にメンテナンスサイクルを実施するため、点検、診断、措置の結果をデータとして、蓄積します。

本県では、道路附属物の諸元とともに、点検、診断、修繕の履歴等のデータを蓄積する「道路維持管理システム」を平成 28 年度から運用しています。

3 これまでの取組の評価

道路附属物修繕方針は平成 30 年 3 月に策定し、修繕の履歴や点検のデータの蓄積が十分でないため、これまでの取組の評価は次期改定時から行うものとします。

なお、令和元年度に実施した点検の結果では、道路照明では全体の約 1 %、道路標識（片持ち式）では全体の約 14 %、道路標識（路側式）では全体の約 5 %において、修繕が必要な健全度Ⅲの損傷が発生しています。

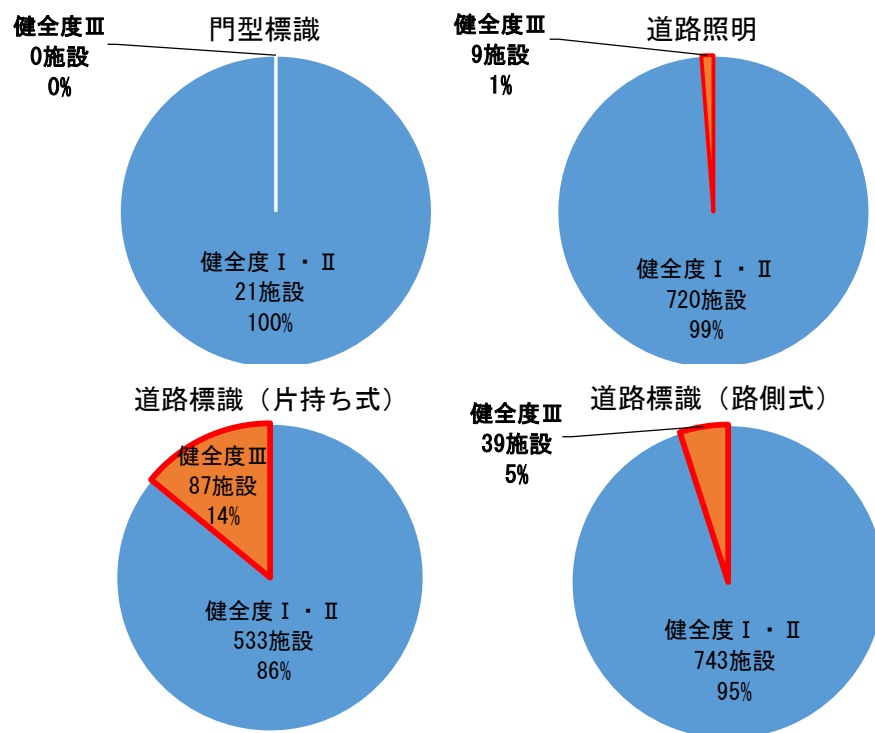

図Ⅴ－3 健全度区分の割合

4 基本方針

4.1 施設の維持管理水準

(1) 維持管理手法

定期的な点検等により損傷を把握し、施設の腐食状況や亀裂等、道路利用者へ危険を及ぼすおそれのある損傷について、「事後保全型」、「事後交換型」の維持管理により効果的な修繕を目指します。

点検の結果により、健全度Ⅲ・Ⅳの附属物を優先して修繕します。なお、緊急対応が必要な箇所については、点検の結果によらず修繕を実施します。

表Ⅴ－７ 道路附属物の種類ごとの維持管理手法

道路附属物の種類	事後保全型	事後交換型
道路照明	●	
道路標識	●	
道路情報提供装置	●	
防護柵		●

(2) 維持管理水準

【計画期間中（令和3年度～令和8年度）の具体的な目標】

令和2年度の点検の結果により、健全度Ⅲであった164箇所の修繕を完了します。

4.2 対策費用の試算


(1) 算定条件

- 費用算定期間は、令和3年度～令和62年度の60年間とします。
- 費用算定施設は、道路照明・道路標識・道路情報提供装置・防護柵とします。
- 修繕を実施した施設については、「健全度Ⅰ」まで機能回復するものとします。
- 更新・修繕費については、過去の修繕実績を標準修繕単価として設定します。
- 定期点検費用は過去の点検費用の平均値を設定します。

※：健全度Ⅰ→Ⅳに移行する期間は30年と仮定した上で、健全度Ⅰ→Ⅱに移行期間（15年）、健全度Ⅱ→Ⅲに移行期間（10年）、健全度Ⅲ→Ⅳに移行期間（5年）と仮定。

(2) 算定結果

上記の算定条件による対策費用の試算結果は図Ⅴ－4のとおりです。

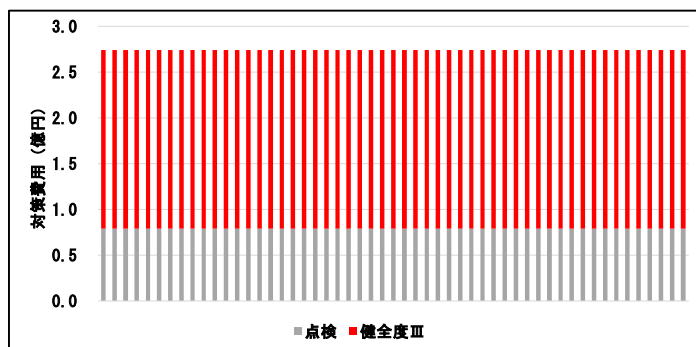

図Ⅴ－４ 対策費用の試算

4.3 費用縮減に関する具体的な方針

(1) 集約化・撤去等

集約化・撤去の検討を行った結果、道路情報板や案内標識等が設置されており、道路利用者にとって欠かすことのできない施設であるため、集約化・撤去を行うことが困難です。

今後も、道路整備状況や周辺環境の変化等により不要と判断した場合は、撤去を検討します。また、近接する道路情報板や道路案内標識など、他の公共施設との集約が可能な場合は、集約を検討します。

4.4 新技術の活用方針

維持管理に係るコスト縮減等に取り組むため、「広島県建設分野の革新技术活用制度」の登録技術や国土交通省の「点検支援技術性能カタログ（案）」に記載されている新技術、新技術情報提供システム（NETIS）の登録技術等の新技術の動向を的確に捉え、新技術の活用を推進します。

【新技術等の活用の令和3年度から令和8年度までの短期的な数値目標】

管理する全ての門型標識等のうち、約1割で新技術を活用し、従来技術を活用した場合と比較して約10万円のコスト縮減を目指します。

4.5 実施方針

令和3年度から令和8年度までの実施方針は次のとおりです。

本県では、道路附属物の施設ごとに効果的な点検を実施することとしており、その点検結果により健全度を評価します。健全度評価の結果から修繕が必要な箇所を選定したのち、修繕等を実施します。

なお、定期点検の結果から、健全度Ⅳと判定された箇所は、早期に対策が必要なため、速やかに修繕等を実施します。また、道路利用者および第三者への被害が懸念される場合については、健全度にかかわらず、速やかに修繕等を実施します。

4. 6 今後の取組

(1) 維持管理の更なる高度化、効率化

道路照明等の維持管理への予測保全の導入に向けて、維持管理の高度化、効率化を図るとともに、A I / I o T等のデジタル技術等の導入を進めます。

- センサー技術等を活用した道路照明の支柱や灯具等の異常検知等、現在の点検手法にとらわれない効率的かつ安価な点検が可能となる技術を確立



図 V-5 センサー技術等の活用による異常検知イメージ

(2) 適切な維持管理に向けた修繕費確保への取組

「道路メンテナンス事業補助制度（国土交通省）」や「公共施設等適正管理推進事業債」等を積極的に活用し、修繕費の確保に努めます。

(3) 多様な主体との連携

「広島県道路メンテナンス会議」や広島県主催のアセットマネジメントに関する研修等を通じて国・県・市町の連携による効率的な維持管理を推進します。

(4) フォローアップ

修繕方針で示した維持管理水準の達成に向けた取組状況等について、フォローアップを行い公表します。

VI. 今後の予定

引き続き、次の施設について、修繕方針の策定に取り組めます。

◆法面（R7. 3 策定予定）

改訂履歴

平成26年 8 月	道路事業修繕方針（対象施設：橋梁、トンネル、舗装）を策定
平成31年 3 月	対象施設に道路附属物を追加し改訂
令和 3 年 3 月	全面改訂
令和 4 年12月	部分改訂
令和 6 年 2 月	部分改定
令和 6 年11月	構造物ごとの一覧表を更新
令和 7 年12月	部分改訂

別紙 構造物ごとの一覧表（橋梁）

No.	橋梁番号	施設名	事務所名	所在地		路線名	架設年度	橋長 (m)	幅員 (m)	橋梁種別	1巡目点検		最新の点検結果		次回点検	令和7年度から令和10年度までの修繕計画				点検・修繕計画 ○：定期点検(予定), □:修繕着手(予定), ☆：修繕完了(予定) ●：定期点検済, ■:修繕着手済, ★：修繕完了済計画								備考		
				県名	市町名						点検年度	健全度	点検年度	健全度		点検年度	修繕着手年度	修繕完了年度	概算工事費 (100万円)	主な修繕内容	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2027	2028
1	1001	瀬本橋	西部建設事務所	広島県	江田島市	国道487号	1973	15.6	10.2	道路橋	2015	Ⅱ	2024	Ⅱ	2029					●				●						
2	1002	小島橋	西部建設事務所	広島県	江田島市	国道487号	1973	2.7	14.3	道路橋	2015	Ⅱ	2024	Ⅱ	2029					●				●						
3	1003	御立橋	西部建設事務所	広島県	江田島市	国道487号	1959	10.3	10.6	道路橋	2015	Ⅲ	2024	Ⅱ	2029					●				●						
4	1004	紡橋	西部建設事務所	広島県	江田島市	国道487号	1988	4.8	7.6	道路橋	2015	Ⅱ	2024	Ⅱ	2029					●				●						
5	1005	八幡橋	西部建設事務所	広島県	江田島市	国道487号	1991	9.2	8.5	道路橋	2015	Ⅱ	2024	Ⅱ	2029					●				●						
6	1006	東沖橋	西部建設事務所	広島県	江田島市	国道487号	1931	5	14.8	道路橋	2015	Ⅱ	2024	Ⅲ	2029					●				●						
7	1007	西沖橋	西部建設事務所	広島県	江田島市	国道487号	1979	11.6	28.3	道路橋	2015	Ⅱ	2024	Ⅱ	2029					●				●						
8	1008	峯ヶ迫橋	西部建設事務所	広島県	江田島市	国道487号	1993	4.6	9.8	道路橋	2015	Ⅱ	2024	Ⅱ	2029					●				●						
9	1009	新峯ヶ迫橋	西部建設事務所	広島県	江田島市	国道487号	1977	3.8	11.8	道路橋	2015	Ⅱ	2024	Ⅱ	2029					●				●						
10	1010	鎌木2号橋	西部建設事務所	広島県	江田島市	国道487号	1950	2.4	8.6	道路橋	2015	Ⅲ	2024	Ⅱ	2029					●				●						
11	1012	大矢橋	西部建設事務所	広島県	江田島市	国道487号	1972	21.8	9.8	道路橋	2015	Ⅱ	2024	Ⅱ	2029					●				●						
12	1013	ミヤチ橋	西部建設事務所	広島県	江田島市	国道487号	1943	3.9	12.5	道路橋	2015	Ⅱ	2024	Ⅱ	2029					●				●						
13	1014	薬師橋	西部建設事務所	広島県	江田島市	国道487号	1943	11.1	7.8	道路橋	2015	Ⅱ	2024	Ⅰ	2029					●				●						
14	1015	郷橋	西部建設事務所	広島県	江田島市	国道487号	1968	9.7	24.2	道路橋	2015	Ⅲ	2024	Ⅱ	2029					●				●						
15	1016	永田橋	西部建設事務所	広島県	江田島市	国道487号	1923	7.7	11.9	道路橋	2015	Ⅱ	2024	Ⅱ	2029					●				●						
16	1018	見浪橋	西部建設事務所	広島県	江田島市	国道487号	1978	14.4	9.9	道路橋	2015	Ⅱ	2024	Ⅱ	2029					●				●						
17	1019	第二清能橋	西部建設事務所	広島県	江田島市	国道487号	1978	3.6	10.2	道路橋	2015	Ⅱ	2024	Ⅱ	2029					●				●						
18	1020	二谷橋	西部建設事務所	広島県	江田島市	国道487号	1923	2.6	5.5	道路橋	2015	Ⅱ	2024	Ⅱ	2029					●				●						
19	1021	新空川橋	西部建設事務所	広島県	江田島市	国道487号	1993	12.2	10.9	道路橋	2015	Ⅱ	2024	Ⅱ	2029					●				●						
20	1022	無名橋	西部建設事務所	広島県	江田島市	国道487号	1993	8.9	9.3	道路橋	2015	Ⅱ	2024	Ⅱ	2029					●				●						
21	1023	宋崎橋	西部建設事務所	広島県	江田島市	国道487号	1944	2.2	22	道路橋	2015	Ⅱ	2024	Ⅱ	2029					●				●						
22	1024	湯田橋	西部建設事務所	広島県	江田島市	国道487号	1960	3	13	道路橋	2015	Ⅱ	2024	Ⅱ	2029					●				●						
23	1025	西ノ段橋	西部建設事務所	広島県	江田島市	国道487号	1965	9.1	9.1	道路橋	2015	Ⅱ	2020	Ⅲ	2025					●				■★	○					
24	1026	一ツ川橋	西部建設事務所	広島県	江田島市	国道487号	1961	3.8	13.8	道路橋	2015	Ⅲ	2024	Ⅱ	2029					●				●						
25	1027	渡川橋	西部建設事務所	広島県	江田島市	国道487号	2009	10.1	7.9	道路橋	2015	Ⅱ	2024	Ⅱ	2029					●				●						
26	1028	中松田橋	西部建設事務所	広島県	江田島市	国道487号	1942	2.2	5	道路橋	2015	Ⅱ	2024	Ⅱ	2029					●				●						
27	1029	古鷹橋	西部建設事務所	広島県	江田島市	国道487号	1981	6.9	8.6	道路橋	2017	Ⅱ	2022	Ⅱ	2027							●					○			
28	1030	西沖橋	西部建設事務所	広島県	江田島市	国道487号	1942	3.3	8.2	道路橋	2016	Ⅱ	2021	Ⅱ	2025						●					○				
29	1031	切串大橋	西部建設事務所	広島県	江田島市	国道487号	1988	17.6	22.8	道路橋	2017	Ⅰ	2022	Ⅰ	2027							●				○				
30	1049	松崎橋	西部建設事務所	広島県	江田島市	県道高田沖美江田島線	1974	3.8	7.3	道路橋	2016	Ⅱ	2021	Ⅱ	2025							●								
31	1050	大坪橋	西部建設事務所	広島県	江田島市	県道高田沖美江田島線	1960	2	4.6	道路橋	2015	Ⅱ	2024	Ⅰ	2029				●					●			○			
32	1051	大石橋	西部建設事務所	広島県	江田島市	県道高田沖美江田島線	1960	2.2	4.4	道路橋	2015	Ⅲ	2024	Ⅰ	2029				●			★	●							
33	1052	大森橋	西部建設事務所	広島県	江田島市	県道高田沖美江田島線	1960	5.1	9.1	道路橋	2015	Ⅱ	2024	Ⅲ	2029				●				●■★							
34	1053	正光橋	西部建設事務所	広島県	江田島市	県道高田沖美江田島線	1966	4	6	道路橋	2015	Ⅱ	2024	Ⅱ	2029				●				●							
35	1054	永田川橋	西部建設事務所	広島県	江田島市	県道高田沖美江田島線	1960	6.5	8.1	道路橋	2015	Ⅱ	2024	Ⅲ	2029				●				●							
36	1055	水ノ元橋	西部建設事務所	広島県	江田島市	県道高田沖美江田島線	1933	7.8	12.6	道路橋	2015	Ⅲ	2024	Ⅰ	2029				●			★	●							
37	1056	長瀬橋	西部建設事務所	広島県	江田島市	県道高田沖美江田島線	1949	3.5	13.4	道路橋	2015	Ⅱ	2024	Ⅱ	2029				●				●							
38	1057	落走橋	西部建設事務所	広島県	江田島市	県道高田沖美江田島線	1982	5.1	7.2	道路橋	2015	Ⅱ	2024	Ⅱ	2029				●				●							
39	1058	坪崎橋	西部建設事務所	広島県	江田島市	県道高田沖美江田島線	1982																							

No.	橋梁番号	施設名	事務所名	所在地		路線名	架設年度	橋長 (m)	幅員 (m)	橋梁種別	1巡目点検		最新の点検結果		次回点検	令和7年度から令和10年度までの修繕計画				点検・修繕計画 ○：定期点検(予定), □:修繕着手(予定), ☆：修繕完了(予定) ●：定期点検済, ■:修繕着手済, ★：修繕完了済計画								備考		
				県名	市町名						点検年度	健全度	点検年度	健全度		点検年度	修繕着手年度	修繕完了年度	概算工事費 (100万円)	主な修繕内容	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2027	2028
78	1140	永田川歩道橋	西部建設事務所	広島県	江田島市	県道高田沖美江田島線	不明	8.6	2.3	道路橋	2015	I	2024	I	2029						●									
79	1142	飛渡瀬橋	西部建設事務所	広島県	江田島市	県道高田沖美江田島線	1988	10.4	11	道路橋	2015	II	2024	II	2029						●									
80	1143	速崎橋	西部建設事務所	広島県	江田島市	県道高田沖美江田島線	1960	2.2	6.5	道路橋	2015	III	2024	I	2029						●		★							
81	1144	開港橋	西部建設事務所	広島県	江田島市	県道高田沖美江田島線	1960	10.7	6.2	道路橋	2015	II	2024	II	2029						●									
82	1145	柳ノ前橋	西部建設事務所	広島県	江田島市	県道高田沖美江田島線	1982	4.6	8.5	道路橋	2017	I	2022	II	2027													○		
83	1146	宝原橋	西部建設事務所	広島県	江田島市	県道高田沖美江田島線	1955	2.5	5.2	道路橋	2017	II	2022	II	2027						●							○		
84	1147	大間橋	西部建設事務所	広島県	江田島市	県道高田沖美江田島線	1996	2.2	18.8	道路橋	2017	I	2022	I	2027						●							○		
85	1148	亀原1号橋	西部建設事務所	広島県	江田島市	県道高田沖美江田島線	不明	2.8	5.5	道路橋	2017	I	2022	I	2027						●							○		
86	1149	亀原2号橋	西部建設事務所	広島県	江田島市	県道高田沖美江田島線	1989	3.2	10	道路橋	2016	III	2021	I	2025												○			
87	1150	四郎五郎橋	西部建設事務所	広島県	江田島市	県道高田沖美江田島線	1997	2	5	道路橋	2017	II	2022	II	2027													○		
88	1151	ソウパー橋	西部建設事務所	広島県	江田島市	県道高田沖美江田島線	1974	2.3	10	道路橋	2017	II	2022	I	2027													○		
89	1152	南郷橋	西部建設事務所	広島県	江田島市	県道高田沖美江田島線	1997	2	6.3	道路橋	2016	II	2021	II	2025						●							○		
90	1156	ボックスカルバート	西部建設事務所	広島県	江田島市	県道高田沖美江田島線	1997	5.5	10	道路橋	2017	II	2022	II	2027													○		
91	1158	是長橋	西部建設事務所	広島県	江田島市	県道高田沖美江田島線	1953	2.8	5	道路橋	2016	II	2021	II	2025						●								○	
92	1159	無名橋	西部建設事務所	広島県	江田島市	県道高田沖美江田島線	1997	2.5	4.5	道路橋	2017	II	2022	II	2027													○		
93	1209	無名橋	西部建設事務所	広島県	江田島市	県道江田島大柿線	1996	2.1	12.7	道路橋	2016	II	2021	II	2025						●							○		
94	1210	無名橋	西部建設事務所	広島県	江田島市	県道江田島大柿線	2015	2	34.2	道路橋	2016	I	2021	I	2025						●							○		
95	1211	無名橋	西部建設事務所	広島県	江田島市	県道江田島大柿線	1999	2.6	6.9	道路橋	2016	II	2021	II	2025						●							○		
96	1302	ボックスカルバート	西部建設事務所	広島県	江田島市	県道大君深江線	1980	2.6	9.7	道路橋	2017	I	2022	I	2027													○		
97	1406	大原歩道橋	西部建設事務所	広島県	江田島市	県道石風呂切串線	1965	9.5	1.5	道路橋	2016	I	2021	I	2025						●							○		
98	1603	無名橋	西部建設事務所	広島県	江田島市	県道秋月飛渡瀬線	1999	2	4.5	道路橋	2017	II	2022	II	2027													○		
99	1709	小島歩道橋	西部建設事務所	広島県	江田島市	県道深江柿浦線	1970	4	2.7	道路橋	2017	II	2022	II	2027													○		
100	1801	境橋	西部建設事務所	広島県	熊野町	県道呉平谷線	1976	8.4	7.7	道路橋	2016	II	2021	II	2025						●							○		
101	1805	ボックスカルバート	西部建設事務所	広島県	熊野町	県道矢野安浦線	不明	2.1	9.7	道路橋	2016	II	2021	II	2025						●							○		
102	1806	無名橋	西部建設事務所	広島県	熊野町	県道矢野安浦線	不明	3.9	10.2	道路橋	2016	II	2021	II	2025						●							○		
103	1809	国信橋	西部建設事務所	広島県	海田町	県道東海田広島線	1963	63	6.7	道路橋	2016	III	2021	III	2026						●							○		
104	1810	国信歩道橋	西部建設事務所	広島県	海田町	県道東海田広島線	1979	63.5	2.3	道路橋	2017	III	2022	III	2027								★				○			
105	1811	八幡橋	西部建設事務所	広島県	府中町	県道東海田広島線	1980	5.3	12.8	道路橋	2016	II	2021	II	2026						●							○		
106	1812	府中大橋	西部建設事務所	広島県	府中町	県道東海田広島線	1965	52.4	19.1	道路橋	2016	II	2021	II	2026													○		
107	1813	ゆや橋	西部建設事務所	広島県	府中町	県道府中海田線	1969	6.4	10.8	道路橋	2016	II	2021	II	2026						●							○		
108	1814	無名橋	西部建設事務所	広島県	海田町	県道府中海田線	1969	3	5	道路橋	2016	II	2021	II	2026						●							○		
109	1815	九十九橋	西部建設事務所	広島県	海田町	県道府中海田線	1950	70	4.6	道路橋	2017	III	2022	III	2027	2020	2026	192	全面塗替工, ひび割れ注入工	■							☆	○		
110	1816	九十九歩道橋	西部建設事務所	広島県	海田町	県道府中海田線	1975	70.6	2.4	道路橋	2017	II	2022	III	2027													○		
111	1817	埃宮橋	西部建設事務所	広島県	府中町	県道府中祇園線	1928	10.5	5.6	道路橋	2016	II	2021	II	2026						●							○		
112	1820	鶴江橋	西部建設事務所	広島県	府中町	県道府中祇園線	1986	26	15.8	道路橋	2017	I	2022	II	2027													○		
113	1823	海田川橋	西部建設事務所	広島県	海田町	県道広島海田線	1939	8.7	11.7	道路橋	2016	II	2021	II	2026						●							○		
114	1824	海田川歩道橋(上流側)	西部建設事務所	広島県	海田町	県道広島海田線	1968	10.2	1.8	道路橋	2016	III	2021	I	2026						★	●						○		
115	1826	明神橋	西部建設事務所	広島県	海田町	県道広島海田線	1926	79.7	12.5	道路橋	2016	III	2021	III	2026													○		
116	1827	明神歩道橋																												

No.	橋梁番号	施設名	事務所名	所在地		路線名	架設年度	橋長 (m)	幅員 (m)	橋梁種別	1巡目点検		最新の点検結果		次回点検	令和7年度から令和10年度までの修繕計画				点検・修繕計画									備考
											点検年度	健全度	点検年度	健全度						○：定期点検(予定), □:修繕着手(予定), ☆：修繕完了(予定) ●：定期点検済, ■:修繕着手済, ★：修繕完了済									
				実績	計画																								
				県名	市町名															2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
155	3007	佃橋	西部建設事務所呉支所	広島県	呉市	国道487号	1992	12.8	10.4	道路橋	2015	Ⅱ	2020	Ⅰ	2025					●					○				
156	3008	天神橋	西部建設事務所呉支所	広島県	呉市	国道487号	1989	26	10	道路橋	2015	Ⅱ	2020	Ⅱ	2025					●					○				
157	3010	弥生橋	西部建設事務所呉支所	広島県	呉市	国道487号	1942	13	10.3	道路橋	2015	Ⅱ	2020	Ⅰ	2025					●					○				
158	3011	無名橋	西部建設事務所呉支所	広島県	呉市	国道487号	不明	2	6.5	道路橋	2015	Ⅱ	2020	Ⅱ	2025					●					○				
159	3014	先奥下橋	西部建設事務所呉支所	広島県	呉市	国道487号	2008	4.1	9.8	道路橋	2015	Ⅱ	2020	Ⅱ	2025					●					○				
160	3015	先奥中橋	西部建設事務所呉支所	広島県	呉市	国道487号	2008	4.3	10	道路橋	2015	Ⅱ	2020	Ⅱ	2025					●					○				
161	3017	かぶらさき橋	西部建設事務所呉支所	広島県	呉市	国道487号	1948	3.5	9.6	道路橋	2015	Ⅱ	2020	Ⅱ	2025					●					○				
162	3018	釣土田下橋	西部建設事務所呉支所	広島県	呉市	国道487号	2010	4.2	7.9	道路橋	2015	Ⅲ	2020	Ⅱ	2025					●★					○				
163	3019	釣土田上橋	西部建設事務所呉支所	広島県	呉市	国道487号	1927	3.2	6	道路橋	2015	Ⅲ	2020	Ⅲ	2025	2023	2025	33	断面修復工, ひび割れ注入工	●			■		○☆				
164	3020	焼山金輪橋	西部建設事務所呉支所	広島県	呉市	県道呉平谷線	2000	31	28.4	道路橋	2015	Ⅱ	2020	Ⅱ	2025					●					○				
165	302031001	焼山新金輪橋	西部建設事務所呉支所	広島県	呉市	県道呉平谷線	1999	64	27.3	道路橋	2016	Ⅱ	2021	Ⅱ	2026						●					○			
166	302034001	安浦跨線橋	西部建設事務所呉支所	広島県	呉市	県道矢野安浦線	1969	176.9	10	道路橋	2014	Ⅲ	2024	Ⅱ	2029					★	★			●					
167	3025	一ノ瀬橋	西部建設事務所呉支所	広島県	呉市	県道呉平谷線	1957	4.6	7.3	道路橋	2015	Ⅱ	2020	Ⅱ	2025					●					○				
168	3026	真竈橋	西部建設事務所呉支所	広島県	呉市	県道呉平谷線	1955	4.9	10.4	道路橋	2015	Ⅰ	2020	Ⅱ	2025					●					○				
169	3027	無名橋	西部建設事務所呉支所	広島県	呉市	県道矢野安浦線	不明	3.7	7.9	道路橋	2015	Ⅰ	2020	Ⅰ	2025					●					○				
170	3028	下垣内橋	西部建設事務所呉支所	広島県	呉市	県道矢野安浦線	1983	16.3	8.7	道路橋	2015	Ⅱ	2020	Ⅱ	2025					●					○				
171	3029	新頓原橋	西部建設事務所呉支所	広島県	呉市	県道矢野安浦線	1962	18	14.5	道路橋	2014	Ⅰ	2024	Ⅱ	2029									●					
172	3031	御幸橋	西部建設事務所呉支所	広島県	呉市	県道矢野安浦線	1971	9.7	12.9	道路橋	2015	Ⅱ	2020	Ⅱ	2025					●					○				
173	303101	焼山橋	西部建設事務所呉支所	広島県	呉市	県道呉平谷線	1966	20	6	道路橋	2015	Ⅱ	2020	Ⅲ	2025	2023	2026	100	全面塗替工, ひび割れ注入工	●			■		○	☆			
174	303102	男滝橋	西部建設事務所呉支所	広島県	呉市	県道呉平谷線	1961	32	6.5	道路橋	2016	Ⅱ	2021	Ⅱ	2026						●					○			
175	303501	大白明橋	西部建設事務所呉支所	広島県	呉市	県道音戸倉橋線	1989	21.7	15.7	道路橋	2015	Ⅱ	2020	Ⅰ	2025					●					○				
176	303502	宇和木橋	西部建設事務所呉支所	広島県	呉市	県道音戸倉橋線	1991	80	10	道路橋	2016	Ⅰ	2021	Ⅰ	2026						●					○			
177	303503	尾立橋	西部建設事務所呉支所	広島県	呉市	県道音戸倉橋線	1957	10.2	6.2	道路橋	2016	Ⅲ	2021	Ⅲ	2026						●			★		○			
178	303504	堀切橋	西部建設事務所呉支所	広島県	呉市	県道音戸倉橋線	1966	30	6	道路橋	2016	Ⅲ	2022	Ⅲ	2027						■	●■	★				○		
179	3037	田原下橋	西部建設事務所呉支所	広島県	呉市	県道音戸倉橋線	2011	2.4	7.3	道路橋	2015	Ⅲ	2020	Ⅲ	2025	2023	2025	33	断面修復工	●					○☆				
180	3038	本浦橋	西部建設事務所呉支所	広島県	呉市	県道音戸倉橋線	1942	8	9.6	道路橋	2015	Ⅲ	2020	Ⅲ	2025					●			■	★		○			
181	3039	伊目木橋	西部建設事務所呉支所	広島県	呉市	県道音戸倉橋線	1947	5.5	6.3	道路橋	2015	Ⅱ	2020	Ⅰ	2025					●					○				
182	3040	胡橋	西部建設事務所呉支所	広島県	呉市	県道音戸倉橋線	1986	3.4	8	道路橋	2015	Ⅱ	2020	Ⅱ	2025					●					○				
183	3046	一の字橋	西部建設事務所呉支所	広島県	呉市	県道下瀬刈川尻線	1999	51	13.9	道路橋	2016	Ⅱ	2021	Ⅱ	2026						●						○		
184	3048	初神橋	西部建設事務所呉支所	広島県	呉市	県道上瀬刈循環線	1963	3	7	道路橋	2016	Ⅰ	2021	Ⅰ	2026						●					○			
185	3049	無名ボックス	西部建設事務所呉支所	広島県	呉市	県道上瀬刈循環線	1975	2.4	9.3	道路橋	2016	Ⅰ	2021	Ⅰ	2026						●					○			
186	3050	清水橋	西部建設事務所呉支所	広島県	呉市	県道上瀬刈循環線	1953	4.9	10	道路橋	2016	Ⅱ	2021	Ⅱ	2026						●					○			
187	3051	寿橋	西部建設事務所呉支所	広島県	呉市	県道上瀬刈島循環線	2001	11.5	9.4	道路橋	2017	Ⅰ	2022	Ⅰ	2027								●				○		
188	3053	恵比寿橋	西部建設事務所呉支所	広島県	呉市	県道豊島線	1948	6	6	道路橋	2016	Ⅰ	2021	Ⅰ	2026						●						○		
189	3054	東港橋	西部建設事務所呉支所	広島県	呉市	県道大崎下島循環線	1996	12.1	11.8	道路橋	2015	Ⅱ	2020	Ⅲ	2025	2021	2025	11	断面修復工	●	■				○☆				
190	3055	西港橋	西部建設事務所呉支所	広島県	呉市	県道大崎下島循環線	1994	15.1	12	道路橋	2015	Ⅱ	2020	Ⅱ	2025					●					○				
191	3056	立花橋	西部建設事務所呉支所	広島県	呉市	県道大崎下島循環線	不明	8.7	11.1	道路橋	2015	Ⅱ	2020	Ⅲ	2025</														

No.	橋梁番号	施設名	事務所名	所在地		路線名	架設年度	橋長 (m)	幅員 (m)	橋梁種別	1巡目点検		最新の点検結果		次回点検	令和7年度から令和10年度までの修繕計画				点検・修繕計画									備考
											点検年度	健全度	点検年度	健全度						○：定期点検(予定), □:修繕着手(予定), ☆：修繕完了(予定) ●：定期点検済, ■:修繕着手済, ★：修繕完了済計画									
				2020	2021										2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028								
232	3105	仁方駅前橋	西部建設事務所呉支所	広島県	呉市	県道広仁方停車場線	1959	4.4	9.1	道路橋	2016	Ⅲ	2021	Ⅲ	2026	2023	2025	33	断面修復工, ひび割れ注入工		●		■		☆	○			
233	3106	はしがわ橋	西部建設事務所呉支所	広島県	呉市	県道津江郷原線	1990	4	8	道路橋	2017	Ⅰ	2022	Ⅰ	2027							●					○		
234	3107	藤木橋	西部建設事務所呉支所	広島県	呉市	県道内海三津線	1972	16.2	14.2	道路橋	2017	Ⅱ	2022	Ⅱ	2027							●					○		
235	3108	上女子畑橋	西部建設事務所呉支所	広島県	呉市	県道内海三津線	1977	9.1	7.3	道路橋	2017	Ⅰ	2022	Ⅰ	2027							●					○		
236	3109	水落橋	西部建設事務所呉支所	広島県	呉市	県道川尻安浦線	1969	6.1	8.1	道路橋	2014	Ⅲ	2024	Ⅰ	2029								●						
237	3110	クタタ橋	西部建設事務所呉支所	広島県	呉市	県道川尻安浦線	1965	2.3	7.2	道路橋	2017	Ⅱ	2022	Ⅱ	2027								●				○		
238	3111	無名橋	西部建設事務所呉支所	広島県	呉市	県道川尻安浦線	1930	2.3	7.5	道路橋	2016	Ⅱ	2021	Ⅱ	2026						●					○			
239	3112	日之浦橋	西部建設事務所呉支所	広島県	呉市	県道川尻安浦線	1984	13	3.6	道路橋	2017	Ⅰ	2022	Ⅰ	2027							●					○		
240	3113	水尻橋	西部建設事務所呉支所	広島県	呉市	県道川尻安浦線	1984	8.6	10.4	道路橋	2017	Ⅰ	2022	Ⅰ	2027							●					○		
241	3114	無名橋 (420)	西部建設事務所呉支所	広島県	呉市	県道川尻安浦線	1984	2	16	道路橋	2017	Ⅰ	2022	Ⅰ	2027								●				○		
242	3115	安浦大橋	西部建設事務所呉支所	広島県	呉市	県道川尻安浦線	1961	40.5	5.2	道路橋	2016	Ⅰ	2021	Ⅱ	2026						●					○			
243	3116	旭橋	西部建設事務所呉支所	広島県	呉市	県道倉橋大向約土田港線	1963	2.4	5.5	道路橋	2016	Ⅰ	2021	Ⅰ	2026							●					○		
244	3117	豊浜橋	西部建設事務所呉支所	広島県	呉市	県道倉橋大向約土田港線	1963	2.1	5.3	道路橋	2016	Ⅰ	2021	Ⅰ	2026							●					○		
245	3118	胡子橋	西部建設事務所呉支所	広島県	呉市	県道倉橋大向約土田港線	1961	2.1	4.6	道路橋	2016	Ⅰ	2021	Ⅰ	2026							●					○		
246	3119	住吉橋	西部建設事務所呉支所	広島県	呉市	県道倉橋大向約土田港線	1958	5.3	5	道路橋	2016	Ⅱ	2021	Ⅱ	2026							●					○		
247	3120	とまり橋	西部建設事務所呉支所	広島県	呉市	県道倉橋大向約土田港線	1934	2.3	4.5	道路橋	2016	Ⅱ	2021	Ⅱ	2026							●					○		
248	3121	砂浜橋	西部建設事務所呉支所	広島県	呉市	県道倉橋大向約土田港線	1934	4	7.4	道路橋	2014	Ⅲ	2024	Ⅱ	2029									●					
249	3122	笠松橋	西部建設事務所呉支所	広島県	呉市	県道倉橋大向約土田港線	1959	4	5.5	道路橋	2014	Ⅲ	2024	Ⅱ	2029									●					
250	3123	重生橋	西部建設事務所呉支所	広島県	呉市	県道倉橋大向約土田港線	1959	3	14.9	道路橋	2016	Ⅰ	2021	Ⅰ	2026							●					○		
251	3124	重極橋	西部建設事務所呉支所	広島県	呉市	県道倉橋大向約土田港線	1963	3	5.1	道路橋	2016	Ⅲ	2021	Ⅲ	2026	2025	2025	33	断面修復工, ひび割れ注入工		●				□☆	○			
252	3125	鳴滝橋	西部建設事務所呉支所	広島県	呉市	県道倉橋大向約土田港線	1960	3.5	8	道路橋	2016	Ⅰ	2021	Ⅰ	2026							●					○		
253	3126	境橋	西部建設事務所呉支所	広島県	呉市	県道中大迫清田線	1966	7	4.5	道路橋	2017	Ⅲ	2022	Ⅲ	2027	2023	2025	42	断面修復工, ひび割れ注入工			●	■		☆		○		
254	3127	境橋歩道橋	西部建設事務所呉支所	広島県	呉市	県道中大迫清田線	不明	5	1.5	道路橋	2017	Ⅱ	2022	Ⅱ	2027							●					○		
255	3128	大迫橋	西部建設事務所呉支所	広島県	呉市	県道中大迫清田線	1971	5	4.1	道路橋	2017	Ⅱ	2022	Ⅱ	2027							●					○		
256	3129	高井橋	西部建設事務所呉支所	広島県	呉市	県道中大迫清田線	1965	3	6.4	道路橋	2017	Ⅲ	2022	Ⅲ	2027	2023	2025	33	断面修復工, ひび割れ注入工			●	■		☆		○		
257	3130	新開橋	西部建設事務所呉支所	広島県	呉市	県道中大迫清田線	1961	4.8	7.2	道路橋	2016	Ⅲ	2021	Ⅲ	2026	2023	2025	33	断面修復工, ひび割れ注入工		●		■		☆	○			
258	3131	納橋	西部建設事務所呉支所	広島県	呉市	県道中大迫清田線	1962	2.6	4.8	道路橋	2016	Ⅱ	2021	Ⅱ	2026							●					○		
259	3132	無名橋	西部建設事務所呉支所	広島県	呉市	県道中大迫清田線	1964	2.5	6.2	道路橋	2016	Ⅱ	2021	Ⅱ	2026							●					○		
260	3133	長谷橋	西部建設事務所呉支所	広島県	呉市	県道中大迫清田線	2006	14.8	8.7	道路橋	2017	Ⅱ	2022	Ⅱ	2027								●				○		
261	3134	長谷橋歩道橋	西部建設事務所呉支所	広島県	呉市	県道中大迫清田線	2006	14.3	1.5	道路橋	2017	Ⅰ	2022	Ⅰ	2027								●				○		
262	3135	ハセ橋	西部建設事務所呉支所	広島県	呉市	県道中大迫清田線	1964	4	4	道路橋	2016	Ⅰ	2021	Ⅰ	2026						●					○			
263	3137	タマコ橋	西部建設事務所呉支所	広島県	呉市	県道中大迫清田線	1995	8.9	4	道路橋	2017	Ⅱ	2022	Ⅱ	2027								●				○		
264	3138	大江橋	西部建設事務所呉支所	広島県	呉市	県道中大迫清田線	1966	5	4	道路橋	2017	Ⅱ	2022	Ⅱ	2027								●				○		
265	327801	椿原橋	西部建設事務所呉支所	広島県	呉市	県道焼山吉浦線	1960	7.1	6.6	道路橋	2016	Ⅱ	2021	Ⅱ	2026						●					○			
266	327802	五丁目橋	西部建設事務所呉支所	広島県	呉市	県道焼山吉浦線	1952	7.2	6.4	道路橋	2016	Ⅰ	2021	Ⅱ	2026						●					○			
267	327803	石林橋	西部建設事務所呉支所	広島県	呉市	県道焼山吉浦線	1952	6.1	5	道路橋	2016	Ⅰ	2021	Ⅰ	2026						●					○			
268	327804	東清水橋	西部建設事務所呉支所	広島県	呉市	県道焼山吉浦線	1961	9.5	4.9	道路橋	2016	Ⅰ	2021	Ⅱ	2026							●				○			</

No.	橋梁番号	施設名	事務所名	所在地		路線名	架設年度	橋長 (m)	幅員 (m)	橋梁種別	1巡目点検		最新の点検結果		次回点検	令和7年度から令和10年度までの修繕計画				点検・修繕計画 ○：定期点検(予定), □:修繕着手(予定), ☆：修繕完了(予定) ●：定期点検済, ■:修繕着手済, ★：修繕完了済								備考	
				県名	市町名						点検年度	健全度	点検年度	健全度		点検年度	修繕着手年度	修繕完了年度	概算工事費 (100万円)	主な修繕内容	実績 計画								
																					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2027
309	303427003	無名ボックス	西部建設事務所呉支所	広島県	呉市	県道矢野安浦線	不明	2.5	14	道路橋	2015	Ⅱ	2020	Ⅲ	2025					●			★	■	○				
310	303527001	無名ボックス	西部建設事務所呉支所	広島県	呉市	県道音戸倉橋線	不明	2.5	37.7	道路橋	2015	Ⅱ	2020	Ⅱ	2025					●					○				
311	303527004	無名ボックス	西部建設事務所呉支所	広島県	呉市	県道音戸倉橋線	1994	3	18	道路橋	2015	Ⅱ	2020	Ⅰ	2025					●					○				
312	303527005	無名ボックス	西部建設事務所呉支所	広島県	呉市	県道音戸倉橋線	1994	2.5	11.1	道路橋	2015	Ⅲ	2020	Ⅲ	2025					●		■	★		○				
313	303527006	無名橋	西部建設事務所呉支所	広島県	呉市	県道音戸倉橋線	1994	2	5.9	道路橋	2015	Ⅲ	2020	Ⅱ	2025					●★					○				
314	327827001	無名橋	西部建設事務所呉支所	広島県	呉市	県道焼山古浦線	1991	2.1	12.4	道路橋	2015	Ⅲ	2020	Ⅲ	2025					●			★		○				
315	328627001	無名橋	西部建設事務所呉支所	広島県	呉市	県道中大迫清田線	1982	2.5	5.9	道路橋	2015	Ⅰ	2020	Ⅰ	2025					●					○				
316	335427001	無名ボックス	西部建設事務所呉支所	広島県	呉市	県道豊島線	2005	2.3	20.5	道路橋	2015	Ⅱ	2020	Ⅲ	2025					●					■★	○			
317	335527001	無名橋	西部建設事務所呉支所	広島県	呉市	県道大崎下島橋線	不明	3.4	30.2	道路橋	2015	Ⅰ	2020	Ⅰ	2025					●					○				
318	335627002	無名ボックス	西部建設事務所呉支所	広島県	呉市	県道豊浜蒲刈線	2004	3	36.8	道路橋	2015	Ⅱ	2020	Ⅲ	2025					●					■★	○			
319	346527001	無名橋	西部建設事務所呉支所	広島県	呉市	県道川尻安浦線	不明	3.1	3.5	道路橋	2015	Ⅱ	2020	Ⅱ	2025					●					○				
320	3136	水口前橋	西部建設事務所呉支所	広島県	呉市	中大迫清田線	1964	3	5	道路橋	2016	Ⅰ	2021	Ⅰ	2026						●					○			
321	348726002	九丁目橋	西部建設事務所呉支所	広島県	呉市	国道4 8 7号	不明	2.3	11.4	道路橋	2014	Ⅲ	2024	Ⅱ	2029	2025	2025	14	断面修復工, ひび割れ注入工			●							
322	303526004	蛸橋	西部建設事務所呉支所	広島県	呉市	県道音戸倉橋線	不明	2.2	11.6	道路橋	2014	Ⅱ	2024	Ⅱ	2029										●	□☆			
323	328326001	無名ボックス	西部建設事務所呉支所	広島県	呉市	県道豊島線	不明	3	12.4	道路橋	2014	Ⅲ	2024	Ⅱ	2029										●				
324	328626003	大網代橋	西部建設事務所呉支所	広島県	呉市	県道中大迫清田線	不明	4.6	3.8	道路橋	2014	Ⅱ	2024	Ⅰ	2029										●				
325	348726014	有清上橋	西部建設事務所呉支所	広島県	呉市	国道4 8 7号	不明	4.9	9.2	道路橋	2014	Ⅲ	2024	Ⅱ	2029										●				
326	335626001	無名ボックス	西部建設事務所呉支所	広島県	呉市	県道豊浜蒲刈線	2004	2.5	10.7	道路橋	2014	Ⅰ	2024	Ⅰ	2029										●				
327	303526005	土井橋	西部建設事務所呉支所	広島県	呉市	県道音戸倉橋線	1995	2.4	10.5	道路橋	2015	Ⅲ	2020	Ⅰ	2025					●					○				
328	3080	大入橋	西部建設事務所呉支所	広島県	呉市	県道高梁の原	1958	5.4	6.3	道路橋	2016	Ⅰ	2024	Ⅰ	2029										●				
329	327926006	無名橋	西部建設事務所呉支所	広島県	呉市	県道高梁川分岐車道橋	不明	3	8.5	道路橋	2014	Ⅲ	2024	Ⅱ	2029								★		●				
330	324826003	無名ボックス	西部建設事務所呉支所	広島県	呉市	県道高梁川分岐車道橋	1966	3	7.6	道路橋	2014	Ⅲ	2024	Ⅰ	2029	2025	2025	20	断面修復工, ひび割れ注入工		■	★		●	□☆				
331	3601	中新開横断歩道橋	西部建設事務所呉支所	広島県	呉市	国道3 7 5号	1972	20	1.5	横断歩道橋	2014	Ⅲ	2019	Ⅲ	—	2023	2025	50	撤去					■	●	☆			
332	3602	総監部前歩道橋	西部建設事務所呉支所	広島県	呉市	国道4 8 7号	1978	28.2	1.5	横断歩道橋	2014	Ⅲ	2024	Ⅰ	2029					★	★				●		☆		
333	3603	いせな歩道橋	西部建設事務所呉支所	広島県	呉市	国道4 8 7号	1984	31.3	1.5	横断歩道橋	2014	Ⅱ	2024	Ⅱ	2029										●				
334	3604	船見横断歩道橋	西部建設事務所呉支所	広島県	呉市	国道4 8 7号	1970	15	1.7	横断歩道橋	2014	Ⅰ	2024	Ⅰ	2029										●				
335	3605	早瀬歩道橋	西部建設事務所呉支所	広島県	呉市	国道4 8 7号	1975	14.6	1.5	横断歩道橋	2014	Ⅰ	2024	Ⅱ	2029										●				
336	3606	上山手横断歩道橋	西部建設事務所呉支所	広島県	呉市	県道呉平谷線	1987	56.8	1.5	横断歩道橋	2014	Ⅰ	2024	Ⅲ	2029	2022	2026	40	部分取替工				■		●		☆		
337	3607	此原歩道橋	西部建設事務所呉支所	広島県	呉市	県道呉平谷線	2007	31.7	1.5	横断歩道橋	2014	Ⅰ	2024	Ⅱ	2029										●				
338	3608	吾妻横断歩道橋	西部建設事務所呉支所	広島県	呉市	県道瀬野呉線	1968	20.3	1.5	横断歩道橋	2014	Ⅲ	2020	Ⅱ	2025					●					○				
339	3609	本通七丁目陸橋	西部建設事務所呉支所	広島県	呉市	県道瀬野呉線	1970	26.5	1.5	横断歩道橋	2014	Ⅰ	2024	Ⅱ	2029										●				
340	366050601	紅橋	西部建設事務所呉支所	広島県	呉市	県道呉環状線	2022	17	10.2	道路橋	—	—	2023	Ⅰ	2028								●						
341	366050602	新野登呂橋	西部建設事務所呉支所	広島県	呉市	県道呉環状線	2022	7.5	10.2	道路橋	—	—	2023	Ⅰ	2028								●						
342	366050603	第一深山の滝橋	西部建設事務所呉支所	広島県	呉市	呉環状線	2022	7.7	8.2	道路橋	—	—	—	—	2026											○			
343	366050604	第二深山の滝橋	西部建設事務所呉支所	広島県	呉市	呉環状線	2022	7.2	10.7	道路橋	—	—	—	—	2026											○			
344	2001	桂橋	西部建設事務所廿日市支所	広島県	廿日市市	国道2号	1931	5.7	11.8	道路橋	2014	Ⅲ	2024	Ⅰ	2029										●	</			

No.	橋梁番号	施設名	事務所名	所在地		路線名	架設年度	橋長 (m)	幅員 (m)	橋梁種別	1巡目点検		最新の点検結果		次回点検	令和7年度から令和10年度までの修繕計画				点検・修繕計画 ○：定期点検(予定), □:修繕着手(予定), ☆：修繕完了(予定) ●：定期点検済, ■:修繕着手済, ★：修繕完了済計画								備考				
				県名	市町名						点検年度	健全度	点検年度	健全度		点検年度	修繕着手年度	修繕完了年度	概算工事費 (100万円)	主な修繕内容	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2027	2028		
386	2049	本郷橋	西部建設事務所廿日市支所	広島県	廿日市市	国道186号	1990	20.1	11.1	道路橋	2015	Ⅱ	2020	Ⅰ	2025							●					○					
387	2051	冠橋	西部建設事務所廿日市支所	広島県	大竹市	国道186号	1960	40.5	6.8	道路橋	2015	Ⅱ	2020	Ⅱ	2025							●					○					
388	2052	平野橋	西部建設事務所廿日市支所	広島県	大竹市	国道186号	1973	44.4	8.8	道路橋	2016	Ⅰ	2021	Ⅱ	2026								●							○		
389	2053	魚隈橋	西部建設事務所廿日市支所	広島県	大竹市	国道186号	1958	10	6.2	道路橋	2015	Ⅱ	2020	Ⅱ	2025							●						○				
390	2054	白滝橋	西部建設事務所廿日市支所	広島県	大竹市	国道186号	1985	90	10.2	道路橋	2015	Ⅱ	2020	Ⅱ	2025							●						○				
391	2055	新高鉢橋	西部建設事務所廿日市支所	広島県	大竹市	国道186号	1984	39	10.2	道路橋	2015	Ⅱ	2020	Ⅱ	2025							●						○				
392	2056	弥栄3号橋	西部建設事務所廿日市支所	広島県	大竹市	国道186号	1983	30	10.2	道路橋	2015	Ⅱ	2020	Ⅱ	2025							●						○				
393	2057	弥栄2号橋	西部建設事務所廿日市支所	広島県	大竹市	国道186号	1983	39	10.2	道路橋	2015	Ⅱ	2020	Ⅱ	2025							●						○				
394	2058	弥栄1号橋	西部建設事務所廿日市支所	広島県	大竹市	国道186号	1983	36.8	10.2	道路橋	2015	Ⅱ	2020	Ⅱ	2025							●						○				
395	2059	飯谷7号橋	西部建設事務所廿日市支所	広島県	大竹市	国道186号	1980	83	10.2	道路橋	2015	Ⅱ	2020	Ⅱ	2025							●						○				
396	2060	飯谷6号橋	西部建設事務所廿日市支所	広島県	大竹市	国道186号	1981	60	9.3	道路橋	2015	Ⅱ	2023	Ⅱ	2028													○				
397	2061	飯谷5号橋	西部建設事務所廿日市支所	広島県	大竹市	国道186号	1981	82	10.2	道路橋	2015	Ⅱ	2020	Ⅲ	2025							●						○				
398	2062	飯谷4号橋	西部建設事務所廿日市支所	広島県	大竹市	国道186号	1981	88	9.3	道路橋	2015	Ⅱ	2023	Ⅲ	2028															○		
399	2063	飯谷3号橋	西部建設事務所廿日市支所	広島県	大竹市	国道186号	1981	88	9.3	道路橋	2015	Ⅲ	2023	Ⅱ	2028									■		●	★				○	
400	2064	飯谷1号橋	西部建設事務所廿日市支所	広島県	大竹市	国道186号	1981	37.5	10.2	道路橋	2015	Ⅱ	2020	Ⅱ	2025							●						○				
401	2065	滝の后橋	西部建設事務所廿日市支所	広島県	大竹市	国道186号	1980	25	10.2	道路橋	2015	Ⅱ	2020	Ⅱ	2025							●						○				
402	2066	八丁2号橋	西部建設事務所廿日市支所	広島県	大竹市	国道186号	1980	32	10.2	道路橋	2015	Ⅱ	2020	Ⅱ	2025							●						○				
403	2067	安条2号橋	西部建設事務所廿日市支所	広島県	大竹市	国道186号	1979	67	10.3	道路橋	2016	Ⅱ	2021	Ⅱ	2026													○				
404	2069	比作橋	西部建設事務所廿日市支所	広島県	大竹市	国道186号	1965	6.3	8.1	道路橋	2016	Ⅱ	2021	Ⅱ	2026							●							○			
405	2071	無名(ボックス)	西部建設事務所廿日市支所	広島県	大竹市	県道岩国大竹線	1978	2.5	7	道路橋	2016	Ⅱ	2021	Ⅱ	2026							●							○			
406	2072	無名側道橋	西部建設事務所廿日市支所	広島県	大竹市	県道岩国大竹線	不明	3.7	0.9	道路橋	2016	Ⅰ	2021	Ⅰ	2026							●							○			
407	2077	ボックス	西部建設事務所廿日市支所	広島県	大竹市	国道186号	不明	2.3	39.3	道路橋	2016	Ⅰ	2021	Ⅰ	2026							●							○			
408	2208	無名橋	西部建設事務所廿日市支所	広島県	廿日市市	国道488号	不明	2.4	2.5	道路橋	2016	Ⅲ	2021	Ⅲ	2026	2022	2026					●		■					○	☆		
409	2321	中山橋側道橋	西部建設事務所廿日市支所	広島県	廿日市市	県道廿日市佐伯線	1927	4.2	2	道路橋	2016	Ⅰ	2021	Ⅰ	2026							●							○			
410	2081	新神路橋	西部建設事務所廿日市支所	広島県	廿日市市	国道433号	1994	20.2	22.8	道路橋	2016	Ⅰ	2021	Ⅱ	2026							●							○			
411	2083	猿渡橋	西部建設事務所廿日市支所	広島県	廿日市市	国道433号	1969	5	6	道路橋	2016	Ⅱ	2021	Ⅱ	2026							●							○			
412	2084	峠上橋	西部建設事務所廿日市支所	広島県	廿日市市	国道433号	1957	6.5	5	道路橋	2016	Ⅰ	2021	Ⅰ	2026							●							○			
413	2090	半明原橋	西部建設事務所廿日市支所	広島県	廿日市市	国道433号	1994	12.2	11.5	道路橋	2016	Ⅰ	2021	Ⅰ	2026							●							○			
414	2091	長野陸橋	西部建設事務所廿日市支所	広島県	廿日市市	国道433号	1989	30	10.7	道路橋	2016	Ⅰ	2021	Ⅱ	2026							●							○			
415	2092	無名橋	西部建設事務所廿日市支所	広島県	廿日市市	国道433号	1990	6.6	8.2	道路橋	2016	Ⅲ	2021	Ⅱ	2026							●							○			
416	2093	宮内橋	西部建設事務所廿日市支所	広島県	廿日市市	県道廿日市佐伯線	1969	27.8	11.2	道路橋	2016	Ⅰ	2021	Ⅱ	2026							●							○			
417	2094	畑口橋	西部建設事務所廿日市支所	広島県	廿日市市	県道廿日市佐伯線	1970	15.3	11.6	道路橋	2016	Ⅰ	2021	Ⅰ	2026							●							○			
418	2095	友和橋	西部建設事務所廿日市支所	広島県	廿日市市	県道廿日市佐伯線	1962	28	6.7	道路橋	2016	Ⅱ	2021	Ⅱ	2026							●							○			
419	2096	友和歩道橋	西部建設事務所廿日市支所	広島県	廿日市市	県道廿日市佐伯線	1979	28.4	2.8	道路橋	2016	Ⅰ	2021	Ⅱ	2026							●							○			
420	2097	不明橋	西部建設事務所廿日市支所	広島県	廿日市市	県道廿日市佐伯線	不明	2.8	8.2	道路橋	2016	Ⅱ	2021	Ⅱ	2026							●							○			

No.	橋梁番号	施設名	事務所名	所在地		路線名	架設年度	橋長 (m)	幅員 (m)	橋梁種別	1巡目点検		最新の点検結果		次回点検	令和7年度から令和10年度までの修繕計画				点検・修繕計画 ○：定期点検(予定), □:修繕着手(予定), ☆：修繕完了(予定) ●：定期点検済, ■:修繕着手済, ★：修繕完了済計画								備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
				県名	市町名						点検年度	健全度	点検年度	健全度		点検年度	修繕着手年度	修繕完了年度	概算工事費 (100万円)	主な修繕内容	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2027	2028																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
463	2149	峰高陸橋	西部建設事務所廿日市支所	広島県	廿日市市	県道廿日市港線	1973	41.6	4.4	道路橋	2017	Ⅱ	2022	Ⅲ	2027																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

No.	橋梁番号	施設名	事務所名	所在地		路線名	架設年度	橋長 (m)	幅員 (m)	橋梁種別	1巡目点検		最新の点検結果		次回点検	令和7年度から令和10年度までの修繕計画				点検・修繕計画 ○：定期点検(予定), □:修繕着手(予定), ☆：修繕完了(予定) ●：定期点検済, ■:修繕着手済, ★：修繕完了済計画									備考	
				県名	市町名						点検年度	健全度	点検年度	健全度		点検年度	修繕着手年度	修繕完了年度	概算工事費 (100万円)	主な修繕内容	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		2028
540	2235	無名橋	西部建設事務所廿日市支所	広島県	大竹市	県道栗谷大野線	不明	2.6	7	道路橋	2017	I	2022	I	2027									●				○		
541	2236	堂曽橋	西部建設事務所廿日市支所	広島県	大竹市	県道栗谷大野線	1960	3	7.2	道路橋	2017	I	2022	II	2027									●				○		
542	2237	嵐谷橋	西部建設事務所廿日市支所	広島県	廿日市市	県道栗谷大野線	1953	5	4.5	道路橋	2015	III	2020	II	2025				●■★				○							
543	2239	谷和橋	西部建設事務所廿日市支所	広島県	廿日市市	県道栗谷大野線	1932	5.4	4.9	道路橋	2017	III	2022	III	2027					■	■●	★					○			
544	2240	無名橋	西部建設事務所廿日市支所	広島県	廿日市市	県道栗谷大野線	不明	3.5	8.5	道路橋	2018	II	2023	II	2028									●					○	
545	2242	無名橋	西部建設事務所廿日市支所	広島県	廿日市市	県道栗谷大野線	1965	3.2	4.5	道路橋	2018	II	2023	II	2028									●					○	
546	2243	山田橋	西部建設事務所廿日市支所	広島県	廿日市市	県道栗谷大野線	1950	2.4	4.6	道路橋	2017	II	2022	II	2027									●				○		
547	2244	寄瀬橋	西部建設事務所廿日市支所	広島県	廿日市市	県道栗谷大野線	1952	8.4	6.9	道路橋	2017	III	2022	I	2027				★	■★	●							○		
548	2245	無名橋	西部建設事務所廿日市支所	広島県	廿日市市	県道栗谷大野線	1965	5.4	5.3	道路橋	2018	III	2023	I	2028					■	■	★●							○	
549	2246	無名橋	西部建設事務所廿日市支所	広島県	廿日市市	県道栗谷大野線	不明	2.5	9.2	道路橋	2018	II	2023	II	2028									●					○	
550	2248	無名橋	西部建設事務所廿日市支所	広島県	廿日市市	県道栗谷大野線	不明	3	5.3	道路橋	2018	II	2023	II	2028									●					○	
551	2249	無名橋	西部建設事務所廿日市支所	広島県	廿日市市	県道栗谷大野線	不明	3.4	8.2	道路橋	2018	II	2023	II	2028									●					○	
552	2250	万作橋	西部建設事務所廿日市支所	広島県	廿日市市	県道栗谷大野線	1954	10.6	6.8	道路橋	2017	III	2022	I	2027				★	■★	●							○		
553	2251	無名橋	西部建設事務所廿日市支所	広島県	廿日市市	県道栗谷大野線	不明	3.8	4.3	道路橋	2018	I	2023	I	2028									●					○	
554	2258	無名橋	西部建設事務所廿日市支所	広島県	廿日市市	県道栗谷大野線	不明	2.9	22.5	道路橋	2018	I	2023	I	2028									●					○	
555	2259	高馬橋	西部建設事務所廿日市支所	広島県	廿日市市	県道栗谷大野線	1958	3	4.8	道路橋	2017	II	2022	III	2027									●					○	
556	2260	峠下橋	西部建設事務所廿日市支所	広島県	廿日市市	県道栗谷大野線	1963	5.2	5	道路橋	2017	III	2022	III	2027					■	●	★						○		
557	2261	滝山橋	西部建設事務所廿日市支所	広島県	廿日市市	県道栗谷大野線	1960	3.5	5.3	道路橋	2017	I	2022	II	2027									●					○	
558	2262	搭ノ原橋	西部建設事務所廿日市支所	広島県	廿日市市	県道栗谷大野線	1963	3.2	5.6	道路橋	2017	II	2022	II	2027									●					○	
559	2263	市ノ瀬橋	西部建設事務所廿日市支所	広島県	廿日市市	県道栗谷大野線	1965	2.8	4.5	道路橋	2018	III	2023	III	2028									●	★				○	
560	2264	滝ノ岡橋	西部建設事務所廿日市支所	広島県	廿日市市	県道栗谷大野線	1957	3.7	4.9	道路橋	2017	II	2022	II	2027									●					○	
561	2267	大虫橋	西部建設事務所廿日市支所	広島県	廿日市市	県道本多田佐伯線	1964	12.7	4.8	道路橋	2017	II	2022	II	2027									●					○	
562	2268	川口橋	西部建設事務所廿日市支所	広島県	廿日市市	県道本多田佐伯線	1961	4	4.6	道路橋	2017	II	2022	III	2027									●					○	
563	2269	大渡橋	西部建設事務所廿日市支所	広島県	廿日市市	県道本多田佐伯線	1987	21.3	8.7	道路橋	2018	II	2023	II	2028									●					○	
564	2270	笹谷橋	西部建設事務所廿日市支所	広島県	廿日市市	県道本多田佐伯線	1928	7.8	9.2	道路橋	2017	I	2022	I	2027									●					○	
565	2271	虫道橋	西部建設事務所廿日市支所	広島県	廿日市市	県道本多田佐伯線	1950	3	4	道路橋	2016	I	2021	I	2026					●								○		
566	2272	虫道1号橋	西部建設事務所廿日市支所	広島県	廿日市市	県道本多田佐伯線	1961	3.2	3.3	道路橋	2016	II	2021	II	2026					●								○		
567	2273	虫道2号橋	西部建設事務所廿日市支所	広島県	廿日市市	県道本多田佐伯線	1961	3	3.5	道路橋	2016	I	2021	II	2026					●								○		
568	2274	助峠橋	西部建設事務所廿日市支所	広島県	廿日市市	県道本多田佐伯線	1952	3	3.1	道路橋	2016	II	2021	III	2026					●			■★					○		
569	2275	弘法谷橋	西部建設事務所廿日市支所	広島県	廿日市市	県道本多田佐伯線	1952	9.7	5	道路橋	2017	II	2022	II	2027									●					○	
570	2277	白ノ屋橋	西部建設事務所廿日市支所	広島県	廿日市市	県道本多田佐伯線	1931	6.4	6.1	道路橋	2017	II	2022	II	2027									●					○	
571	2278	樽川橋	西部建設事務所廿日市支所	広島県	廿日市市	県道本多田佐伯線	1989	21.9	11.1	道路橋	2018	I	2023	I	2028									●					○	
572	2279	掛橋	西部建設事務所廿日市支所	広島県	廿日市市	県道本多田佐伯線	1990	68.8	10.3	道路橋	2018	II	2023	II	2028										●				○	
573	2280	河原橋	西部建設事務所廿日市支所	広島県	廿日市市	県道本多田佐伯線	1961	9.7	11.5	道路橋	2017	II	2022	II	2027									●					○	
574	2281	戸屋原橋	西部建設事務所廿日市支所	広島県	廿日市市	県道本多田佐伯線	1968	3.2	10	道路橋	2018	II	2023	II	2028									●					○	
575	2282	桑島橋	西部建設事務所廿日市支所	広島県	廿日市市	県道本多田佐伯線	1927	3.6	6.6	道路橋	2017	II	2022	II	2027									●					○	
576	2283	松山橋	西部建設事務所廿日市支所	広島県	廿日市市	県道本多田佐伯線	不明	3.1	9.5	道路橋	2018	III	2023	II	2028									■	★●				○	
577	2284	無名橋02	西部建設事務所廿日市支所	広島県	廿日市市	県道栗谷河津原線	不明	3.5	3	道路橋	2014	III	2024	I	2029										●					
578	2285	音丸下橋	西部建設事務所廿日市支所	広島県	廿日市市	県道栗谷河津原線	1953	3.3	3.7	道路橋	2014	III	2024	I	2029								■			●				
579	2286	無名橋03	西部建設事務所廿日市支所	広島県	廿日市市	県道栗谷河津原線	不明	3	4	道路橋	2014	II	2024	I	2029										■★	●				

No.	橋梁番号	施設名	事務所名	所在地		路線名	架設年度	橋長(m)	幅員(m)	橋梁種別	1巡目点検		最新の点検結果		次回点検	令和7年度から令和10年度までの修繕計画				点検・修繕計画 ○：定期点検(予定), □:修繕着手(予定), ☆：修繕完了(予定) ●：定期点検済, ■:修繕着手済, ★：修繕完了済計画								備考					
				点検年度	健全度						点検年度	健全度	点検年度	修繕着手年度		修繕完了年度	概算工事費(100万円)	主な修繕内容	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028						
															県名														市町名				
580	2287	無名橋04	西部建設事務所廿日市支所	広島県	廿日市市	県道栗谷河津原線	不明	2.3	8.5	道路橋	2014	Ⅱ	2024	Ⅰ	2029									●									
581	2288	出合橋	西部建設事務所廿日市支所	広島県	廿日市市	県道白砂玖島線	2002	8	9.5	道路橋	2014	Ⅰ	2024	Ⅱ	2029									●									
582	2289	昭六橋	西部建設事務所廿日市支所	広島県	廿日市市	県道白砂玖島線	1997	9.5	10.6	道路橋	2014	Ⅱ	2024	Ⅰ	2029									●									
583	2290	埃口橋	西部建設事務所廿日市支所	広島県	廿日市市	県道所山潮原線	1999	21.2	4	道路橋	2014	Ⅲ	2024	Ⅱ	2029									●									
584	2291	蛇ヶ谷橋	西部建設事務所廿日市支所	広島県	廿日市市	県道所山潮原線	1999	4.5	4.7	道路橋	2014	Ⅱ	2024	Ⅱ	2029									●									
585	2292	虫渡橋	西部建設事務所廿日市支所	広島県	廿日市市	県道所山潮原線	1999	20	4	道路橋	2014	Ⅲ	2024	Ⅱ	2029									●									
586	2293	大黒橋	西部建設事務所廿日市支所	広島県	廿日市市	県道所山潮原線	1999	12.6	3.7	道路橋	2014	Ⅰ	2024	Ⅰ	2029									●									
587	2294	焼山橋	西部建設事務所廿日市支所	広島県	廿日市市	県道所山潮原線	1999	13.7	3.7	道路橋	2014	Ⅰ	2024	Ⅰ	2029									●									
588	2295	無名橋01	西部建設事務所廿日市支所	広島県	廿日市市	県道所山潮原線	1999	3.2	8.1	道路橋	2014	Ⅱ	2024	Ⅰ	2029									●									
589	2296	床版橋01	西部建設事務所廿日市支所	広島県	廿日市市	県道所山潮原線	1999	2.5	4.1	道路橋	2014	Ⅱ	2024	Ⅱ	2029									●									
590	2297	床版橋02	西部建設事務所廿日市支所	広島県	廿日市市	県道所山潮原線	1999	2.7	4.3	道路橋	2014	Ⅱ	2024	Ⅱ	2029									●									
591	2298	一の渡出橋	西部建設事務所廿日市支所	広島県	廿日市市	県道所山潮原線	1999	8.1	3.6	道路橋	2014	Ⅲ	2024	Ⅱ	2029									●									
592	2299	鉦橋	西部建設事務所廿日市支所	広島県	廿日市市	県道所山潮原線	2002	8.6	3.6	道路橋	2014	Ⅲ	2024	Ⅱ	2029								■	★	●								
593	2300	多々場橋	西部建設事務所廿日市支所	広島県	廿日市市	県道所山潮原線	2002	6.5	3.8	道路橋	2014	Ⅰ	2024	Ⅱ	2029									●									
594	2301	横打橋	西部建設事務所廿日市支所	広島県	廿日市市	県道所山潮原線	2002	6.3	3.8	道路橋	2014	Ⅱ	2024	Ⅰ	2029									●									
595	2302	無名橋02	西部建設事務所廿日市支所	広島県	廿日市市	県道所山潮原線	2002	3.5	18	道路橋	2014	Ⅰ	2024	Ⅰ	2029									●									
596	2303	新焼山橋	西部建設事務所廿日市支所	広島県	廿日市市	県道所山潮原線	2002	30.5	9	道路橋	2014	Ⅲ	2024	Ⅰ	2029									●									
597	2304	新市井原橋	西部建設事務所廿日市支所	広島県	廿日市市	国道186号	2000	187	10.5	道路橋	2014	Ⅱ	2024	Ⅱ	2029									●									
598	2305	飯谷2号橋	西部建設事務所廿日市支所	広島県	大竹市	国道186号	1981	146	9.3	道路橋	2014	Ⅲ	2024	Ⅱ	2029									●									
599	2306	八丁1号橋	西部建設事務所廿日市支所	広島県	大竹市	国道186号	1980	120	9.3	道路橋	2014	Ⅲ	2024	Ⅱ	2029									●									
600	2307	翠橋	西部建設事務所廿日市支所	広島県	大竹市	国道186号	1967	130	9.6	道路橋	2017	Ⅲ	2022	Ⅲ	2027	2020	2027	770	全面塗替工	■			●							○☆			
601	2310	新町陸橋	西部建設事務所廿日市支所	広島県	大竹市	県道乙瀬小方線	1983	84.6	10	道路橋	2017	Ⅱ	2022	Ⅱ	2027								●★							○			
602	2323	北谷橋	西部建設事務所廿日市支所	広島県	大竹市	県道栗谷大野線	2012	11	11	道路橋	2018	Ⅰ	2023	Ⅰ	2028									●							○		
603	20931	新森宗橋	西部建設事務所廿日市支所	広島県	廿日市市	国道433号	2016	24.6	10.8	道路橋	2018	Ⅰ	2023	Ⅰ	2028									●							○		
604	2313	弥栄大橋	西部建設事務所廿日市支所	広島県	大竹市	県道大竹美和線	1986	422	11.2	道路橋	2014	Ⅲ	2020	Ⅱ	2025	2025	2030	1435	断面修復工, ひび割れ注入工	●							○□						
605	2324	無名BOX 3	西部建設事務所廿日市支所	広島県	廿日市市	国道186号	1989	6.5	27.3	道路橋	—	—	2020	Ⅱ	2025										○								
606	2316	陸橋(津田小学校前)	西部建設事務所廿日市支所	広島県	廿日市市	県道廿日市佐伯線	1970	13.5	1.9	横断歩道橋	2016	Ⅱ	2021	Ⅱ	2026									●						○			
607	2318	廿日市陸橋	西部建設事務所廿日市支所	広島県	廿日市市	国道2号	1970	19	1.9	横断歩道橋	2015	Ⅱ	2020	Ⅱ	2025									●					○				
608	2319	潮音寺前陸橋	西部建設事務所廿日市支所	広島県	廿日市市	国道2号	1972	15.8	1.9	横断歩道橋	2015	Ⅱ	2020	Ⅰ	2025									●					○				
609	2320	宮内歩道橋	西部建設事務所廿日市支所	広島県	廿日市市	県道廿日市佐伯線	1974	26	1.9	横断歩道橋	2015	Ⅱ	2020	Ⅱ	2025									●					○				
610	2308	翠橋歩道橋	西部建設事務所廿日市支所	広島県	大竹市	国道186号	1967	70	1.7	横断歩道橋	2017	Ⅲ	2022	Ⅲ	2027	2023	2026	76	全面塗替工				●		■			☆	○				
611	2074	無名側道橋	西部建設事務所廿日市支所	広島県	大竹市	県道岩国大竹線	1982	4.3	1.6	道路橋	2018	Ⅰ	2023	Ⅰ	2028										●								
612	21711	速谷橋	西部建設事務所廿日市支所	広島県	廿日市市	虫道廿日市線	2020	23.0	9.8	道路橋	—	—	—	—	2025										○								
613	5001	相生橋	西部建設事務所安芸太田支所	広島県	北広島町	国道186号	1992	20.8	7.8	道路橋	2015	Ⅰ	2020																				

No.	橋梁番号	施設名	事務所名	所在地		路線名	架設年度	橋長 (m)	幅員 (m)	橋梁種別	1巡目点検		最新の点検結果		次回点検	令和7年度から令和10年度までの修繕計画				点検・修繕計画 ○：定期点検(予定), □:修繕着手(予定), ☆：修繕完了(予定) ●：定期点検済, ■:修繕着手済, ★：修繕完了済計画								備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
				県名	市町名						点検年度	健全度	点検年度	健全度		点検年度	修繕着手年度	修繕完了年度	概算工事費 (100万円)	主な修繕内容	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2027	2028																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
654	5045	弁財天側道橋	西部建設事務所安芸太田支所	広島県	安芸太田町	国道191号	1998	25	2.4	道路橋	2015	I	2020	I	2025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

No.	橋梁番号	施設名	事務所名	所在地		路線名	架設年度	橋長 (m)	幅員 (m)	橋梁種別	1巡目点検		最新の点検結果		次回点検	令和7年度から令和10年度までの修繕計画				点検・修繕計画 ○：定期点検(予定), □:修繕着手(予定), ☆：修繕完了(予定) ●：定期点検済, ■:修繕着手済, ★：修繕完了済計画								備考		
				県名	市町名						点検年度	健全度	点検年度	健全度		点検年度	修繕着手年度	修繕完了年度	概算工事費 (100万円)	主な修繕内容	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2027	2028
731	5142	今田屋橋	西部建設事務所安芸太田支所	広島県	北広島町	県道今福芸北線	1979	17.5	9.2	道路橋	2017	Ⅱ	2022	Ⅱ	2027							●						○		
732	5143	日野節橋	西部建設事務所安芸太田支所	広島県	北広島町	県道今福芸北線	1986	21.7	8.2	道路橋	2017	Ⅰ	2022	Ⅰ	2027							●						○		
733	5144	東橋	西部建設事務所安芸太田支所	広島県	北広島町	県道今福芸北線	1971	17.5	5.7	道路橋	2017	Ⅱ	2022	Ⅰ	2027							●						○		
734	5145	駅前橋	西部建設事務所安芸太田支所	広島県	安芸太田町	県道簡賀停車場線	1960	12.3	5	道路橋	2016	Ⅱ	2021	Ⅱ	2026						●						○			
735	5146	柴木橋	西部建設事務所安芸太田支所	広島県	安芸太田町	県道三段峡線	1954	40.5	7.8	道路橋	2016	Ⅰ	2021	Ⅰ	2026						●						○			
736	5148	坂根橋	西部建設事務所安芸太田支所	広島県	安芸太田町	県道澄合豊平線	1976	60.2	10.2	道路橋	2017	Ⅱ	2022	Ⅱ	2027							●						○		
737	5149	上原橋	西部建設事務所安芸太田支所	広島県	安芸太田町	県道澄合豊平線	1964	33.1	6.7	道路橋	2016	Ⅱ	2021	Ⅰ	2026						●						○			
738	5150	昌原橋	西部建設事務所安芸太田支所	広島県	安芸太田町	県道澄合豊平線	1996	49.4	11	道路橋	2017	Ⅱ	2022	Ⅱ	2027							●						○		
739	5151	七曲橋	西部建設事務所安芸太田支所	広島県	北広島町	県道澄合豊平線	1997	45.9	11.5	道路橋	2017	Ⅱ	2022	Ⅱ	2027							●						○		
740	5152	落合橋	西部建設事務所安芸太田支所	広島県	北広島町	県道澄合豊平線	1980	29.8	8.2	道路橋	2017	Ⅱ	2022	Ⅱ	2027							●						○		
741	5153	川崎橋	西部建設事務所安芸太田支所	広島県	北広島町	県道澄合豊平線	1988	29.9	8.2	道路橋	2017	Ⅱ	2022	Ⅱ	2027							●						○		
742	5154	新水根橋	西部建設事務所安芸太田支所	広島県	北広島町	県道澄合豊平線	1985	11.4	8.1	道路橋	2017	Ⅲ	2022	Ⅰ	2027						★	●						○		
743	5155	三谷橋	西部建設事務所安芸太田支所	広島県	安芸太田町	県道上岡賀簡賀停車場線	1952	17.8	4.1	道路橋	2016	Ⅱ	2021	Ⅱ	2026						●							○		
744	5156	中之原2号橋	西部建設事務所安芸太田支所	広島県	安芸太田町	県道上岡賀簡賀停車場線	1983	13.4	8.2	道路橋	2016	Ⅰ	2021	Ⅰ	2026						●							○		
745	5157	中之原橋	西部建設事務所安芸太田支所	広島県	安芸太田町	県道上岡賀簡賀停車場線	2001	10.5	8.2	道路橋	2017	Ⅰ	2022	Ⅰ	2027							●						○		
746	5159	田之尻橋	西部建設事務所安芸太田支所	広島県	安芸太田町	県道上岡賀簡賀停車場線	1952	19.8	5.7	道路橋	2016	Ⅰ	2021	Ⅰ	2026						●							○		
747	5160	井仁口橋	西部建設事務所安芸太田支所	広島県	安芸太田町	県道中簡賀下線	1954	35.1	4.5	道路橋	2016	Ⅱ	2021	Ⅱ	2026						●							○		
748	5161	与市野橋	西部建設事務所安芸太田支所	広島県	安芸太田町	県道弁財天加計線	1991	27.5	8.2	道路橋	2017	Ⅰ	2022	Ⅱ	2027							●						○		
749	5162	江野橋	西部建設事務所安芸太田支所	広島県	安芸太田町	県道弁財天加計線	1990	37.5	10.3	道路橋	2017	Ⅰ	2022	Ⅱ	2027							●						○		
750	5163	樋口橋	西部建設事務所安芸太田支所	広島県	安芸太田町	県道弁財天加計線	1986	15.2	9	道路橋	2017	Ⅱ	2022	Ⅱ	2027							●						○		
751	5164	寺領橋	西部建設事務所安芸太田支所	広島県	安芸太田町	県道弁財天加計線	1985	12.2	8.7	道路橋	2017	Ⅰ	2022	Ⅰ	2027							●						○		
752	5165	寺島橋	西部建設事務所安芸太田支所	広島県	安芸太田町	県道弁財天加計線	1990	16.4	8.2	道路橋	2017	Ⅱ	2022	Ⅰ	2027							●						○		
753	5166	光本橋	西部建設事務所安芸太田支所	広島県	安芸太田町	県道弁財天加計線	1998	18.5	8.2	道路橋	2017	Ⅱ	2022	Ⅱ	2027							●						○		
754	5167	中須賀橋	西部建設事務所安芸太田支所	広島県	安芸太田町	県道弁財天加計線	1977	14	8.2	道路橋	2017	Ⅰ	2022	Ⅱ	2027							●						○		
755	5168	下深山橋	西部建設事務所安芸太田支所	広島県	安芸太田町	県道弁財天加計線	1967	11.9	5.6	道路橋	2017	Ⅱ	2022	Ⅱ	2027							●						○		
756	5169	新盆徳橋	西部建設事務所安芸太田支所	広島県	安芸太田町	県道小原猪山線	1994	34	9.3	道路橋	2017	Ⅱ	2022	Ⅱ	2027							●						○		
757	5170	鳥落橋	西部建設事務所安芸太田支所	広島県	北広島町	県道八幡雲耕線	1937	12.9	8.7	道路橋	2016	Ⅰ	2021	Ⅰ	2026						●						○			
758	5171	経塚橋	西部建設事務所安芸太田支所	広島県	北広島町	県道八幡雲耕線	1993	24.1	10.3	道路橋	2017	Ⅱ	2022	Ⅱ	2027							●						○		
759	5172	新追矢橋	西部建設事務所安芸太田支所	広島県	北広島町	県道八幡雲耕線	1998	13	10.3	道路橋	2017	Ⅰ	2022	Ⅱ	2027							●						○		
760	5173	小田橋	西部建設事務所安芸太田支所	広島県	北広島町	県道溝口加計線	1982	18.3	11.7	道路橋	2017	Ⅱ	2022	Ⅱ	2027							●						○		
761	5174	雲下橋	西部建設事務所安芸太田支所	広島県	北広島町	県道溝口加計線	1987	16.5	8.2	道路橋	2017	Ⅰ	2022	Ⅰ	2027							●						○		
762	5175	佐久橋	西部建設事務所安芸太田支所	広島県	北広島町	県道溝口加計線	1967	19	5.3	道路橋	2017	Ⅱ	2022	Ⅱ	2027							●						○		
763	5176	木地屋橋	西部建設事務所安芸太田支所	広島県	北広島町	県道溝口加計線	1968	24	5.1	道路橋	2017	Ⅱ	2022	Ⅱ	2027							●						○		
764	5177	鷗木橋	西部建設事務所安芸太田支所	広島県	北広島町	県道溝口加計線	1966	20.7	5.1	道路橋	2017	Ⅱ	2022	Ⅱ	2027							●						○		
765	5178	戸坂橋	西部建設事務所安芸太田支所	広島県	北広島町	県道小河内都志見線	1990	31	8.2	道路橋	2017	Ⅰ	2022	Ⅰ	2027							●						○		
766	5179	開明橋	西部建設事務所安芸太田支所																											

No.	橋梁番号	施設名	事務所名	所在地		路線名	架設年度	橋長 (m)	幅員 (m)	橋梁種別	1巡目点検		最新の点検結果		次回点検	令和7年度から令和10年度までの修繕計画				点検・修繕計画 ○：定期点検(予定), □:修繕着手(予定), ☆：修繕完了(予定) ●：定期点検済, ■:修繕着手済, ★：修繕完了済								備考		
				県名	市町名						点検年度	健全度	点検年度	健全度		点検年度	修繕着手年度	修繕完了年度	概算工事費 (100万円)	主な修繕内容	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2027	2028
808	5251	金田屋橋	西部建設事務所安芸太田支所	広島県	北広島町	県道旭戸河内線	1979	3.5	9	道路橋	2015	Ⅱ	2020	Ⅰ	2025						●					○				
809	5252	紺屋橋	西部建設事務所安芸太田支所	広島県	北広島町	県道旭戸河内線	1979	3.2	9.2	道路橋	2015	Ⅱ	2020	Ⅱ	2025						●					○				
810	5253	中村橋	西部建設事務所安芸太田支所	広島県	安芸太田町	県道旭戸河内線	1960	4.3	7.8	道路橋	2015	Ⅱ	2020	Ⅰ	2025						●					○				
811	5254	落合橋	西部建設事務所安芸太田支所	広島県	北広島町	県道安佐豊平芸北線	1962	4.2	7.2	道路橋	2016	Ⅱ	2021	Ⅰ	2026							●					○			
812	5255	上西橋	西部建設事務所安芸太田支所	広島県	北広島町	県道安佐豊平芸北線	1937	4.5	7.9	道路橋	2016	Ⅱ	2021	Ⅱ	2026							●					○			
813	5256	橋詰橋	西部建設事務所安芸太田支所	広島県	北広島町	県道安佐豊平芸北線	1968	9.1	7.8	道路橋	2016	Ⅱ	2021	Ⅱ	2026							●					○			
814	5257	土居橋	西部建設事務所安芸太田支所	広島県	北広島町	県道安佐豊平芸北線	1990	4.8	10.4	道路橋	2016	Ⅰ	2021	Ⅰ	2026							●					○			
815	5262	辨慶橋（上り線）	西部建設事務所安芸太田支所	広島県	北広島町	県道千代田八千代線	1961	7.7	7.1	道路橋	2017	Ⅱ	2022	Ⅱ	2027								●					○		
816	5264	川西本郷橋	西部建設事務所安芸太田支所	広島県	北広島町	県道千代田八千代線	1950	3.3	15.4	道路橋	2017	Ⅰ	2022	Ⅰ	2027								●					○		
817	5268	天津川橋（上り線）	西部建設事務所安芸太田支所	広島県	北広島町	県道千代田八千代線	1943	3.6	3.6	道路橋	2017	Ⅱ	2022	Ⅱ	2027								●					○		
818	5271	大谷橋	西部建設事務所安芸太田支所	広島県	北広島町	県道芸北大朝線	1936	6.3	8	道路橋	2017	Ⅱ	2022	Ⅱ	2027								●					○		
819	5273	吉添橋	西部建設事務所安芸太田支所	広島県	北広島町	県道芸北大朝線	1960	2.4	8.9	道路橋	2017	Ⅱ	2022	Ⅱ	2027								●					○		
820	5274	長者橋（上り線）	西部建設事務所安芸太田支所	広島県	北広島町	県道都川中野線	1960	3.7	3.1	道路橋	2017	Ⅱ	2022	Ⅱ	2027								●					○		
821	5276	栄橋	西部建設事務所安芸太田支所	広島県	北広島町	県道都川中野線	2004	33.5	11	道路橋	2018	Ⅰ	2023	Ⅰ	2028									●					○	
822	5277	長沢橋	西部建設事務所安芸太田支所	広島県	北広島町	県道都川中野線	1949	7	7.2	道路橋	2016	Ⅱ	2021	Ⅰ	2026							●						○		
823	5278	松谷橋	西部建設事務所安芸太田支所	広島県	北広島町	県道波佐芸北線	1960	5.1	3.9	道路橋	2016	Ⅰ	2021	Ⅰ	2026							●						○		
824	5279	今田屋橋	西部建設事務所安芸太田支所	広島県	北広島町	県道波佐芸北線	1962	5.5	3.8	道路橋	2016	Ⅱ	2021	Ⅱ	2026							●						○		
825	5280	嶋木橋	西部建設事務所安芸太田支所	広島県	安芸太田町	県道下佐東線	1960	6.5	5	道路橋	2016	Ⅱ	2021	Ⅱ	2026							●						○		
826	5281	四巻橋	西部建設事務所安芸太田支所	広島県	安芸太田町	県道下佐東線	1960	3.1	3.4	道路橋	2016	Ⅰ	2021	Ⅰ	2026							●						○		
827	5282	宇の桁橋	西部建設事務所安芸太田支所	広島県	安芸太田町	県道下佐東線	1964	5.8	4.5	道路橋	2017	Ⅰ	2022	Ⅰ	2027								●					○		
828	5283	寄谷橋	西部建設事務所安芸太田支所	広島県	安芸太田町	県道下佐東線	1964	5.6	4.5	道路橋	2016	Ⅱ	2021	Ⅱ	2026							●						○		
829	5284	界橋	西部建設事務所安芸太田支所	広島県	安芸太田町	県道下佐東線	1964	3	4.5	道路橋	2017	Ⅱ	2022	Ⅱ	2027								●					○		
830	5285	中ノ谷橋	西部建設事務所安芸太田支所	広島県	安芸太田町	県道忍羅漢公園線	1961	4.4	4.4	道路橋	2017	Ⅰ	2022	Ⅰ	2027								●					○		
831	5286	猿獄橋	西部建設事務所安芸太田支所	広島県	安芸太田町	県道忍羅漢公園線	1963	6.5	4.7	道路橋	2017	Ⅱ	2022	Ⅱ	2027								●					○		
832	5287	小屋床橋	西部建設事務所安芸太田支所	広島県	安芸太田町	県道忍羅漢公園線	1961	10.5	4.7	道路橋	2017	Ⅱ	2022	Ⅱ	2027								●					○		
833	5288	出合橋	西部建設事務所安芸太田支所	広島県	安芸太田町	県道忍羅漢公園線	1935	52.5	6.8	道路橋	2017	Ⅱ	2022	Ⅱ	2027								●					○		
834	5289	白谷橋	西部建設事務所安芸太田支所	広島県	安芸太田町	県道吉和戸河内線	1961	6.7	5	道路橋	2016	Ⅲ	2021	Ⅲ	2026						■	●■	★				○			
835	5290	小橋	西部建設事務所安芸太田支所	広島県	安芸太田町	県道吉和戸河内線	1963	14	6.3	道路橋	2017	Ⅲ	2022	Ⅰ	2027						■		●★					○		
836	5291	出ヶ平橋	西部建設事務所安芸太田支所	広島県	安芸太田町	県道吉和戸河内線	1963	5	4.6	道路橋	2017	Ⅱ	2022	Ⅱ	2027								●					○		
837	5292	出合橋	西部建設事務所安芸太田支所	広島県	安芸太田町	県道吉和戸河内線	1926	22.1	4.1	道路橋	2016	Ⅱ	2021	Ⅱ	2026							●						○		
838	5293	出口橋	西部建設事務所安芸太田支所	広島県	安芸太田町	県道澄合豊平線	1994	9.5	10.8	道路橋	2018	Ⅰ	2023	Ⅱ	2028									●					○	
839	5294	小谷橋	西部建設事務所安芸太田支所	広島県	安芸太田町	県道澄合豊平線	1963	5.5	7.8	道路橋	2017	Ⅰ	2022	Ⅰ	2027								●					○		
840	5296	小路谷橋	西部建設事務所安芸太田支所	広島県	安芸太田町	県道澄合豊平線	1921	7	8.5	道路橋	2017	Ⅰ	2022	Ⅰ	2027								●					○		
841	5298	靱祖橋	西部建設事務所安芸太田支所	広島県	北広島町	県道澄合豊平線	1957	10	11.1	道路橋	2016	Ⅰ	2021	Ⅰ	2026							●						○		
842	5299	数舟橋	西部建設事務所安芸太田支所	広島県	安芸太田町	県道上岡賀岡賀停車場線	1954	2.1	4	道路橋	2017	Ⅱ	2022	Ⅱ	2027								●					○		
843	5300	伊保地橋	西部建設事務所安芸																											

No.	橋梁番号	施設名	事務所名	所在地		路線名	架設年度	橋長 (m)	幅員 (m)	橋梁種別	1巡目点検		最新の点検結果		次回点検	令和7年度から令和10年度までの修繕計画				点検・修繕計画 ○：定期点検(予定), □:修繕着手(予定), ☆：修繕完了(予定) ●：定期点検済, ■:修繕着手済, ★：修繕完了済									備考			
				点検年度	健全度						点検年度	健全度	点検年度	修繕着手年度		修繕完了年度	概算工事費 (100万円)	主な修繕内容	実績 計画													
															2020				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028						
885	5456	明神大橋	西部建設事務所安芸太田支所	広島県	安芸太田町	国道191号	1975	146	11.9	道路橋	2016	Ⅲ	2021	Ⅰ	2026							●										
886	5457	無名橋34	西部建設事務所安芸太田支所	広島県	安芸太田町	国道191号	1976	4.8	11.1	道路橋	2016	Ⅰ	2021	Ⅰ	2026							●										
887	5458	加計大橋	西部建設事務所安芸太田支所	広島県	安芸太田町	国道191号	1979	338.7	11.5	道路橋	2016	Ⅱ	2021	Ⅲ	2026	2022	2026	100	補修(支承防錆工、伸縮装置設置)			●	■							○☆		
888	5459	無名橋35	西部建設事務所安芸太田支所	広島県	安芸太田町	国道191号	1983	8.2	29.5	道路橋	2016	Ⅰ	2021	Ⅰ	2026							●								○		
889	5460	無名橋36(車道部)	西部建設事務所安芸太田支所	広島県	安芸太田町	国道191号	1983	3.8	8.6	道路橋	2016	Ⅰ	2021	Ⅰ	2026							●								○		
890	5461	無名橋36(歩道部)	西部建設事務所安芸太田支所	広島県	安芸太田町	国道191号	1983	3.8	3	道路橋	2016	Ⅰ	2021	Ⅰ	2026							●								○		
891	5462	辻ヶ河原大橋	西部建設事務所安芸太田支所	広島県	安芸太田町	国道191号	1979	210.7	11.5	道路橋	2016	Ⅰ	2021	Ⅱ	2026							●								○		
892	5463	本郷2号橋	西部建設事務所安芸太田支所	広島県	安芸太田町	国道191号	2011	7.2	10.7	道路橋	2015	Ⅰ	2020	Ⅰ	2025						●								○			
893	5464	無名橋37	西部建設事務所安芸太田支所	広島県	安芸太田町	国道191号	1987	2.9	10	道路橋	2016	Ⅰ	2021	Ⅰ	2026							●							○			
894	5467	池田橋	西部建設事務所安芸太田支所	広島県	北広島町	県道旭戸河内線	1977	9	8.3	道路橋	2018	Ⅰ	2023	Ⅱ	2028									●						○		
895	5468	無名橋57	西部建設事務所安芸太田支所	広島県	北広島町	県道旭戸河内線	1994	3.1	8.3	道路橋	2018	Ⅰ	2023	Ⅰ	2028									●						○		
896	5469	芦田橋	西部建設事務所安芸太田支所	広島県	北広島町	県道旭戸河内線	1969	3.5	6	道路橋	2018	Ⅱ	2023	Ⅱ	2028									●						○		
897	5475	無名橋63	西部建設事務所安芸太田支所	広島県	安芸太田町	県道旭戸河内線	2009	2.4	14	道路橋	2016	Ⅱ	2021	Ⅱ	2026							●							○			
898	5476	無名橋86	西部建設事務所安芸太田支所	広島県	北広島町	県道都川中野線	1995	7.4	9.9	道路橋	2018	Ⅰ	2023	Ⅰ	2028														○			
899	5477	鍛冶屋橋	西部建設事務所安芸太田支所	広島県	北広島町	県道都川中野線	1980	8.5	8.2	道路橋	2018	Ⅱ	2023	Ⅰ	2028									●						○		
900	5478	判明橋	西部建設事務所安芸太田支所	広島県	北広島町	県道今福芸北線	1967	8	5.7	道路橋	2018	Ⅰ	2023	Ⅰ	2028									●						○		
901	5479	上田屋橋	西部建設事務所安芸太田支所	広島県	北広島町	県道今福芸北線	1971	8.5	5.8	道路橋	2018	Ⅰ	2023	Ⅱ	2028									●						○		
902	5480	俵原橋	西部建設事務所安芸太田支所	広島県	北広島町	県道今福芸北線	1967	4.4	5.5	道路橋	2018	Ⅰ	2023	Ⅱ	2028									●						○		
903	5481	三軒屋橋	西部建設事務所安芸太田支所	広島県	北広島町	県道今福芸北線	1967	7.1	5.7	道路橋	2018	Ⅰ	2023	Ⅱ	2028									●						○		
904	5501	新王泊橋	西部建設事務所安芸太田支所	広島県	北広島町	国道186号	1957	151.8	6.3	道路橋	2018	Ⅱ	2023	Ⅲ	2028									●						○		
905	5503	無名橋39	西部建設事務所安芸太田支所	広島県	北広島町	国道261号	1987	2	12.5	道路橋	2016	Ⅰ	2021	Ⅰ	2026							●							○			
906	5504	無名橋40	西部建設事務所安芸太田支所	広島県	北広島町	国道261号	1986	2.7	12.2	道路橋	2016	Ⅰ	2021	Ⅰ	2026							●							○			
907	5505	無名橋41	西部建設事務所安芸太田支所	広島県	北広島町	国道261号	1978	2.5	16.1	道路橋	2016	Ⅰ	2021	Ⅱ	2026							●							○			
908	5506	無名橋42	西部建設事務所安芸太田支所	広島県	北広島町	国道261号	1978	4.4	29.1	道路橋	2016	Ⅰ	2021	Ⅰ	2026							●							○			
909	5507	千代田歩道橋	西部建設事務所安芸太田支所	広島県	北広島町	国道261号	1986	45.7	3.3	道路橋	2016	Ⅰ	2021	Ⅰ	2026							●							○			
910	5509	無名橋44	西部建設事務所安芸太田支所	広島県	北広島町	国道261号	1996	2.9	28.5	道路橋	2016	Ⅰ	2021	Ⅰ	2026							●							○			
911	5511	無名橋46	西部建設事務所安芸太田支所	広島県	北広島町	国道261号	1987	2.3	16.5	道路橋	2016	Ⅰ	2021	Ⅰ	2026							●							○			
912	5512	無名橋47	西部建設事務所安芸太田支所	広島県	安芸太田町	国道433号	1993	2.4	12.3	道路橋	2018	Ⅰ	2023	Ⅱ	2028									●						○		
913	5513	阿正谷橋	西部建設事務所安芸太田支所	広島県	安芸太田町	国道433号	1997	6.4	11.2	道路橋	2018	Ⅰ	2023	Ⅰ	2028									●						○		
914	5514	勝草橋	西部建設事務所安芸太田支所	広島県	安芸太田町	国道433号	1993	2.4	12.4	道路橋	2018	Ⅰ	2023	Ⅰ	2028									●						○		
915	5518	仕形原橋	西部建設事務所安芸太田支所	広島県	北広島町	国道433号	1973	6.7	7.9	道路橋	2018	Ⅱ	2023	Ⅱ	2028									●						○		
916	5521	志路原2号橋(上り線)	西部建設事務所安芸太田支所	広島県	北広島町	国道433号	1974	2.8	13.3	道路橋	2018	Ⅲ	2023	Ⅲ	2028					■★				●						○		
917	5522	志路原2号橋(下り線)	西部建設事務所安芸太田支所	広島県	北広島町	国道433号	1974	2.8	13.3	道路橋	2018	Ⅰ	2023	Ⅱ	2028									●						○		
918	5523	林橋	西部建設事務所安芸太田支所	広島県	北広島町	国道433号	2000	8.3	13.7	道路橋	2018	Ⅰ	2023	Ⅰ	2028									●						○		
919	5524	上日下橋	西部建設事務所安芸太田支所	広島県	北広島																											

No.	橋梁番号	施設名	事務所名	所在地		路線名	架設年度	橋長 (m)	幅員 (m)	橋梁種別	1巡目点検		最新の点検結果		次回点検	令和7年度から令和10年度までの修繕計画				点検・修繕計画 ○：定期点検(予定), □:修繕着手(予定), ☆：修繕完了(予定) ●：定期点検済, ■:修繕着手済, ★：修繕完了済								備考		
				県名	市町名						点検年度	健全度	点検年度	健全度		点検年度	修繕着手年度	修繕完了年度	概算工事費 (100万円)	主な修繕内容	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2027	2028
962	5580	栗原橋	西部建設事務所安芸太田支所	広島県	安芸太田町	県道三段峡線	1967	6.4	6.9	道路橋	2014	Ⅱ	2024	Ⅰ	2029									●						
963	5581	恐羅漢橋	西部建設事務所安芸太田支所	広島県	安芸太田町	県道恐羅漢公園線	1987	14	12.2	道路橋	2014	Ⅱ	2024	Ⅰ	2029									●						
964	5584	内黒橋	西部建設事務所安芸太田支所	広島県	安芸太田町	県道恐羅漢公園線	1981	15	8.2	道路橋	2014	Ⅰ	2024	Ⅰ	2029									●						
965	5585	無名橋89	西部建設事務所安芸太田支所	広島県	安芸太田町	県道恐羅漢公園線	不明	4.3	5.4	道路橋	2014	Ⅱ	2024	Ⅱ	2029									●						
966	5586	無名橋90	西部建設事務所安芸太田支所	広島県	安芸太田町	県道恐羅漢公園線	不明	2.7	5.1	道路橋	2014	Ⅱ	2024	Ⅱ	2029									●						
967	5587	無名橋91	西部建設事務所安芸太田支所	広島県	安芸太田町	県道吉和戸河内線	不明	2.4	6.1	道路橋	2014	Ⅲ	2024	Ⅰ	2029				■		★		●							
968	5588	無名橋92	西部建設事務所安芸太田支所	広島県	安芸太田町	県道吉和戸河内線	不明	2.6	5.5	道路橋	2014	Ⅲ	2024	Ⅰ	2029				■		★		●							
969	5590	無名橋97	西部建設事務所安芸太田支所	広島県	安芸太田町	県道上岡賀岡賀停車場線	不明	4	4.2	道路橋	2014	Ⅰ	2024	Ⅰ	2029									●						
970	5591	無名橋98	西部建設事務所安芸太田支所	広島県	安芸太田町	県道上岡賀岡賀停車場線	不明	3	3.8	道路橋	2014	Ⅰ	2024	Ⅰ	2029									●						
971	5592	無名橋99	西部建設事務所安芸太田支所	広島県	安芸太田町	県道上岡賀岡賀停車場線	不明	2	7.7	道路橋	2014	Ⅰ	2024	Ⅰ	2029									●						
972	5593	川暮橋	西部建設事務所安芸太田支所	広島県	安芸太田町	県道上岡賀岡賀停車場線	1981	7.9	8.2	道路橋	2014	Ⅱ	2024	Ⅰ	2029									●						
973	5594	鴨ヶ谷橋	西部建設事務所安芸太田支所	広島県	安芸太田町	県道上岡賀岡賀停車場線	1991	6.7	8.6	道路橋	2014	Ⅰ	2024	Ⅰ	2029									●						
974	5595	正田橋	西部建設事務所安芸太田支所	広島県	安芸太田町	県道弁財天加計線	1992	6.8	27.3	道路橋	2014	Ⅱ	2024	Ⅰ	2029									●						
975	5596	西谷橋	西部建設事務所安芸太田支所	広島県	安芸太田町	県道弁財天加計線	1959	6.2	8.5	道路橋	2014	Ⅰ	2024	Ⅰ	2029									●						
976	5597	無名橋108	西部建設事務所安芸太田支所	広島県	安芸太田町	県道弁財天加計線	1986	4.5	8.4	道路橋	2014	Ⅰ	2024	Ⅰ	2029									●						
977	5598	東谷橋	西部建設事務所安芸太田支所	広島県	安芸太田町	県道弁財天加計線	1986	10.3	9.1	道路橋	2014	Ⅰ	2024	Ⅰ	2029									●						
978	5599	高橋橋	西部建設事務所安芸太田支所	広島県	北広島町	県道小原猪山線	1994	21.4	8.6	道路橋	2014	Ⅰ	2024	Ⅰ	2029									●						
979	5600	大峠橋	西部建設事務所安芸太田支所	広島県	北広島町	県道小原猪山線	1951	4.5	3.8	道路橋	2014	Ⅲ	2024	Ⅱ	2029									●						
980	5601	渡原橋	西部建設事務所安芸太田支所	広島県	北広島町	県道小原猪山線	1940	5.7	4.1	道路橋	2014	Ⅱ	2024	Ⅱ	2029									●						
981	5602	オヶ谷橋	西部建設事務所安芸太田支所	広島県	北広島町	県道小原猪山線	2018	5.3	4.9	道路橋	2014	Ⅲ	2024	Ⅰ	2029									●						
982	5603	平見谷橋	西部建設事務所安芸太田支所	広島県	安芸太田町	県道小原猪山線	1996	7.1	8.1	道路橋	2014	Ⅰ	2024	Ⅰ	2029									●						
983	5605	新猪山大橋	西部建設事務所安芸太田支所	広島県	安芸太田町	県道小原猪山線	1997	103.2	11	道路橋	2014	Ⅱ	2024	Ⅱ	2029									●						
984	5606	東八幡原橋（上り線）	西部建設事務所安芸太田支所	広島県	北広島町	県道八幡雲耕線	1972	4.4	5	道路橋	2014	Ⅲ	2024	Ⅱ	2029									●						
985	5608	上八幡橋	西部建設事務所安芸太田支所	広島県	北広島町	県道八幡雲耕線	1960	9.6	6.9	道路橋	2014	Ⅱ	2024	Ⅲ	2029					■				●						
986	5609	鹿布施橋	西部建設事務所安芸太田支所	広島県	北広島町	県道八幡雲耕線	1961	3.1	8	道路橋	2014	Ⅱ	2024	Ⅱ	2029									●						
987	5610	落合橋	西部建設事務所安芸太田支所	広島県	北広島町	県道八幡雲耕線	1986	4	8.5	道路橋	2014	Ⅰ	2024	Ⅰ	2029									●						
988	5611	亀山橋	西部建設事務所安芸太田支所	広島県	北広島町	県道八幡雲耕線	2004	13.5	12.3	道路橋	2014	Ⅰ	2024	Ⅰ	2029									●						
989	5612	簾中橋	西部建設事務所安芸太田支所	広島県	北広島町	県道小河内都志見線	1959	3.1	5.8	道路橋	2014	Ⅱ	2024	Ⅱ	2029									●						
990	5613	上北尾橋	西部建設事務所安芸太田支所	広島県	北広島町	県道小河内都志見線	1959	2.3	6	道路橋	2014	Ⅱ	2024	Ⅰ	2029									●						
991	5614	中北尾橋	西部建設事務所安芸太田支所	広島県	北広島町	県道小河内都志見線	1959	5.8	6.5	道路橋	2014	Ⅱ	2024	Ⅱ	2029									●						
992	5615	下北尾橋	西部建設事務所安芸太田支所	広島県	北広島町	県道小河内都志見線	1959	6.3	5.3	道路橋	2014	Ⅲ	2024	Ⅰ	2029									●						
993	5617	無名橋111	西部建設事務所安芸太田支所	広島県	北広島町	県道新庄千代田線	1971	3	7.4	道路橋	2014	Ⅰ	2024	Ⅰ	2029									●						
994	5618	婆橋	西部建設事務所安芸太田支所	広島県	北広島町	県道志路原大朝線	1960	4.6	4.8	道路橋	2014	Ⅱ	2024	Ⅰ	2029									●						
995	5619	境橋	西部建設事務所安芸太田支所	広島県	北広島町	県道志路原大朝線	1949	3.2	5.5	道路橋	2014	Ⅱ	2024	Ⅱ	2029									●						
996	5620	無名橋112	西部建設事務所安芸太田支所	広島県	北広島町	県道志路原大朝線	1986	5.1	15.3	道路橋	2014	Ⅱ	2024	Ⅰ	2029									●						
997	5621	土居橋	西部建設事務所安芸太田支所	広島県	北広島町	県道志路原大朝線	1989	5	9.4	道路橋	2014	Ⅱ	2024	Ⅰ	2029									●						
998	5622	無名橋113	西部建設事務所安芸太田支所	広島県	北広島町	県道鳥帽子中原線	2000	3.6	13.6	道路橋	2014	Ⅰ	2024	Ⅰ	2029						</									

No.	橋梁番号	施設名	事務所名	所在地		路線名	架設年度	橋長 (m)	幅員 (m)	橋梁種別	1巡目点検		最新の点検結果		次回点検	令和7年度から令和10年度までの修繕計画				点検・修繕計画 ○：定期点検(予定), □:修繕着手(予定), ☆：修繕完了(予定) ●：定期点検済, ■:修繕着手済, ★：修繕完了済計画								備考		
				県名	市町名						点検年度	健全度	点検年度	健全度		点検年度	修繕着手年度	修繕完了年度	概算工事費 (100万円)	主な修繕内容	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2027	2028
1039	5705	無名橋109	西部建設事務所安芸太田支所	広島県	北広島町	県道溝口加計線	1983	2.3	5.1	道路橋	2018	Ⅱ	2023	Ⅱ	2028								●						○	
1040	5707	無名橋103	西部建設事務所安芸太田支所	広島県	安芸太田町	県道中筒賀下線	1984	3.6	4	道路橋	2018	Ⅰ	2023	Ⅱ	2028								●						○	
1041	5708	無名橋102	西部建設事務所安芸太田支所	広島県	安芸太田町	県道中筒賀下線	1984	2.6	7.8	道路橋	2018	Ⅰ	2023	Ⅱ	2028								●						○	
1042	5709	無名橋101	西部建設事務所安芸太田支所	広島県	安芸太田町	県道中筒賀下線	1984	2.6	8.5	道路橋	2018	Ⅰ	2023	Ⅱ	2028								●						○	
1043	5710	河平橋	西部建設事務所安芸太田支所	広島県	安芸太田町	県道中筒賀下線	1971	5	4.6	道路橋	2018	Ⅰ	2023	Ⅱ	2028								●						○	
1044	5711	無名橋104	西部建設事務所安芸太田支所	広島県	安芸太田町	県道中筒賀下線	1990	4.8	7.7	道路橋	2018	Ⅰ	2023	Ⅰ	2028								●						○	
1045	5712	無名橋105	西部建設事務所安芸太田支所	広島県	安芸太田町	県道中筒賀下線	1972	5.5	4	道路橋	2018	Ⅰ	2023	Ⅱ	2028								●						○	
1046	5713	無名橋106	西部建設事務所安芸太田支所	広島県	安芸太田町	県道中筒賀下線	1972	2.4	7.4	道路橋	2018	Ⅰ	2023	Ⅰ	2028								●						○	
1047	5714	念仏谷橋	西部建設事務所安芸太田支所	広島県	安芸太田町	県道中筒賀下線	1958	8.3	3.7	道路橋	2018	Ⅱ	2023	Ⅱ	2028								●						○	
1048	5715	無名橋96	西部建設事務所安芸太田支所	広島県	北広島町	県道澄合豊平線	1980	2	9.6	道路橋	2018	Ⅰ	2023	Ⅱ	2028								●						○	
1049	5716	昌原橋 (BOX)	西部建設事務所安芸太田支所	広島県	安芸太田町	県道澄合豊平線	1996	3.7	11.2	道路橋	2018	Ⅰ	2023	Ⅰ	2028								●						○	
1050	5717	無名橋95	西部建設事務所安芸太田支所	広島県	安芸太田町	県道澄合豊平線	1975	2.4	8.1	道路橋	2018	Ⅰ	2023	Ⅱ	2028								●						○	
1051	5718	坂根上橋	西部建設事務所安芸太田支所	広島県	安芸太田町	県道澄合豊平線	1990	6.5	8.7	道路橋	2018	Ⅰ	2023	Ⅰ	2028								●						○	
1052	5719	早木橋	西部建設事務所安芸太田支所	広島県	安芸太田町	県道澄合豊平線	1990	4	10.1	道路橋	2018	Ⅰ	2023	Ⅰ	2028								●						○	
1053	5720	安水橋	西部建設事務所安芸太田支所	広島県	安芸太田町	国道4 3 3 号	1954	80.6	6.9	道路橋	2015	Ⅲ	2020	Ⅲ	2025		●						★			○				
1054	5034	深谷橋	西部建設事務所安芸太田支所	広島県	安芸太田町	国道1 9 1 号	1960	11	10.4	道路橋	2016	Ⅰ	2021	Ⅰ	2026						●							○		
1055	5052	都合谷橋	西部建設事務所安芸太田支所	広島県	北広島町	国道2 6 1 号	1993	13.7	18.8	道路橋	2016	Ⅱ	2021	Ⅱ	2026							●						○		
1056	5230	光石橋	西部建設事務所安芸太田支所	広島県	安芸太田町	国道1 9 1 号	1952	6.7	6.5	道路橋	2016	Ⅲ	2020	Ⅲ	2025		●								○					
1057	280400501	新氏神橋	西部建設事務所安芸太田支所	広島県	北広島町	県道浜田八重可部線	2015	19	11	道路橋	2018	Ⅰ	2023	Ⅰ	2028								●						○	
1058	280431601	新本郷橋	西部建設事務所安芸太田支所	広島県	北広島町	県道都志見千代田線	2015	26.1	10.3	道路橋	2018	Ⅰ	2023	Ⅰ	2028								●						○	
1059	5418	無名橋6	西部建設事務所安芸太田支所	広島県	安芸太田町	国道1 8 6 号	2002	5.6	12.6	道路橋	2018	Ⅰ	2023	Ⅰ	2028								●						○	
1060	5724	無名橋121	西部建設事務所安芸太田支所	広島県	北広島町	県道旭戸河内線	1988	4.9	10.3	道路橋	2018	Ⅰ	2023	Ⅰ	2028								●						○	
1061	5721	大島橋	西部建設事務所安芸太田支所	広島県	北広島町	県道七曲千代田線	2013	30.5	10	道路橋	2014	Ⅰ	2020	Ⅰ	2025		●								○					
1062	52441	三坂橋	西部建設事務所安芸太田支所	広島県	北広島町	県道浜田八重可部線	2020	2.2	6.2	道路橋	—	—	2020	Ⅰ	2025		●									○				
1063	5441	無名橋21 (側道部)	西部建設事務所安芸太田支所	広島県	安芸太田町	国道1 8 6 号	2002	5	2.4	道路橋	—	—	2021	Ⅱ	2026								●							
1064	5723	無名歩道橋 (千代田 I C)	西部建設事務所安芸太田支所	広島県	北広島町	県道浜田八重可部線	2005	26.9	2.6	横断歩道橋	2015	Ⅱ	2020	Ⅱ	2025		●								○			○		
1065	5068-2	瀧山川橋	西部建設事務所安芸太田支所	広島県	安芸太田町	国道4 3 4 号	1968	51.9	1.8	道路橋	—	—	2024	Ⅱ	2029										●					
1066	5519-1	志路原1号ボックス	西部建設事務所安芸太田支所	広島県	安芸太田町	国道4 3 3 号	2021	2	8.8	道路橋	—	—	2023	Ⅰ	2028								●						○	
1067	5007-2	中野橋	西部建設事務所安芸太田支所	広島県	北広島町	国道1 8 6 号	1985	11.3	2.6	道路橋	—	—	2024	Ⅰ	2029									●		●				
1068	513751	小谷下橋	西部建設事務所東広島支所	広島県	東広島市	国道3 7 5 号	1951	7	9.1	道路橋	2015	Ⅱ	2020	Ⅱ	2025		●								○					
1069	51375201	広地橋	西部建設事務所東広島支所	広島県	東広島市	国道3 7 5 号	1935	76	8	道路橋	2015	Ⅱ	2020	Ⅱ	2025		●								○					
1070	51375300	新西条陸橋 (上り)	西部建設事務所東広島支所	広島県	東広島市	国道3 7 5 号	2012	270	10.5	道路橋	2015	Ⅱ	2024	Ⅱ	2029									●						
1071	51375301	新西条陸橋 (下り)	西部建設事務所東広島支所	広島県	東広島市	国道3 7 5 号	1987	209.2	12	道路橋	2015	Ⅱ	2024	Ⅱ	2029									●						
1072	51375303	しゃくなげ大橋	西部建設事務所東広島支所	広島県	東広島市	国道3 7 5 号	2009	253	11	道路橋	2015	Ⅱ	2020	Ⅱ	2025		●								○					
1073	51375304	新菅田橋	西部建設事務所東広島支所	広島県	東広島市	国道3 7 5 号	2004	47	15.7	道路橋	2015	Ⅰ	2020	Ⅰ	2025		●													

No.	橋梁番号	施設名	事務所名	所在地		路線名	架設年度	橋長 (m)	幅員 (m)	橋梁種別	1巡目点検		最新の点検結果		次回点検	令和7年度から令和10年度までの修繕計画				点検・修繕計画 ○：定期点検(予定), □:修繕着手(予定), ☆：修繕完了(予定) ●：定期点検済, ■:修繕着手済, ★：修繕完了済計画								備考				
				県名	市町名						点検年度	健全度	点検年度	健全度		点検年度	修繕着手年度	修繕完了年度	概算工事費 (100万円)	主な修繕内容	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2027	2028		
1116	7016	宮の前橋	西部建設事務所東広島支所	広島県	東広島市	国道375号	1994	13.1	9.5	道路橋	2015	I	2020	I	2025						●					○						
1117	7017	吉土実橋	西部建設事務所東広島支所	広島県	東広島市	国道375号	1994	13.5	9.5	道路橋	2015	I	2020	I	2025						●					○						
1118	7018	土与丸橋	西部建設事務所東広島支所	広島県	東広島市	国道375号	1993	20.6	14.2	道路橋	2015	I	2020	I	2025						●					○						
1119	7019	吉行橋	西部建設事務所東広島支所	広島県	東広島市	国道375号	1990	11.5	24.5	道路橋	2015	I	2020	I	2025						●					○						
1120	7020	造賀橋	西部建設事務所東広島支所	広島県	東広島市	国道375号	1991	27.8	12	道路橋	2015	II	2020	II	2025						●					○						
1121	7021	亀岡橋 (BOXカルバート)	西部建設事務所東広島支所	広島県	東広島市	国道375号	1933	7.2	12.3	道路橋	2015	I	2020	II	2025						●					○						
1122	7022	鰐淵橋 (下り)	西部建設事務所東広島支所	広島県	東広島市	国道375号	1999	28.1	6.5	道路橋	2015	II	2020	II	2025						●					○						
1123	7024	森原大橋 (上り)	西部建設事務所東広島支所	広島県	東広島市	国道375号	1965	10.9	7.6	道路橋	2015	II	2020	II	2025						●					○						
1124	7026	新大渡橋	西部建設事務所東広島支所	広島県	東広島市	国道375号	1969	47	8	道路橋	2015	II	2021	III	2026	2023	2027	165	全面塗装工, ひび割れ注入工, 耐震補強工		●			■			○		○	☆		
1125	7027	三ツ橋	西部建設事務所東広島支所	広島県	東広島市	国道375号	1958	7.7	6.4	道路橋	2015	I	2020	I	2025						●					○						
1126	7029	鰻田橋	西部建設事務所東広島支所	広島県	東広島市	国道375号	1966	10.1	8.2	道路橋	2015	I	2020	I	2025						●					○						
1127	7030	高橋	西部建設事務所東広島支所	広島県	東広島市	国道375号	1966	15.7	6.8	道路橋	2016	I	2021	I	2026							●					○					
1128	7032	宮乃首橋 (上り)	西部建設事務所東広島支所	広島県	東広島市	国道375号	1994	7.4	3.6	道路橋	2015	I	2020	I	2025						●					○						
1129	703301	友近橋	西部建設事務所東広島支所	広島県	東広島市	県道瀬野川福富本郷線	1974	21.6	10	道路橋	2016	I	2021	II	2026							●					○					
1130	703302	甲谷橋	西部建設事務所東広島支所	広島県	東広島市	県道瀬野川福富本郷線	1961	34.8	7.7	道路橋	2016	II	2021	II	2026							●					○					
1131	7034	徳広橋 (下り)	西部建設事務所東広島支所	広島県	東広島市	国道432号	1972	7	2	道路橋	2015	II	2020	II	2025						●					○						
1132	7036	徳広側道橋	西部建設事務所東広島支所	広島県	東広島市	国道432号	不明	8.7	4	道路橋	2015	II	2020	II	2025						●					○						
1133	7037	新和田橋	西部建設事務所東広島支所	広島県	東広島市	国道432号	1992	12.5	13	道路橋	2015	I	2020	I	2025						●					○						
1134	7038	中屋谷橋 (上り)	西部建設事務所東広島支所	広島県	東広島市	国道432号	1988	30.5	4.1	道路橋	2016	II	2023	II	2028							●					○					
1135	7040	新元安橋	西部建設事務所東広島支所	広島県	東広島市	国道432号	1988	26.4	11.4	道路橋	2015	I	2020	I	2025						●					○						
1136	7041	年見橋	西部建設事務所東広島支所	広島県	東広島市	国道432号	1985	46.2	10.7	道路橋	2016	II	2021	III	2026	2025	2025	112	断面修復工		●					□☆	○					
1137	7043	新寺沖橋	西部建設事務所東広島支所	広島県	東広島市	国道432号	1978	64.8	10.8	道路橋	2015	II	2020	II	2025						●					○						
1138	7044	大道橋	西部建設事務所東広島支所	広島県	東広島市	国道432号	1961	9.2	7.5	道路橋	2015	II	2020	II	2025						●					○						
1139	7045	大道側道橋	西部建設事務所東広島支所	広島県	東広島市	国道432号	1989	10.1	1.8	道路橋	2015	II	2020	II	2025						●					○						
1140	7046	新小田橋	西部建設事務所東広島支所	広島県	東広島市	国道432号	1968	80.3	7.8	道路橋	2015	II	2020	I	2025	2025	2026	115	断面修復工	●						○□	☆					
1141	704601	重楽橋	西部建設事務所東広島支所	広島県	東広島市	県道東広島白木線	1977	13.2	9	道路橋	2018	I	2023	I	2028														○			
1142	704602	大谷橋	西部建設事務所東広島支所	広島県	東広島市	県道東広島白木線	1977	9.5	8.4	道路橋	2018	I	2023	I	2028														○			
1143	704603	半川橋	西部建設事務所東広島支所	広島県	東広島市	県道東広島白木線	1970	7.4	11.7	道路橋	2018	I	2023	II	2028														○			
1144	7047	友待橋	西部建設事務所東広島支所	広島県	東広島市	国道486号	1957	3.5	9	道路橋	2015	II	2020	II	2025						●					○						
1145	7050	さかせ橋(上り)	西部建設事務所東広島支所	広島県	東広島市	国道486号	1988	10.7	7.9	道路橋	2015	II	2020	II	2025						●					○						
1146	7053	さかせ橋(側道橋上り)	西部建設事務所東広島支所	広島県	東広島市	国道486号	1988	13.7	3.5	道路橋	2015	II	2020	II	2025						●					○						
1147	7054	下田橋	西部建設事務所東広島支所	広島県	東広島市	国道486号	1949	7.4	8	道路橋	2015	II	2020	II	2025						●					○						
1148	7057	新馬場田橋	西部建設事務所東広島支所	広島県	東広島市	県道吉舎豊栄線	1974	66	7.6	道路橋	2016	I	2021	II	2026							●										
1149	7058	奥吉橋	西部建設事務所東広島支所	広島県	東広島市	県道吉舎豊栄線	1967	6.2	10	道路橋	2016	II	2021	II	2026							●					○					
1150	7059	息吹橋	西部建設事務所東広島支所	広島県	東広島市	県道吉田豊栄線	1990	23.5	9.5	道路橋	2017	I	2022	I	2027								●						○			
1151	705902	中島橋	西部建設事務所東広島支所	広島県																												

No.	橋梁番号	施設名	事務所名	所在地		路線名	架設年度	橋長 (m)	幅員 (m)	橋梁種別	1巡目点検		最新の点検結果		次回点検	令和7年度から令和10年度までの修繕計画				点検・修繕計画									備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
											点検年度	健全度	点検年度	健全度						点検年度	○：定期点検(予定), □:修繕着手(予定), ☆：修繕完了(予定) ●：定期点検済, ■:修繕着手済, ★：修繕完了済																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
				実績											計画																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
				県名	市町名										2020	2021	2022	2023	2024		2025	2026	2027	2028																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
1193	7106	神田橋	西部建設事務所東広島支所	広島県	東広島市	県道安芸津下三永線	1956	10.7	10.8	道路橋	2016	I	2021	I	2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

No.	橋梁番号	施設名	事務所名	所在地		路線名	架設年度	橋長 (m)	幅員 (m)	橋梁種別	1巡目点検		最新の点検結果		次回点検	令和7年度から令和10年度までの修繕計画				点検・修繕計画 ○：定期点検(予定), □:修繕着手(予定), ☆：修繕完了(予定) ●：定期点検済, ■:修繕着手済, ★：修繕完了済								備考		
				県名	市町名						点検年度	健全度	点検年度	健全度		点検年度	修繕着手年度	修繕完了年度	概算工事費 (100万円)	主な修繕内容	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2027	2028
1270	7200	養神橋	西部建設事務所東広島支所	広島県	東広島市	県道三和大和線	1992	9.1	9.8	道路橋	2018	I	2023	I	2028												○			
1271	7201	農園橋	西部建設事務所東広島支所	広島県	東広島市	県道小河原志和線	1959	2.6	4.7	道路橋	2017	I	2022	I	2027												○			
1272	7202	向山上橋	西部建設事務所東広島支所	広島県	東広島市	県道小河原志和線	1962	3.1	4.9	道路橋	2017	I	2022	I	2027												○			
1273	7203	江川下橋	西部建設事務所東広島支所	広島県	東広島市	県道風早停車場線	1931	3.1	4.7	道路橋	2016	II	2021	II	2026															
1274	7204	無名橋	西部建設事務所東広島支所	広島県	東広島市	県道風早停車場線	1965	2.3	4.7	道路橋	2018	I	2023	I	2028												○			
1275	7205	江川橋	西部建設事務所東広島支所	広島県	東広島市	県道風早停車場線	1961	4.2	5.1	道路橋	2016	I	2021	I	2026												○			
1276	7207	無名ボックス	西部建設事務所東広島支所	広島県	東広島市	県道下三永吉川線	1983	2.9	11.6	道路橋	2017	I	2022	I	2027												○			
1277	7208	無名ボックス	西部建設事務所東広島支所	広島県	東広島市	県道下三永吉川線	1983	2.4	17.2	道路橋	2017	I	2022	I	2027												○			
1278	7209	無名ボックス	西部建設事務所東広島支所	広島県	東広島市	県道下三永吉川線	1983	3	16.3	道路橋	2017	I	2022	I	2027												○			
1279	7211	中郷橋	西部建設事務所東広島支所	広島県	東広島市	県道下三永吉川線	1989	5.1	10.1	道路橋	2016	I	2021	I	2026															
1280	7214	無名ボックス	西部建設事務所東広島支所	広島県	東広島市	県道下三永吉川線	1983	3.2	10.7	道路橋	2017	I	2022	I	2027												○			
1281	7220	柳国橋	西部建設事務所東広島支所	広島県	東広島市	県道小多田安浦線	1994	8.6	6.4	道路橋	2018	II	2023	II	2028												○			
1282	7221	ゴンゲン橋	西部建設事務所東広島支所	広島県	東広島市	県道小多田安浦線	1935	5.1	5.4	道路橋	2016	I	2021	I	2026															
1283	7224	箕越橋	西部建設事務所東広島支所	広島県	東広島市	県道小多田安浦線	1935	5.4	6	道路橋	2016	I	2021	I	2026												○			
1284	7225	無名ボックス	西部建設事務所東広島支所	広島県	東広島市	県道小多田安浦線	1995	2.8	14.9	道路橋	2018	I	2023	I	2028												○			
1285	7226	無名橋	西部建設事務所東広島支所	広島県	東広島市	県道津江八本松線	2007	3	7.7	道路橋	2017	I	2022	II	2027															
1286	7227	無名ボックス	西部建設事務所東広島支所	広島県	東広島市	県道津江八本松線	2007	2.6	4	道路橋	2017	I	2022	I	2027												○			
1287	7228	清水橋	西部建設事務所東広島支所	広島県	東広島市	県道津江八本松線	1977	9.3	8	道路橋	2018	I	2023	II	2028												○			
1288	7229	マエダ橋	西部建設事務所東広島支所	広島県	東広島市	県道津江八本松線	1965	3.5	11.6	道路橋	2017	I	2022	I	2027															
1289	7231	姫ヶ池橋	西部建設事務所東広島支所	広島県	東広島市	県道津江八本松線	1955	5.5	7.9	道路橋	2016	II	2021	II	2026												○			
1290	7232	無名ボックス	西部建設事務所東広島支所	広島県	東広島市	県道津江八本松線	1997	4.2	14.5	道路橋	2017	I	2022	I	2027												○			
1291	7233	タカノ橋	西部建設事務所東広島支所	広島県	東広島市	県道津江八本松線	1954	4.1	15.1	道路橋	2016	I	2021	I	2026															
1292	7234	無名橋	西部建設事務所東広島支所	広島県	東広島市	県道津江八本松線	1978	5.3	6.2	道路橋	2018	I	2023	I	2028												○			
1293	7239	上条二橋	西部建設事務所東広島支所	広島県	東広島市	県道津江郷原線	1955	3.7	4.6	道路橋	2016	III	2021	III	2026												○			
1294	7240	上条橋	西部建設事務所東広島支所	広島県	東広島市	県道津江郷原線	1935	2.5	7.9	道路橋	2016	II	2021	II	2026												○			
1295	7241	土井沖橋	西部建設事務所東広島支所	広島県	東広島市	県道下竹仁久芳線	1989	7.9	9.8	道路橋	2018	II	2023	I	2028												○			
1296	7242	金本橋	西部建設事務所東広島支所	広島県	東広島市	県道古原清武線	1981	6	7.6	道路橋	2018	II	2023	II	2028												○			
1297	7244	二反田橋	西部建設事務所東広島支所	広島県	東広島市	県道河戸豊栄線	1961	4.6	4.8	道路橋	2017	I	2022	II	2027												○			
1298	7246	無名ボックス	西部建設事務所東広島支所	広島県	東広島市	県道小田白市線	1984	2.6	7.5	道路橋	2018	I	2023	I	2028												○			
1299	7247	後畑橋	西部建設事務所東広島支所	広島県	東広島市	県道小田白市線	1953	3.4	4	道路橋	2016	II	2021	I	2026															
1300	7248	中山川橋	西部建設事務所東広島支所	広島県	東広島市	県道小田白市線	1961	4.3	5.4	道路橋	2016	II	2021	II	2026												○			
1301	7250	サカイ橋	西部建設事務所東広島支所	広島県	東広島市	県道小田白市線	1960	4	4.6	道路橋	2016	I	2021	I	2026												○			
1302	7251	カミダニ橋	西部建設事務所東広島支所	広島県	東広島市	県道小田白市線	1961	4.9	4.5	道路橋	2017	II	2022	II	2027															
1303	7252	マルヤマ橋	西部建設事務所東広島支所	広島県	東広島市	県道小田白市線	1961	2.3	4.6	道路橋	2016	II	2021	I	2026												○			
1304	7253	貞重橋	西部建設事務所東広島支所	広島県	東広島市	県道小田白市線	1930	6.1	4.9	道路橋	2016	II	2021	II	2026												○			
1305	7254	中筋橋	西部建設事務所東広島支所	広島県	東広島市	県道小田白市線	1965	6.2	4.8	道路橋	2018	II	2023	III	2028													○		
1306	7255	サカシタ橋	西部建設事務所東広島支所	広島県	東広島市	県道小田白市線	1961	3.4	4.8	道路橋	2017	II	2022	I	2027												○			
1307	7256	カミアリタ橋	西部建設事務所東広島支所	広島県	東広島市	県道造賀八本松線	1972	2.8	7.9	道路橋	2016	II	2021	II	2026												○			
1308	7257	ナカムネ橋	西部建設事務所東広島支所	広島県	東広島市	県道造賀八本松線	1964</																							

No.	橋梁番号	施設名	事務所名	所在地		路線名	架設年度	橋長 (m)	幅員 (m)	橋梁種別	1巡目点検		最新の点検結果		次回点検	令和7年度から令和10年度までの修繕計画				点検・修繕計画 ○：定期点検(予定), □:修繕着手(予定), ☆：修繕完了(予定) ●：定期点検済, ■:修繕着手済, ★：修繕完了済							備考	
				県名	市町名						点検年度	健全度	点検年度	健全度		点検年度	修繕着手年度	修繕完了年度	概算工事費 (100万円)	主な修繕内容	実績 計画							
																					2020	2021	2022	2023	2024	2025		2026
1347	7322	無名橋01	西部建設事務所東広島支所	広島県	東広島市	県道瀬野川福富本郷線	2001	2.7	8.5	道路橋	2014	I	2024	I	2029						●							
1348	7323	無名橋02	西部建設事務所東広島支所	広島県	東広島市	県道瀬野川福富本郷線	2001	2.6	6.5	道路橋	2014	I	2024	I	2029						●							
1349	7324	無名橋03	西部建設事務所東広島支所	広島県	東広島市	県道瀬野川福富本郷線	2019	3.8	7.6	道路橋	2014	II	2024	I	2029						●							
1350	7327	無名ボックス02	西部建設事務所東広島支所	広島県	東広島市	県道矢野安浦線	1986	3.5	12.2	道路橋	2014	I	2024	I	2029						●							
1351	7328	無名ボックス03	西部建設事務所東広島支所	広島県	東広島市	県道矢野安浦線	1986	3	21.4	道路橋	2014	I	2															

No.	橋梁番号	施設名	事務所名	所在地		路線名	架設年度	橋長 (m)	幅員 (m)	橋梁種別	1巡目点検		最新の点検結果		次回点検	令和7年度から令和10年度までの修繕計画				点検・修繕計画 ○：定期点検(予定), □:修繕着手(予定), ☆：修繕完了(予定) ●：定期点検済, ■:修繕着手済, ★：修繕完了済								備考		
				県名	市町名						点検年度	健全度	点検年度	健全度		点検年度	修繕着手年度	修繕完了年度	概算工事費 (100万円)	主な修繕内容	実績 計画									
																					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2027	2028
1424	8030	原下橋	西部建設事務所東広島支所	広島県	大崎上島町	県道大崎上島循環線	1979	6	15.7	道路橋	2016	I	2021	I	2026							●								
1425	8031	大田橋	西部建設事務所東広島支所	広島県	大崎上島町	県道大崎上島循環線	1981	6.8	11.6	道路橋	2016	II	2021	I	2026							●								
1426	8032	大田橋側道橋	西部建設事務所東広島支所	広島県	大崎上島町	県道大崎上島循環線	1981	8.8	2	道路橋	2016	II	2021	I	2026							●								
1427	8033	大田1号橋	西部建設事務所東広島支所	広島県	大崎上島町	県道大崎上島循環線	1981	7.7	10.3	道路橋	2016	I	2021	I	2026							●								
1428	8034	象頭橋	西部建設事務所東広島支所	広島県	大崎上島町	県道大崎上島循環線	1981	2.2	10.6	道路橋	2016	II	2021	II	2026															
1429	8035	新港橋	西部建設事務所東広島支所	広島県	大崎上島町	県道大崎上島循環線	2009	6.9	22	道路橋	2016	I	2021	I	2026							●								
1430	8036	不明065-04	西部建設事務所東広島支所	広島県	大崎上島町	県道大崎上島循環線	1981	3	5.6	道路橋	2016	II	2021	II	2026							●								
1431	8037	垂水橋	西部建設事務所東広島支所	広島県	大崎上島町	県道大崎上島循環線	1978	3.3	8.7	道路橋	2017	III	2022	I	2027							■								
1432	8038	鯨崎1号橋	西部建設事務所東広島支所	広島県	大崎上島町	県道大崎上島循環線	1970	21	7.3	道路橋	2017	II	2022	II	2027															
1433	8039	鯨崎2号橋	西部建設事務所東広島支所	広島県	大崎上島町	県道大崎上島循環線	1970	32.7	6.5	道路橋	2016	III	2021	II	2026							●								
1434	8040	岩白下橋	西部建設事務所東広島支所	広島県	大崎上島町	県道大崎上島循環線	1965	2.1	4.7	道路橋	2017	II	2022	II	2027															
1435	8041	中央橋	西部建設事務所東広島支所	広島県	大崎上島町	県道大崎上島循環線	1958	3.6	6.7	道路橋	2016	I	2021	I	2026							●								
1436	8042	地藏平橋	西部建設事務所東広島支所	広島県	大崎上島町	県道大崎上島循環線	1958	3.5	7.9	道路橋	2016	II	2021	II	2026							●								
1437	8044	不明065-06	西部建設事務所東広島支所	広島県	大崎上島町	県道大崎上島循環線	1970	108.9	4	道路橋	2016	III	2021	I	2026							●								
1438	8045	野賀橋	西部建設事務所東広島支所	広島県	大崎上島町	県道大崎上島循環線	1964	3	10.3	道路橋	2016	I	2021	II	2026							●								
1439	8046	柿之浦橋	西部建設事務所東広島支所	広島県	大崎上島町	県道大崎上島循環線	1990	13	8.8	道路橋	2016	III	2021	III	2026	2020		2025	16	断面修復工	■	●					☆	○		
1440	8047	不明065-07	西部建設事務所東広島支所	広島県	大崎上島町	県道大崎上島循環線	1984	3.7	9.5	道路橋	2017	I	2022	I	2027															
1441	8052	不明065-11	西部建設事務所東広島支所	広島県	大崎上島町	県道大崎上島循環線	1984	2.4	11.4	道路橋	2017	II	2022	II	2027															
1442	8053	明石橋	西部建設事務所東広島支所	広島県	大崎上島町	県道大崎上島循環線	1969	86.4	2.3	道路橋	2017	III	2024	I	2029						■									
1443	8054	大正橋	西部建設事務所東広島支所	広島県	大崎上島町	県道大崎上島循環線	1971	7.6	13.1	道路橋	2017	III	2022	I	2027						■									
1444	8055	不明065-12	西部建設事務所東広島支所	広島県	大崎上島町	県道大崎上島循環線	1995	5.7	10	道路橋	2017	I	2022	I	2027															
1445	8057	不明065-14	西部建設事務所東広島支所	広島県	大崎上島町	県道大崎上島循環線	1995	4	12.4	道路橋	2017	I	2022	I	2027															
1446	8062	梅ヶ浜橋	西部建設事務所東広島支所	広島県	大崎上島町	県道大西大西港線	1966	17	6.8	道路橋	2017	II	2022	II	2027															
1447	8063	玉尻橋	西部建設事務所東広島支所	広島県	大崎上島町	県道大西大西港線	1965	11.1	6.8	道路橋	2017	II	2022	II	2027															
1448	8064	長江橋	西部建設事務所東広島支所	広島県	大崎上島町	県道大西大西港線	1961	7.5	6.5	道路橋	2016	II	2021	III	2026															
1449	8065	大久保橋	西部建設事務所東広島支所	広島県	大崎上島町	県道大田木ノ江線	1965	2	21	道路橋	2016	II	2021	III	2026	2020		2025	13	断面修復工	■	●					☆	○		
1450	8066	清水橋	西部建設事務所東広島支所	広島県	大崎上島町	県道大田木ノ江線	1965	2.4	6.4	道路橋	2016	II	2021	I	2026							●								
1451	8074	釜橋	西部建設事務所東広島支所	広島県	竹原市	県道上三永竹原線	2002	99.5	11	道路橋	2018	I	2023	II	2028															
1452	8077	大谷橋	西部建設事務所東広島支所	広島県	竹原市	県道上三永竹原線	1999	45	11	道路橋	2018	I	2023	II	2028															
1453	8078	新立掛橋	西部建設事務所東広島支所	広島県	竹原市	県道上三永竹原線	1998	21.8	11.2	道路橋	2018	I	2023	II	2028															
1454	8079	立掛橋	西部建設事務所東広島支所	広島県	竹原市	県道上三永竹原線	1959	16.4	5.1	道路橋	2016	I	2021	I	2026							●								
1455	8082	宝貴橋	西部建設事務所東広島支所	広島県	竹原市	県道上三永竹原線	2001	33.1	10.5	道路橋	2018	I	2023	I	2028															
1456	8083	吉名陸橋	西部建設事務所東広島支所	広島県	竹原市	県道竹原吉名線	1998	180	9	道路橋	2017	I	2022	I	2027															
1457	80831	天池橋	西部建設事務所東広島支所	広島県	竹原市	県道竹原吉名線	2007	29.5	10	道路橋	2014	I	2024	II	2029															
1458	8084	下の奥橋	西部建設事務所東広島支所	広島県	竹原市	県道上三永竹原線	2003	85	11.5	道路橋	2018	I	2023	I	2028															
1459	8085	仁賀大橋	西部建設事務所東広島支所	広島県	竹原市	県道上三永竹原線	2005	116.8	10.8	道路橋	2018	I	2023	III	2028	2026		2027	20	部分塗装工										
1460	8086	田ノ浦大橋	西部建設事務所東広島支所																											

No.	橋梁番号	施設名	事務所名	所在地		路線名	架設年度	橋長 (m)	幅員 (m)	橋梁種別	1巡目点検		最新の点検結果		次回点検	令和7年度から令和10年度までの修繕計画				点検・修繕計画 ○：定期点検(予定), □:修繕着手(予定), ☆：修繕完了(予定) ●：定期点検済, ■:修繕着手済, ★：修繕完了済計画								備考		
				県名	市町名						点検年度	健全度	点検年度	健全度		点検年度	修繕着手年度	修繕完了年度	概算工事費 (100万円)	主な修繕内容	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2027	2028
1501	10010	高諸川橋	東部建設事務所	広島県	福山市	国道2号	1991	10	16	道路橋	2015	Ⅱ	2020	Ⅱ	2025					●					○					
1502	10011	真川橋	東部建設事務所	広島県	福山市	国道2号	1957	68.5	9.5	道路橋	2015	Ⅲ	2020	Ⅰ	2025					●					○					
1503	10012	真川側道橋（上流側）	東部建設事務所	広島県	福山市	国道2号	1979	68.5	2.4	道路橋	2015	Ⅱ	2020	Ⅲ	2025	2024	2025	13	部分塗装工, 断面修復工, ひび割れ注入工, 支保補修工	●				■	○☆					
1504	10013	真川側道橋（下流側）	東部建設事務所	広島県	福山市	国道2号	1979	68.5	2.4	道路橋	2015	Ⅲ	2020	Ⅲ	2025					●	■		■	★	○					
1505	10014	神田橋	東部建設事務所	広島県	神石高原町	国道182号	1973	8.7	8	道路橋	2015	Ⅱ	2020	Ⅱ	2025					●					○					
1506	10015	下谷新橋	東部建設事務所	広島県	神石高原町	国道182号	1988	13.5	11.3	道路橋	2015	Ⅱ	2020	Ⅱ	2025					●					○					
1507	10016	大渡橋	東部建設事務所	広島県	神石高原町	国道182号	1982	72	11.2	道路橋	2015	Ⅱ	2020	Ⅱ	2025					●					○					
1508	10017	小谷橋	東部建設事務所	広島県	神石高原町	国道182号	1982	15.7	11.3	道路橋	2015	Ⅲ	2020	Ⅱ	2025					●					○					
1509	10018	自割谷橋	東部建設事務所	広島県	神石高原町	国道182号	1982	15.7	11.6	道路橋	2015	Ⅱ	2020	Ⅱ	2025					●					○					
1510	10019	白滝橋	東部建設事務所	広島県	神石高原町	国道182号	1982	18.7	11.2	道路橋	2015	Ⅱ	2020	Ⅱ	2025					●					○					
1511	10020	迫ノ谷橋	東部建設事務所	広島県	神石高原町	国道182号	1982	15.7	11.3	道路橋	2015	Ⅱ	2020	Ⅱ	2025					●					○					
1512	10021	河内橋	東部建設事務所	広島県	神石高原町	国道182号	1968	7.5	8.5	道路橋	2015	Ⅱ	2020	Ⅱ	2025					●					○					
1513	10022	明治橋	東部建設事務所	広島県	神石高原町	国道182号	1968	24.5	8.9	道路橋	2015	Ⅱ	2020	Ⅲ	2025					●				★	○					
1514	10023	神折橋	東部建設事務所	広島県	神石高原町	国道182号	1969	17.6	12.1	道路橋	2015	Ⅲ	2020	Ⅱ	2025					●					○					
1515	10024	高山橋	東部建設事務所	広島県	福山市	国道182号	1990	50.2	8.5	道路橋	2015	Ⅱ	2020	Ⅱ	2025					●					○					
1516	10025	道城橋	東部建設事務所	広島県	福山市	国道182号	1990	60	7.5	道路橋	2015	Ⅱ	2020	Ⅱ	2025					●					○					
1517	10026	加茂川橋	東部建設事務所	広島県	福山市	国道182号	1971	31	9.5	道路橋	2015	Ⅲ	2021	Ⅱ	2026					■	●		★			○				
1518	10028	六反田川橋	東部建設事務所	広島県	福山市	国道182号	1988	45	10.9	道路橋	2015	Ⅱ	2020	Ⅱ	2025					●					○		○			
1519	10029	29無名	東部建設事務所	広島県	福山市	国道182号	不明	3.6	29.2	道路橋	2015	Ⅲ	2020	Ⅱ	2025					●■★					○					
1520	10030	30無名	東部建設事務所	広島県	福山市	国道182号	1988	9.4	23.5	道路橋	2015	Ⅱ	2020	Ⅱ	2025					●					○					
1521	10031	高屋川橋	東部建設事務所	広島県	福山市	国道182号	1971	67	11.1	道路橋	2015	Ⅲ	2021	Ⅲ	2026					●	●		★			○				
1522	10032	32無名	東部建設事務所	広島県	福山市	国道182号	1964	3.8	27.7	道路橋	2015	Ⅱ	2020	Ⅱ	2025					●					○					
1523	10033	金光橋	東部建設事務所	広島県	福山市	国道313号	1940	7.4	9.5	道路橋	2015	Ⅱ	2020	Ⅰ	2025					●					○					
1524	10034	金光側道橋	東部建設事務所	広島県	福山市	国道313号	不明	13.1	3.3	道路橋	2015	Ⅱ	2020	Ⅱ	2025					●					○					
1525	10035	35無名	東部建設事務所	広島県	福山市	国道313号	不明	7.5	9.4	道路橋	2015	Ⅲ	2020	Ⅰ	2025					●					○					
1526	10037	35無名側道橋（右側）	東部建設事務所	広島県	福山市	国道313号	不明	5.5	2.4	道路橋	2015	Ⅱ	2020	Ⅱ	2025					●					○					
1527	10040	大峠側道橋	東部建設事務所	広島県	福山市	国道313号	不明	10	2.5	道路橋	2015	Ⅲ	2020	Ⅱ	2025					●■★					○					
1528	10041	41無名	東部建設事務所	広島県	福山市	国道313号	1990	4	15	道路橋	2015	Ⅱ	2020	Ⅱ	2025					●					○					
1529	10042	42無名	東部建設事務所	広島県	福山市	国道313号	1990	9.8	11	道路橋	2015	Ⅱ	2020	Ⅱ	2025					●					○					
1530	10043	矢多田橋	東部建設事務所	広島県	府中市	国道432号	1990	16.1	12.5	道路橋	2015	Ⅱ	2020	Ⅱ	2025					●					○					
1531	10044	新大幸橋	東部建設事務所	広島県	府中市	国道432号	1992	23	12.5	道路橋	2015	Ⅱ	2020	Ⅱ	2025					●					○					
1532	10045	先谷橋	東部建設事務所	広島県	府中市	国道432号	1965	3.9	7	道路橋	2015	Ⅱ	2020	Ⅱ	2025					●					○					
1533	10046	尾田部橋	東部建設事務所	広島県	府中市	国道432号	1967	5.6	5.7	道路橋	2015	Ⅰ	2020	Ⅰ	2025					●					○					
1534	10047	道目田橋	東部建設事務所	広島県	府中市	国道432号	1967	7.9	10.8	道路橋	2015	Ⅱ	2020	Ⅱ	2025					●					○					
1535	10049	嵯峨橋	東部建設事務所	広島県	府中市	国道432号	1976	30.6	11.2	道路橋	2015	Ⅲ	2020	Ⅰ	2025					●					○					
1536	10050	高山上橋	東部建設事務所	広島県	福山市	国道182号	1977	24	4.3	道路橋	2014	Ⅰ	2024	Ⅱ	2029									●						
1537	10051	良橋	東部建設事務所	広島県	福山市	国道486号	1987	10	44	道路橋	2015	Ⅱ	2020	Ⅱ	2025					●					○					
1538	10052	良Box	東部建設事務所	広島県	福山市	国道486号	不明	5.4	22	道路橋	2015	Ⅱ	2020	Ⅱ	2025															

No.	橋梁番号	施設名	事務所名	所在地		路線名	架設年度	橋長(m)	幅員(m)	橋梁種別	1巡目点検		最新の点検結果		次回点検	令和7年度から令和10年度までの修繕計画				点検・修繕計画 ○：定期点検(予定), □:修繕着手(予定), ☆：修繕完了(予定) ●：定期点検済, ■:修繕着手済, ★：修繕完了済計画								備考		
				県名	市町名						点検年度	健全度	点検年度	健全度		点検年度	修繕着手年度	修繕完了年度	概算工事費(100万円)	主な修繕内容	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2027	2028
1578	10100	戸羽2号橋	東部建設事務所	広島県	府中市	県道府中上下線	1981	24.9	8	道路橋	2015	Ⅱ	2020	Ⅱ	2025					●					○					
1579	10101	戸羽3号橋	東部建設事務所	広島県	府中市	県道府中上下線	1981	23.6	8.8	道路橋	2015	Ⅱ	2020	Ⅱ	2025					●					○					
1580	10102	斗升橋	東部建設事務所	広島県	府中市	県道府中上下線	1978	19.6	8.5	道路橋	2015	Ⅱ	2020	Ⅲ	2025					●					○					
1581	10103	平山橋	東部建設事務所	広島県	府中市	県道府中上下線	1971	10.4	7.7	道路橋	2015	Ⅲ	2020	Ⅱ	2025					●					○					
1582	10104	平山側道橋	東部建設事務所	広島県	府中市	県道府中上下線	不明	10.4	2.9	道路橋	2015	Ⅰ	2020	Ⅰ	2025					●					○					
1583	10105	末原橋	東部建設事務所	広島県	府中市	県道府中上下線	1950	4.1	10.3	道路橋	2015	Ⅱ	2020	Ⅱ	2025					●					○					
1584	10107	ふけ田橋	東部建設事務所	広島県	府中市	県道府中上下線	1968	12	12.6	道路橋	2015	Ⅱ	2020	Ⅱ	2025					●					○					
1585	10109	半田橋	東部建設事務所	広島県	府中市	県道府中上下線	1968	16.3	10.2	道路橋	2015	Ⅱ	2020	Ⅱ	2025					●					○					
1586	10111	直線橋	東部建設事務所	広島県	府中市	県道府中上下線	1970	29.8	8.2	道路橋	2015	Ⅱ	2020	Ⅱ	2025					●					○					
1587	10112	天領橋	東部建設事務所	広島県	府中市	県道三原東城線	1975	19.2	10.9	道路橋	2016	Ⅲ	2021	Ⅲ	2026						●	■					○			
1588	10113	二森橋	東部建設事務所	広島県	府中市	県道三原東城線	1973	23.7	8.5	道路橋	2016	Ⅲ	2021	Ⅲ	2026						●	■	★				○			
1589	10114	二森側道橋	東部建設事務所	広島県	府中市	県道三原東城線	1983	23.7	2	道路橋	2016	Ⅱ	2021	Ⅲ	2026	2023	2025	13	部分塗替工, 支承補修工		●		■			☆	○			
1590	10115	善明橋	東部建設事務所	広島県	府中市	県道三原東城線	1969	22	14.3	道路橋	2016	Ⅰ	2021	Ⅲ	2026	2023	2025	13	部分塗替工, ひび割れ注入工, 支承補修工		●		■			☆	○			
1591	10116	116無名	東部建設事務所	広島県	府中市	県道三原東城線	不明	2.3	13.8	道路橋	2016	Ⅰ	2021	Ⅱ	2026						●					○				
1592	10118	岩崎橋	東部建設事務所	広島県	府中市	県道三原東城線	不明	3	11.9	道路橋	2016	Ⅱ	2021	Ⅰ	2026						●					○				
1593	10119	119無名	東部建設事務所	広島県	府中市	県道三原東城線	不明	2	12.7	道路橋	2016	Ⅱ	2021	Ⅱ	2026						●					○				
1594	10120	宮前橋	東部建設事務所	広島県	府中市	県道三原東城線	1983	7.7	9	道路橋	2016	Ⅰ	2021	Ⅱ	2026						●					○				
1595	10121	丸山橋	東部建設事務所	広島県	神石高原町	県道三原東城線	1968	8.5	8.8	道路橋	2016	Ⅱ	2021	Ⅱ	2026						●					○				
1596	10122	加賀羅橋	東部建設事務所	広島県	神石高原町	県道三原東城線	1975	19	8	道路橋	2016	Ⅲ	2021	Ⅰ	2026						●					○				
1597	10123	土居橋	東部建設事務所	広島県	神石高原町	県道三原東城線	1989	27.2	10.1	道路橋	2016	Ⅱ	2021	Ⅱ	2026						●					○				
1598	10124	出雲橋	東部建設事務所	広島県	神石高原町	県道三原東城線	1989	16.8	9.8	道路橋	2016	Ⅲ	2021	Ⅲ	2026	2026	2026	7	断面修復工		●					○□☆				
1599	10125	宇賀別橋	東部建設事務所	広島県	神石高原町	県道三原東城線	1988	17.6	9.8	道路橋	2016	Ⅲ	2021	Ⅲ	2026						●■	■	★			○				
1600	10126	岩石橋	東部建設事務所	広島県	神石高原町	県道三原東城線	1968	2.5	9	道路橋	2016	Ⅱ	2021	Ⅱ	2026						●					○				
1601	10127	常磐橋	東部建設事務所	広島県	神石高原町	県道三原東城線	1975	7.3	7.8	道路橋	2016	Ⅱ	2021	Ⅱ	2026						●					○				
1602	10128	殿敷橋	東部建設事務所	広島県	神石高原町	県道三原東城線	1975	11.5	7.8	道路橋	2016	Ⅲ	2021	Ⅱ	2026						●					○				
1603	10129	大仙橋	東部建設事務所	広島県	神石高原町	県道三原東城線	1977	13.8	8	道路橋	2016	Ⅲ	2021	Ⅲ	2026						●■	■	★			○				
1604	10130	高光郷橋	東部建設事務所	広島県	神石高原町	県道三原東城線	1965	5	7.4	道路橋	2016	Ⅱ	2021	Ⅱ	2026						●					○				
1605	10132	土井橋	東部建設事務所	広島県	神石高原町	県道三原東城線	1998	16.9	11.5	道路橋	2016	Ⅰ	2021	Ⅱ	2026						●					○				
1606	10133	大滝上橋	東部建設事務所	広島県	神石高原町	県道三原東城線	1991	21.3	11	道路橋	2016	Ⅱ	2021	Ⅰ	2026						●					○				
1607	10134	大滝下橋	東部建設事務所	広島県	神石高原町	県道三原東城線	1993	33.2	11	道路橋	2016	Ⅱ	2021	Ⅱ	2026						●					○				
1608	10135	田中橋	東部建設事務所	広島県	府中市	県道吉舎油木線	1972	24.2	7.2	道路橋	2016	Ⅲ	2021	Ⅲ	2026						●★					○				
1609	10136	田中側道橋	東部建設事務所	広島県	府中市	県道吉舎油木線	不明	24.2	3	道路橋	2016	Ⅲ	2021	Ⅲ	2026						●★					○				
1610	10137	木頃橋	東部建設事務所	広島県	府中市	県道吉舎油木線	1935	4	15	道路橋	2016	Ⅰ	2021	Ⅱ	2026						●					○				
1611	10138	友広橋	東部建設事務所	広島県	府中市	県道吉舎油木線	2004	5.4	10.8	道路橋	2016	Ⅲ	2021	Ⅲ	2026						●■			■		○				
1612	10139	胡平前橋	東部建設事務所	広島県	府中市	県道新市七曲西城線	1984	9.2	9.8	道路橋	2017	Ⅰ	2022	Ⅰ	2027							●						○		
1613	10140	新妙見橋	東部建設事務所	広島県	府中市	県道新市七曲西城線	1993	25.5	9.7	道路橋	2017	Ⅰ	2022	Ⅰ	2027							●								

No.	橋梁番号	施設名	事務所名	所在地		路線名	架設年度	橋長 (m)	幅員 (m)	橋梁種別	1巡目点検		最新の点検結果		次回点検	令和7年度から令和10年度までの修繕計画				点検・修繕計画 ○：定期点検(予定), □:修繕着手(予定), ☆：修繕完了(予定) ●：定期点検済, ■:修繕着手済, ★：修繕完了済計画								備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
				県名	市町名						点検年度	健全度	点検年度	健全度		点検年度	修繕着手年度	修繕完了年度	概算工事費 (100万円)	主な修繕内容	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2027	2028																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
1655	10215	15ボックス	東部建設事務所	広島県	福山市	県道加茂油木線	不明	4.3	21.2	道路橋	2018	I	2023	I	2028																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

No.	橋梁番号	施設名	事務所名	所在地		路線名	架設年度	橋長 (m)	幅員 (m)	橋梁種別	1巡目点検		最新の点検結果		次回点検	令和7年度から令和10年度までの修繕計画				点検・修繕計画 ○：定期点検(予定), □:修繕着手(予定), ☆：修繕完了(予定) ●：定期点検済, ■:修繕着手済, ★：修繕完了済計画								備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
				県名	市町名						点検年度	健全度	点検年度	健全度		点検年度	修繕着手年度	修繕完了年度	概算工事費 (100万円)	主な修繕内容	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2027	2028																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
1732	10321	24ボックス	東部建設事務所	広島県	福山市	県道鞆松永線	不明	3	12	道路橋	2016	I	2021	I	2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

No.	橋梁番号	施設名	事務所名	所在地		路線名	架設年度	橋長 (m)	幅員 (m)	橋梁種別	1巡目点検		最新の点検結果		次回点検	令和7年度から令和10年度までの修繕計画				点検・修繕計画 ○：定期点検(予定), □:修繕着手(予定), ☆：修繕完了(予定) ●：定期点検済, ■:修繕着手済, ★：修繕完了済								備考			
				県名	市町名						点検年度	健全度	点検年度	健全度		点検年度	修繕着手年度	修繕完了年度	概算工事費 (100万円)	主な修繕内容	実績 計画										
																					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2027	2028	
1809	10475	吉備津橋	東部建設事務所	広島県	神石高原町	県道帝釈峡井関線	1950	4.3	4.6	道路橋	2017	Ⅲ	2022	Ⅲ	2027									●■	★				○		
1810	10476	野谷橋	東部建設事務所	広島県	神石高原町	県道帝釈峡井関線	1957	22.2	3.5	道路橋	2017	Ⅲ	2022	Ⅲ	2027									●■	★				○		
1811	10477	金野橋	東部建設事務所	広島県	神石高原町	県道帝釈峡井関線	1959	4.1	4.1	道路橋	2017	Ⅱ	2022	Ⅱ	2027									●					○		
1812	10478	安田坂橋	東部建設事務所	広島県	神石高原町	県道帝釈峡井関線	1975	7.7	4.3	道路橋	2017	Ⅱ	2022	Ⅱ	2027									●					○		
1813	10479	野稲橋	東部建設事務所	広島県	神石高原町	県道帝釈峡井関線	1975	8.1	4.6	道路橋	2017	Ⅰ	2022	Ⅰ	2027									●					○		
1814	10480	安永野橋	東部建設事務所	広島県	神石高原町	県道帝釈峡井関線	1963	6	3.3	道路橋	2017	Ⅰ	2022	Ⅰ	2027									●					○		
1815	10481	矢萩橋	東部建設事務所	広島県	神石高原町	県道帝釈峡井関線	1965	4.4	3.8	道路橋	2017	Ⅱ	2022	Ⅱ	2027									●					○		
1816	10482	四ッ分橋	東部建設事務所	広島県	神石高原町	県道帝釈峡井関線	1965	9.8	4.4	道路橋	2017	Ⅰ	2022	Ⅰ	2027									●					○		
1817	10484	宮谷橋	東部建設事務所	広島県	神石高原町	県道帝釈峡井関線	1965	5.3	3.7	道路橋	2017	Ⅱ	2022	Ⅱ	2027									●					○		
1818	10485	不明橋	東部建設事務所	広島県	神石高原町	県道帝釈峡井関線	不明	6.4	8.1	道路橋	2017	Ⅱ	2022	Ⅱ	2027									●					○		
1819	10486	河森橋	東部建設事務所	広島県	神石高原町	県道帝釈峡井関線	1978	20.8	8.2	道路橋	2016	Ⅲ	2021	Ⅲ	2026		●									■★		○			
1820	10487	久樹橋	東部建設事務所	広島県	神石高原町	県道帝釈峡井関線	不明	3.9	9	道路橋	2017	Ⅱ	2022	Ⅱ	2027									●					○		
1821	10488	沢田橋	東部建設事務所	広島県	神石高原町	県道帝釈峡井関線	不明	2.9	11.5	道路橋	2017	Ⅱ	2022	Ⅱ	2027									●					○		
1822	10489	赤滝橋	東部建設事務所	広島県	福山市	県道藤尾井関線	1941	15.5	3.9	道路橋	2014	Ⅲ	2024	Ⅱ	2029												●				
1823	10490	一の滝橋	東部建設事務所	広島県	福山市	県道藤尾井関線	不明	12.4	3.8	道路橋	2014	Ⅲ	2024	Ⅱ	2029												●				
1824	10491	赤瀬橋	東部建設事務所	広島県	福山市	県道藤尾井関線	不明	9.9	3.7	道路橋	2014	Ⅲ	2024	Ⅱ	2029											●					
1825	10492	合流橋	東部建設事務所	広島県	福山市	県道藤尾井関線	不明	4	4	道路橋	2018	Ⅱ	2023	Ⅱ	2028										●					○	
1826	10493	不明橋	東部建設事務所	広島県	福山市	県道藤尾井関線	不明	4.8	4.4	道路橋	2014	Ⅱ	2024	Ⅰ	2029											●					
1827	10494	霧降橋	東部建設事務所	広島県	福山市	県道藤尾井関線	1970	25	4.6	道路橋	2014	Ⅱ	2024	Ⅱ	2029										●						
1828	10495	星降橋	東部建設事務所	広島県	福山市	県道藤尾井関線	1970	24.4	4.8	道路橋	2018	Ⅱ	2023	Ⅰ	2028											●				○	
1829	10496	赤滝橋	東部建設事務所	広島県	福山市	県道藤尾井関線	不明	5.3	4	道路橋	2018	Ⅰ	2023	Ⅰ	2028											●				○	
1830	10497	姿見橋	東部建設事務所	広島県	福山市	県道藤尾井関線	不明	4.7	4	道路橋	2018	Ⅰ	2023	Ⅰ	2028											●				○	
1831	10498	月見橋	東部建設事務所	広島県	福山市	県道藤尾井関線	不明	5.4	4.4	道路橋	2018	Ⅱ	2023	Ⅱ	2028											●				○	
1832	10499	平和橋	東部建設事務所	広島県	福山市	県道藤尾井関線	不明	6.4	4	道路橋	2018	Ⅰ	2023	Ⅰ	2028											●				○	
1833	10500	境橋	東部建設事務所	広島県	神石高原町	県道藤尾井関線	不明	3.7	4	道路橋	2018	Ⅰ	2023	Ⅰ	2028											●				○	
1834	10501	黒岩橋	東部建設事務所	広島県	神石高原町	県道藤尾井関線	1961	5.4	4.4	道路橋	2017	Ⅱ	2022	Ⅱ	2027									●					○		
1835	10502	岩塩城橋	東部建設事務所	広島県	神石高原町	県道藤尾井関線	1961	5	4	道路橋	2017	Ⅰ	2022	Ⅰ	2027									●					○		
1836	10503	重松上橋	東部建設事務所	広島県	神石高原町	県道藤尾井関線	不明	2.4	5.1	道路橋	2018	Ⅱ	2023	Ⅱ	2028											●				○	
1837	10504	権現橋	東部建設事務所	広島県	神石高原町	県道牧油木線	1953	8.5	4.9	道路橋	2017	Ⅱ	2022	Ⅱ	2027									●					○		
1838	10505	曾根田1号橋	東部建設事務所	広島県	神石高原町	県道牧油木線	2000	9.7	11	道路橋	2018	Ⅰ	2023	Ⅰ	2028											●				○	
1839	10506	曾根田2号橋	東部建設事務所	広島県	神石高原町	県道牧油木線	2000	10.5	11	道路橋	2018	Ⅰ	2023	Ⅰ	2028											●				○	
1840	10507	新石ヶ坪橋	東部建設事務所	広島県	神石高原町	県道牧油木線	2000	11.5	11	道路橋	2018	Ⅰ	2023	Ⅰ	2028											●				○	
1841	10508	井領橋	東部建設事務所	広島県	神石高原町	県道牧油木線	1971	2	15.5	道路橋	2018	Ⅱ	2023	Ⅱ	2028											●				○	
1842	10509	明神橋	東部建設事務所	広島県	神石高原町	県道牧油木線	1953	4.2	5	道路橋	2017	Ⅰ	2022	Ⅱ	2027									●					○		
1843	10510	阿部山橋	東部建設事務所	広島県	神石高原町	県道牧油木線	1991	38	8.9	道路橋	2018	Ⅰ	2023	Ⅱ	2028											●				○	
1844	10511	新入谷橋	東部建設事務所	広島県	神石高原町	県道牧油木線	1991	34.2	8.4	道路橋	2018	Ⅰ	2023	Ⅰ	2028											●				○	
1845	10512	熊ヶ原橋	東																												

No.	橋梁番号	施設名	事務所名	所在地		路線名	架設年度	橋長 (m)	幅員 (m)	橋梁種別	1巡目点検		最新の点検結果		次回点検	令和7年度から令和10年度までの修繕計画				点検・修繕計画 ○：定期点検(予定), □:修繕着手(予定), ☆：修繕完了(予定) ●：定期点検済, ■:修繕着手済, ★：修繕完了済計画								備考		
				県名	市町名						点検年度	健全度	点検年度	健全度		点検年度	修繕着手年度	修繕完了年度	概算工事費 (100万円)	主な修繕内容	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2027	2028
1886	10562	仮橋	東部建設事務所	広島県	福山市	県道坂瀬川駅家線	不明	2	15.5	道路橋	2018	Ⅱ	2023	Ⅱ	2028													○		
1887	10563	天神橋	東部建設事務所	広島県	福山市	県道坂瀬川駅家線	1976	15.8	7.8	道路橋	2018	Ⅱ	2023	Ⅱ	2028													○		
1888	10564	新橋	東部建設事務所	広島県	福山市	県道坂瀬川駅家線	1968	30.3	15.5	道路橋	2018	Ⅱ	2023	Ⅱ	2028													○		
1889	10565	不明橋	東部建設事務所	広島県	福山市	県道坂瀬川駅家線	不明	5.8	7	道路橋	2018	Ⅱ	2023	Ⅱ	2028													○		
1890	10567	不明橋（下り線）	東部建設事務所	広島県	福山市	県道坂瀬川駅家線	不明	2	15.5	道路橋	2018	Ⅱ	2023	Ⅲ	2028													○		
1891	10568	不明橋（上り線）	東部建設事務所	広島県	福山市	県道坂瀬川駅家線	不明	3.6	26.7	道路橋	2018	Ⅱ	2023	Ⅱ	2028													○		
1892	10569	新山橋	東部建設事務所	広島県	福山市	県道坂瀬川駅家線	1980	13.3	10.7	道路橋	2018	Ⅱ	2023	Ⅱ	2028													○		
1893	10570	服部橋	東部建設事務所	広島県	福山市	県道坂瀬川駅家線	1979	23	16	道路橋	2015	Ⅰ	2020	Ⅰ	2025												○			
1894	10571	中屋橋	東部建設事務所	広島県	神石高原町	県道原谷神石線	不明	2.3	5	道路橋	2017	Ⅰ	2022	Ⅰ	2027												○			
1895	10572	原田橋	東部建設事務所	広島県	神石高原町	県道原谷神石線	1961	3.2	4.4	道路橋	2017	Ⅰ	2022	Ⅰ	2027												○			
1896	10573	見後橋	東部建設事務所	広島県	神石高原町	県道原谷神石線	1964	2.6	3.8	道路橋	2017	Ⅰ	2022	Ⅰ	2027												○			
1897	10574	無名橋	東部建設事務所	広島県	神石高原町	県道三坂手入線	1988	8.8	7.8	道路橋	2018	Ⅰ	2023	Ⅰ	2028												○			
1898	10575	古谷橋	東部建設事務所	広島県	神石高原町	県道三坂手入線	1960	3.3	3.6	道路橋	2017	Ⅱ	2022	Ⅱ	2027															
1899	10577	高西函渠	東部建設事務所	広島県	福山市	国道2号	不明	4.8	16.1	道路橋	2015	Ⅱ	2020	Ⅱ	2025												○			
1900	10578	新妙見橋	東部建設事務所	広島県	府中市	国道432号	2004	39.5	17.8	道路橋	2015	Ⅱ	2020	Ⅱ	2025												○			
1901	10579	579無名	東部建設事務所	広島県	福山市	国道486号	不明	6.3	30.1	道路橋	2015	Ⅱ	2020	Ⅱ	2025												○			
1902	10580	580無名	東部建設事務所	広島県	福山市	国道486号	不明	8.8	30.1	道路橋	2015	Ⅰ	2020	Ⅰ	2025												○			
1903	10581	581無名	東部建設事務所	広島県	福山市	国道486号	不明	3.7	10.9	道路橋	2015	Ⅱ	2020	Ⅱ	2025												○			
1904	10582	582無名	東部建設事務所	広島県	福山市	国道486号	不明	7.3	11.2	道路橋	2015	Ⅰ	2020	Ⅰ	2025												○			
1905	10583	583無名	東部建設事務所	広島県	府中市	国道486号	1970	2.9	13.2	道路橋	2015	Ⅱ	2020	Ⅱ	2025												○			
1906	10584	川井橋	東部建設事務所	広島県	福山市	県道新市七曲西城線	2001	27.6	11	道路橋	2017	Ⅰ	2022	Ⅰ	2027															
1907	10585	新徳島橋	東部建設事務所	広島県	福山市	県道鞆松永線	1971	15	20.5	道路橋	2016	Ⅰ	2021	Ⅰ	2026												○			
1908	10586	中島大橋	東部建設事務所	広島県	福山市	県道下御領新市線	2004	18.8	12.8	道路橋	2017	Ⅱ	2022	Ⅱ	2027												○			
1909	10588	道城橋(下り)	東部建設事務所	広島県	福山市	国道182号	1990	38	8.7	道路橋	2015	Ⅱ	2020	Ⅱ	2025												○			
1910	10589	加茂川橋(下り)	東部建設事務所	広島県	福山市	国道182号	1990	31	10.7	道路橋	2015	Ⅲ	2020	Ⅱ	2025												○			
1911	10590	道上陸橋(下り)	東部建設事務所	広島県	福山市	国道182号	1989	80.2	10.8	道路橋	2014	Ⅲ	2024	Ⅰ	2029															
1912	10592	高屋川橋(下り)	東部建設事務所	広島県	福山市	国道182号	1989	67	11.1	道路橋	2015	Ⅲ	2020	Ⅱ	2025															
1913	10593	松永跨線橋	東部建設事務所	広島県	福山市	県道鞆松永線	2009	168.3	15.9	道路橋	2018	Ⅰ	2022	Ⅰ	2027												○			
1914	10594	4467ボックス	東部建設事務所	広島県	福山市	県道鞆松永線	不明	2.3	16.8	道路橋	2016	Ⅰ	2021	Ⅰ	2026												○			
1915	10595	9805ムメイ橋	東部建設事務所	広島県	福山市	県道新市七曲西城線	不明	4.3	7	道路橋	2017	Ⅱ	2022	Ⅱ	2027												○			
1916	10596	13435ムメイ橋	東部建設事務所	広島県	福山市	県道新市七曲西城線	不明	2.6	5	道路橋	2017	Ⅱ	2022	Ⅱ	2027												○			
1917	10597	13230ボックス	東部建設事務所	広島県	神石高原町	県道新市七曲西城線	不明	2.3	14.5	道路橋	2017	Ⅰ	2022	Ⅰ	2027												○			
1918	10598	下郷橋	東部建設事務所	広島県	神石高原町	県道草木高光線	2013	19.5	14	道路橋	2014	Ⅰ	2024	Ⅰ	2029															
1919	80021001	新西ノ免橋	東部建設事務所	広島県	福山市	県道加茂油木線	2009	41	11	道路橋	2014	Ⅰ	2024	Ⅰ	2029															
1920	80118201	油木大橋	東部建設事務所	広島県	神石高原町	国道182号	1982	103.6	11.2	道路橋	2015	Ⅱ	2020	Ⅱ	2025												○			
1921	80118202	川南陸橋	東部建設事務所	広島県	福山市	国道182号	1969	196.6	16.6	道路橋	2016	Ⅱ	2020	Ⅱ	2025												○			
1922	80118204	新福山陸橋（鋼桁部）	東部建設事務所	広島県	福山市	国道182号	1964	41.1	20.9	道路橋	2017	Ⅲ	2021	Ⅲ	2026	2026		2028	200	ボルト取替工、支承補修工			●		★			○□		☆
1923	8																													

No.	橋梁番号	施設名	事務所名	所在地		路線名	架設年度	橋長 (m)	幅員 (m)	橋梁種別	1巡目点検		最新の点検結果		次回点検	令和7年度から令和10年度までの修繕計画				点検・修繕計画 ○：定期点検(予定), □:修繕着手(予定), ☆：修繕完了(予定) ●：定期点検済, ■:修繕着手済, ★：修繕完了済計画								備考				
				県名	市町名						点検年度	健全度	点検年度	健全度		点検年度	修繕着手年度	修繕完了年度	概算工事費 (100万円)	主な修繕内容	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2027	2028		
1963	80207608	8130ボックス	東部建設事務所	広島県	福山市	県道神辺大門線	不明	7.8	22.6	道路橋	2017	Ⅱ	2022	Ⅱ	2027										●				○			
1964	80207609	8070ボックス	東部建設事務所	広島県	福山市	県道神辺大門線	不明	3.3	27	道路橋	2017	Ⅱ	2022	Ⅱ	2027										●				○			
1965	80310201	新唐橋	東部建設事務所	広島県	福山市	県道下御領井原線	1996	29.6	15.8	道路橋	2018	Ⅰ	2023	Ⅰ	2028											●				○		
1966	80310301	無名橋 (NO. 38)	東部建設事務所	広島県	福山市	県道七曲井原線	不明	3	12.8	道路橋	2018	Ⅰ	2023	Ⅰ	2028											●				○		
1967	80310501	小町橋	東部建設事務所	広島県	神石高原町	県道前原谷仙美線	1968	104	4.7	道路橋	2018	Ⅱ	2023	Ⅱ	2028											●				○		
1968	80315701	無名橋	東部建設事務所	広島県	福山市	県道松永新市線	不明	4	4	道路橋	2018	Ⅰ	2023	Ⅰ	2028											●				○		
1969	80315702	無名橋	東部建設事務所	広島県	福山市	県道松永新市線	不明	2.3	5	道路橋	2018	Ⅰ	2023	Ⅰ	2028											●				○		
1970	80315703	長者ヶ原橋	東部建設事務所	広島県	福山市	県道松永新市線	不明	3.6	9	道路橋	2018	Ⅱ	2023	Ⅱ	2028											●				○		
1971	80315704	永谷橋	東部建設事務所	広島県	福山市	県道松永新市線	不明	2.5	7.7	道路橋	2018	Ⅰ	2023	Ⅰ	2028											●				○		
1972	80315705	大正橋	東部建設事務所	広島県	福山市	県道松永新市線	1961	17.1	15	道路橋	2017	Ⅱ	2022	Ⅱ	2027											●				○		
1973	80315706	佐賀田橋	東部建設事務所	広島県	福山市	県道松永新市線	1985	180.6	12.8	道路橋	2014	Ⅲ	2024	Ⅲ	2029								■				●				○	
1974	80315801	大谷橋	東部建設事務所	広島県	福山市	県道尾道新市線	1961	9	5.5	道路橋	2017	Ⅱ	2022	Ⅱ	2027											●				○		
1975	80315802	大谷東橋	東部建設事務所	広島県	福山市	県道尾道新市線	1969	10.1	4.9	道路橋	2018	Ⅱ	2023	Ⅱ	2028											●				○		
1976	80315803	無名橋 (No.11+26)	東部建設事務所	広島県	福山市	県道尾道新市線	1963	3	4.8	道路橋	2017	Ⅲ	2022	Ⅲ	2027											●				○		
1977	80315804	無名橋 (No.13+32. 4)	東部建設事務所	広島県	福山市	県道尾道新市線	1963	5.9	3.4	道路橋	2017	Ⅰ	2022	Ⅰ	2027											●				○		
1978	80315805	無名橋 (No.18+39. 6)	東部建設事務所	広島県	福山市	県道尾道新市線	1963	2.1	3.1	道路橋	2017	Ⅲ	2022	Ⅰ	2027											●				○		
1979	80315806	無名橋 (No.23)	東部建設事務所	広島県	福山市	県道尾道新市線	不明	2	15.5	道路橋	2018	Ⅰ	2023	Ⅰ	2028											●				○		
1980	80315807	無名橋 (No.31+69. 4)	東部建設事務所	広島県	福山市	県道尾道新市線	不明	2.9	3.9	道路橋	2018	Ⅰ	2023	Ⅰ	2028											●				○		
1981	80315808	無名橋 (No.32+31. 4)	東部建設事務所	広島県	福山市	県道尾道新市線	不明	2	15.5	道路橋	2018	Ⅰ	2023	Ⅰ	2028											●				○		
1982	80315809	無名橋 (No.39+19)	東部建設事務所	広島県	福山市	県道尾道新市線	1950	2.5	3.5	道路橋	2017	Ⅱ	2022	Ⅱ	2027											●				○		
1983	80315810	無名橋 (No.49)	東部建設事務所	広島県	福山市	県道尾道新市線	不明	7.4	3.5	道路橋	2018	Ⅱ	2023	Ⅱ	2028											●				○		
1984	80315811	無名橋 (No.60+30)	東部建設事務所	広島県	福山市	県道尾道新市線	2010	2.8	9.8	道路橋	2018	Ⅰ	2023	Ⅰ	2028											●				○		
1985	80315812	枝広橋	東部建設事務所	広島県	福山市	県道尾道新市線	1971	13.8	8.7	道路橋	2014	Ⅱ	2024	Ⅱ	2029											●						
1986	80315814	梅ノ木橋	東部建設事務所	広島県	福山市	県道尾道新市線	1971	6.1	7.5	道路橋	2016	Ⅰ	2021	Ⅰ	2026										●				○			
1987	80318101	堂々橋	東部建設事務所	広島県	福山市	県道下御領新市線	不明	7.3	8.2	道路橋	2018	Ⅰ	2023	Ⅰ	2028												●				○	
1988	80318102	境橋	東部建設事務所	広島県	福山市	県道下御領新市線	不明	11.2	7.5	道路橋	2018	Ⅰ	2023	Ⅱ	2028												●				○	
1989	80318103	境橋側道橋	東部建設事務所	広島県	福山市	県道下御領新市線	不明	16	3.1	道路橋	2018	Ⅰ	2023	Ⅰ	2028												●				○	
1990	80318104	樗久橋	東部建設事務所	広島県	福山市	県道下御領新市線	1981	12.4	9.4	道路橋	2018	Ⅰ	2023	Ⅰ	2028												●				○	
1991	80318105	三池橋	東部建設事務所	広島県	福山市	県道下御領新市線	1992	12.4	9.5	道路橋	2016	Ⅲ	2021	Ⅲ	2026										●			■★		○		
1992	80318106	不明橋 (No.34+86)	東部建設事務所	広島県	福山市	県道下御領新市線	不明	2.3	15.3	道路橋	2018	Ⅰ	2023	Ⅰ	2028												●				○	
1993	80318107	岩成橋	東部建設事務所	広島県	福山市	県道下御領新市線	2005	32.4	11	道路橋	2018	Ⅰ	2023	Ⅰ	2028												●				○	
1994	80318108	歳野上橋	東部建設事務所	広島県	福山市	県道下御領新市線	不明	2	15.5	道路橋	2018	Ⅰ	2023	Ⅰ	2028												●				○	
1995	80318111	戸手橋	東部建設事務所	広島県	福山市	県道下御領新市線	1970	6	8.6	道路橋	2018	Ⅰ	2023	Ⅰ	2028												●				○	
1996	80318112	上戸手跨線橋	東部建設事務所	広島県	福山市	県道下御領新市線	1935	11.2	6.4	道路橋	2014	Ⅱ	2024	Ⅱ	2029												●				○	
1997	80318901	竹尋橋	東部建設事務所	広島県	福山市	県道福山上御領線	1973	21.8	7.3	道路橋	2018	Ⅱ	2023	Ⅲ	2028									</								

No.	橋梁番号	施設名	事務所名	所在地		路線名	架設年度	橋長 (m)	幅員 (m)	橋梁種別	1巡目点検		最新の点検結果		次回点検	令和7年度から令和10年度までの修繕計画				点検・修繕計画 ○：定期点検(予定), □:修繕着手(予定), ☆：修繕完了(予定) ●：定期点検済, ■:修繕着手済, ★：修繕完了済計画								備考				
				県名	市町名						点検年度	健全度	点検年度	健全度		点検年度	修繕着手年度	修繕完了年度	概算工事費 (100万円)	主な修繕内容	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2027	2028		
2040	80338015	無名ボックス07	東部建設事務所	広島県	福山市	県道水吞手城線	不明	3.9	29.1	道路橋	2014	Ⅲ	2024	I	2029											●						
2041	80338016	無名橋04	東部建設事務所	広島県	福山市	県道水吞手城線	2002	2.5	30.2	道路橋	2014	Ⅱ	2024	Ⅱ	2029											●						
2042	80338017	葛城橋	東部建設事務所	広島県	福山市	県道水吞手城線	2002	11.7	25.8	道路橋	2014	I	2024	I	2029											●						
2043	80338101	坂根橋	東部建設事務所	広島県	福山市	県道熊野瀬戸線	1961	10.4	5	道路橋	2014	Ⅲ	2024	I	2029								■★			●						
2044	80338102	無名橋01	東部建設事務所	広島県	福山市	県道熊野瀬戸線	不明	2.8	8.1	道路橋	2014	Ⅱ	2024	Ⅱ	2029											●						
2045	80338103	山方橋	東部建設事務所	広島県	福山市	県道熊野瀬戸線	1966	18.9	5.4	道路橋	2014	Ⅱ	2024	Ⅱ	2029											●						
2046	80338104	筒井橋	東部建設事務所	広島県	福山市	県道熊野瀬戸線	1967	19.1	6.8	道路橋	2014	I	2024	I	2029											●						
2047	80338105	無名橋02	東部建設事務所	広島県	福山市	県道熊野瀬戸線	不明	2.2	9.8	道路橋	2014	Ⅲ	2024	I	2029								■★			●						
2048	80338106	大景橋	東部建設事務所	広島県	福山市	県道熊野瀬戸線	1968	3.2	6.8	道路橋	2014	Ⅱ	2024	Ⅱ	2029											●						
2049	80338108	無名橋03	東部建設事務所	広島県	福山市	県道熊野瀬戸線	不明	2.2	34.8	道路橋	2014	Ⅲ	2024	I	2029										■★		●					
2050	80338109	岩足橋	東部建設事務所	広島県	福山市	県道熊野瀬戸線	1972	17.6	9.6	道路橋	2014	Ⅱ	2024	Ⅱ	2029											●						
2051	80338110	岩足橋歩道橋	東部建設事務所	広島県	福山市	県道熊野瀬戸線	1979	17.3	2.6	道路橋	2014	Ⅲ	2024	Ⅱ	2029							★				●						
2052	80338202	無名ボックス02	東部建設事務所	広島県	福山市	県道熊野松永線	1996	5.1	11	道路橋	2014	I	2024	I	2029											●						
2053	80338203	菅田橋	東部建設事務所	広島県	福山市	県道熊野松永線	1973	4.3	7.4	道路橋	2014	Ⅱ	2024	Ⅱ	2029											●						
2054	80338204	無名ボックス03	東部建設事務所	広島県	福山市	県道熊野松永線	1986	3.1	8.6	道路橋	2014	I	2024	I	2029											●						
2055	80338205	ナラキ橋	東部建設事務所	広島県	福山市	県道熊野松永線	1971	4.2	4.2	道路橋	2014	Ⅱ	2024	I	2029											●						
2056	80338206	新川橋	東部建設事務所	広島県	福山市	県道熊野松永線	1958	5.8	10.6	道路橋	2014	Ⅱ	2024	I	2029											●						
2057	80338401	新河南橋	東部建設事務所	広島県	福山市	県道下川辺尾道線	1993	31.5	10.3	道路橋	2018	Ⅱ	2023	Ⅱ	2028											●					○	
2058	80338501	内浦橋	東部建設事務所	広島県	福山市	県道内浦箱崎港線	1968	4	8.4	道路橋	2014	Ⅲ	2024	I	2029							■	★			●						
2059	80338502	無名橋01	東部建設事務所	広島県	福山市	県道内浦箱崎港線	不明	2	8.7	道路橋	2014	I	2024	Ⅱ	2029											●						
2060	80338503	無名橋02	東部建設事務所	広島県	福山市	県道内浦箱崎港線	不明	2.9	7.7	道路橋	2014	Ⅲ	2024	Ⅱ	2029							■	★			●						
2061	80338504	無名橋03	東部建設事務所	広島県	福山市	県道内浦箱崎港線	不明	2.7	6.7	道路橋	2014	Ⅱ	2024	Ⅱ	2029											●						
2062	80338601	無名橋01	東部建設事務所	広島県	福山市	県道田島循環線	不明	2	6.1	道路橋	2014	Ⅱ	2024	I	2029											●						
2063	80338602	南橋	東部建設事務所	広島県	福山市	県道田島循環線	1964	2.6	7.2	道路橋	2014	Ⅱ	2024	Ⅱ	2029											●						
2064	80338603	明見橋	東部建設事務所	広島県	福山市	県道田島循環線	1964	3.7	3.4	道路橋	2014	Ⅱ	2024	Ⅱ	2029											●						
2065	80338604	大畑橋	東部建設事務所	広島県	福山市	県道田島循環線	1964	2.4	7.5	道路橋	2014	Ⅱ	2024	Ⅱ	2029											●						
2066	80338605	無名橋02	東部建設事務所	広島県	福山市	県道田島循環線	1964	2	11.4	道路橋	2014	Ⅱ	2024	Ⅱ	2029											●						
2067	80338606	無名橋03	東部建設事務所	広島県	福山市	県道田島循環線	不明	3.3	4	道路橋	2014	Ⅲ	2024	Ⅱ	2029											●						
2068	80338607	釜谷橋	東部建設事務所	広島県	福山市	県道田島循環線	1966	3.1	9	道路橋	2014	Ⅱ	2024	Ⅱ	2029											●						
2069	80338701	弁天橋	東部建設事務所	広島県	福山市	県道横島循環線	1997	12.1	11.5	道路橋	2014	Ⅱ	2024	I	2029											●						
2070	80338702	向橋	東部建設事務所	広島県	福山市	県道横島循環線	1956	2.7	10.9	道路橋	2014	Ⅱ	2024	Ⅱ	2029											●						
2071	80338703	入双橋	東部建設事務所	広島県	福山市	県道横島循環線	1964	5.4	3.9	道路橋	2014	I	2024	I	2029											●						
2072	80338704	無名橋01	東部建設事務所	広島県	福山市	県道横島循環線	1964	2.1	3.6	道路橋	2014	Ⅱ	2024	Ⅱ	2029											●						
2073	80338705	無名橋02	東部建設事務所	広島県	福山市	県道横島循環線	不明	2.2	3.8	道路橋	2014	I	2024	I	2029											●						
2074	80338706	無名橋03	東部建設事務所	広島県	福山市	県道横島循環線	不明	3	11.8	道路橋	2014	Ⅱ	2024	I	2029											●						
2075	80338707	岩谷1号橋	東部建設事務所	広島県</																												

No.	橋梁番号	施設名	事務所名	所在地		路線名	架設年度	橋長 (m)	幅員 (m)	橋梁種別	1巡目点検		最新の点検結果		次回点検	令和7年度から令和10年度までの修繕計画				点検・修繕計画 ○：定期点検(予定), □:修繕着手(予定), ☆：修繕完了(予定) ●：定期点検済, ■:修繕着手済, ★：修繕完了済									備考					
				県名	市町名						点検年度	健全度	点検年度	健全度		点検年度	修繕着手年度	修繕完了年度	概算工事費 (100万円)	主な修繕内容	実績 計画													
																					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		2028				
2117	80339201	平成大橋	東部建設事務所	広島県	福山市	県道中野駅家線	1993	31	12.8	道路橋	2016	I	2021	I	2026																			
2118	80339202	法成寺新橋	東部建設事務所	広島県	福山市	県道中野駅家線	不明	13.7	16.8	道路橋	2016	I	2021	I	2026																			
2119	80339203	駅家陸橋	東部建設事務所	広島県	福山市	県道中野駅家線	1976	163.8	10	道路橋	2016	III	2020	II	2025	2024	2027	450	ひび割れ注入工, 耐震補強工	●					■	○		☆						
2120	80339205	無名橋 (No.47+50付近)	東部建設事務所	広島県	福山市	県道中野駅家線	不明	6	17	道路橋	2016	I	2021	I	2026																			
2121	80339301	庭田橋	東部建設事務所	広島県	福山市	県道栗根神辺線	不明	9.8	4.8	道路橋	2018	II	2023	II	2028																			
2122	80339302	粟井橋	東部建設事務所	広島県	福山市	県道栗根神辺線	不明	4.9	6.2	道路橋	2018	II	2023	II	2028																			
2123	80339303	池の坊橋	東部建設事務所	広島県	福山市	県道栗根神辺線	1973	9.5	9.3	道路橋	2018	II	2023	III	2028																			
2124	80339304	大師橋	東部建設事務所	広島県	福山市	県道栗根神辺線	1991	10.6	10.7	道路橋	2018	I	2023	I	2028																			
2125	80339305	梅木橋	東部建設事務所	広島県	福山市	県道栗根神辺線	不明	8.3	5.3	道路橋	2018	II	2023	II	2028																			
2126	80339306	早田橋	東部建設事務所	広島県	福山市	県道栗根神辺線	1962	60	6.7	道路橋	2014	III	2024	II	2029																			
2127	80339307	早田橋側道橋	東部建設事務所	広島県	福山市	県道栗根神辺線	1988	60	2.8	道路橋	2018	II	2023	II	2028																			
2128	80339308	無名橋 (No.80+50付近)	東部建設事務所	広島県	福山市	県道栗根神辺線	不明	2.9	7.1	道路橋	2018	II	2023	III	2028																			
2129	80339309	無名橋	東部建設事務所	広島県	福山市	県道栗根神辺線	不明	2.8	5.4	道路橋	2018	III	2023	III	2028	2025	2025	33	断面修復工															
2130	80339501	蓮池川橋	東部建設事務所	広島県	福山市	県道川南近田線	1964	7	18.5	道路橋	2014	II	2024	I	2029																			
2131	80339502	川南橋	東部建設事務所	広島県	福山市	県道川南近田線	1972	7.4	14	道路橋	2014	II	2024	II	2029																			
2132	80339503	白鷺橋	東部建設事務所	広島県	福山市	県道川南近田線	1970	81.9	9.2	道路橋	2014	II	2024	II	2029																			
2133	80339504	無名ボックス01	東部建設事務所	広島県	福山市	県道川南近田線	不明	7.4	14.2	道路橋	2014	II	2024	I	2029																			
2134	80339505	無名ボックス02	東部建設事務所	広島県	福山市	県道川南近田線	不明	3.1	38.3	道路橋	2014	II	2024	II	2029																			
2135	80339506	森脇橋	東部建設事務所	広島県	福山市	県道川南近田線	1983	6.1	36.5	道路橋	2014	II	2024	II	2029																			
2136	80339507	石井橋	東部建設事務所	広島県	福山市	県道川南近田線	1983	5.6	7.5	道路橋	2014	II	2024	II	2029																			
2137	80339508	無名橋	東部建設事務所	広島県	福山市	県道川南近田線	不明	2.8	6.8	道路橋	2014	III	2024	II	2029	2025	2025	33	断面修復工															
2138	80339509	ノブヤマ橋	東部建設事務所	広島県	福山市	県道川南近田線	1983	6	7.4	道路橋	2014	II	2024	II	2029																			
2139	80339510	無名ボックス03	東部建設事務所	広島県	福山市	県道川南近田線	不明	2.3	107.1	道路橋	2014	III	2024	II	2029							★												
2140	80339511	ミゾテ橋	東部建設事務所	広島県	福山市	県道川南近田線	1930	4.6	14.4	道路橋	2014	II	2024	II	2029																			
2141	80339512	蓬萊橋	東部建設事務所	広島県	福山市	県道川南近田線	1930	10	8.7	道路橋	2014	II	2024	II	2029																			
2142	80339601	山守橋	東部建設事務所	広島県	福山市	県道杵磨駅家線	1959	228	6	道路橋	2017	II	2022	II	2027																			
2143	80339602	山守橋歩道橋	東部建設事務所	広島県	福山市	県道杵磨駅家線	1974	228	3.1	道路橋	2018	III	2023	III	2028																			
2144	80339701	瓜原橋	東部建設事務所	広島県	福山市	県道福田戸手線	1976	27.8	9.1	道路橋	2018	III	2023	II	2028																			
2145	80339702	才町橋	東部建設事務所	広島県	福山市	県道福田戸手線	1965	2.6	7.2	道路橋	2018	I	2023	I	2028																			
2146	80339703	福戸橋	東部建設事務所	広島県	福山市	県道福田戸手線	1956	215.6	5.7	道路橋	2014	II	2024	III	2029	2021	2028	400	断面修復工, ひび割れ注入工, 支承補修工			■												
2147	80339704	福戸橋歩道橋	東部建設事務所	広島県	福山市	県道福田戸手線	1976	216.9	2.5	道路橋	2014	III	2024	III	2029																			
2148	80339801	無名橋 (No.10+71.6)	東部建設事務所	広島県	福山市	県道新山府中線	不明	8.6	11.6	道路橋	2018	I	2023	I	2028																			
2149	80339802	新造橋	東部建設事務所	広島県	福山市	県道新山府中線	不明	9	8.8	道路橋	2018	II	2023	II	2028																			
2150	80339803	不明橋 (No.52+64)	東部建設事務所	広島県	福山市	県道新山府中線	不明	2	4	道路橋	2018	I	2023	I	2028																			

No.	橋梁番号	施設名	事務所名	所在地		路線名	架設年度	橋長 (m)	幅員 (m)	橋梁種別	1巡目点検		最新の点検結果		次回点検	令和7年度から令和10年度までの修繕計画				点検・修繕計画 ○：定期点検(予定), □:修繕着手(予定), ☆：修繕完了(予定) ●：定期点検済, ■:修繕着手済, ★：修繕完了済								備考	
				県名	市町名						点検年度	健全度	点検年度	健全度		点検年度	修繕着手年度	修繕完了年度	概算工事費 (100万円)	主な修繕内容	実績 計画								
																					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2027
2194	10327	30ムメイ橋	東部建設事務所	広島県	福山市	県道鞆松永線	不明	3.7	8	道路橋	2014	Ⅱ	2024	I	2029						●								
2195	10301	室間橋	東部建設事務所	広島県	福山市	県道鞆松永線	1967	6.9	6.7	道路橋	2014	Ⅱ	2024	Ⅱ	2029						●								
2196	10316	新川橋	東部建設事務所	広島県	福山市	県道鞆松永線	1973	7.4	9.8	道路橋	2014	Ⅱ	2024	Ⅱ	2029						●								
2197	10317	新川橋側道橋(左)	東部建設事務所	広島県	福山市	県道鞆松永線	1973	8	2.3	道路橋	2014	Ⅲ	2024	Ⅱ	2029						●								
2198	10027	道上陸橋	東部建設事務所	広島県	福山市	国道182号	1990	80	19.2	道路橋	2014	I	2024	I	2029						●								
2199	290631302	1号ボックス	東部建設事務所	広島県	福山市	国道313号	2015	7.2	26.8	道路橋	—	—	2020	I	2025					●				○					
2200	290637801	No.14 ボックス	東部建設事務所	広島県	福山市	県道御幸松永線	2016	17	8.9	道路橋	—	—	2021	I	2026										○				
2201	290637802	湯伝橋	東部建設事務所	広島県	福山市	県道御幸松永線	2016	12.7	16.8	道路橋	—	—	2021	I	2026						●								
2202	31020705	木曾丸川ボックス	東部建設事務所	広島県	福山市	県道新市七曲西城線	2016	3.4	25.5	道路橋	—	—	2021	I	2026						●					○			
2203	290631301	御領橋	東部建設事務所	広島県	福山市	国道313号	2016	32	12	道路橋	—	—	2021	I	2026						●					○			
2204	80118207	上加茂歩道橋	東部建設事務所	広島県	福山市	国道182号	1974	48.2	1.9	横断歩道橋	2015	Ⅲ	2020	I	2025					●★				○					
2205	80118208	道上歩道橋	東部建設事務所	広島県	福山市	国道182号	1973	44	1.9	横断歩道橋	2015	Ⅲ	2020	Ⅱ	2025					●★				○					
2206	80118210	千田歩道橋	東部建設事務所	広島県	福山市	国道182号	1974	48	1.9	横断歩道橋	2015	Ⅱ	2020	Ⅲ	2025	2021	2025	43	部分塗替工, 断面修復工	●	■			○☆					
2207	80118211	蔵王歩道橋	東部建設事務所	広島県	福山市	国道182号	1974	61.7	1.9	横断歩道橋	2014	Ⅲ	2024	I	2029							★	●						
2208	80118212	宮ノ前歩道橋	東部建設事務所	広島県	福山市	国道182号	1987	119.9	1.9	横断歩道橋	2015	Ⅲ	2020	Ⅲ	2025					●■				○					
2209	80118218	中野歩道橋	東部建設事務所	広島県	福山市	国道182号	1972	40.9	1.9	横断歩道橋	2015	Ⅲ	2020	Ⅱ	2025					●★				○					
2210	80131306	御野陸橋	東部建設事務所	広島県	福山市	国道313号	1967	41.7	1.9	横断歩道橋	2014	Ⅲ	2024	I	2029					★				●					
2211	80131307	町下歩道橋	東部建設事務所	広島県	福山市	国道313号	1967	35.8	1.9	横断歩道橋	2016	Ⅲ	2021	Ⅱ	2026						●					○			
2212	80131308	了陸橋	東部建設事務所	広島県	福山市	国道313号	1967	35.8	1.9	横断歩道橋	2016	Ⅲ	2021	Ⅱ	2026							●				○			
2213	80131309	横尾陸橋	東部建設事務所	広島県	福山市	国道313号	1967	46.2	1.9	横断歩道橋	2016	Ⅲ	2021	I	2026					■★	●★					○			
2214	80131310	三吉北陸橋	東部建設事務所	広島県	福山市	国道313号	1968	38.3	1.9	横断歩道橋	2016	Ⅱ	2021	Ⅱ	2026						●					○			
2215	80131311	三吉南陸橋	東部建設事務所	広島県	福山市	国道313号	1968	41.9	1.9	横断歩道橋	2016	Ⅱ	2021	Ⅱ	2026						●					○			
2216	80148605	府川歩道橋	東部建設事務所	広島県	府中市	国道486号	1970	37.1	1.9	横断歩道橋	2015	Ⅱ	2020	Ⅱ	2025						●				○				
2217	80148606	湯田小前歩道橋	東部建設事務所	広島県	福山市	国道486号	1988	56	1.9	横断歩道橋	2015	Ⅱ	2020	I	2025						●				○				
2218	80148609	中須陸橋	東部建設事務所	広島県	府中市	国道486号	1968	37.2	1.9	横断歩道橋	2014	Ⅲ	2024	I	2029									●					
2219	80202203	花園陸橋	東部建設事務所	広島県	福山市	県道福山鞆線	1967	43.1	1.9	横断歩道橋	2014	Ⅱ	2024	Ⅱ	2029	2021	2025	48	部分塗替工, ひび割れ注入工		■			●	☆				
2220	80202204	高島歩道橋	東部建設事務所	広島県	福山市	県道福山鞆線	1971	31.8	1.9	横断歩道橋	2014	Ⅲ	2024	I	2029					■	★			●					
2221	80202205	田尻歩道橋	東部建設事務所	広島県	福山市	県道福山鞆線	1969	32.3	1.9	横断歩道橋	2014	Ⅲ	2024	I	2029					■			★	●					
2222	80204703	藤江歩道橋	東部建設事務所	広島県	福山市	県道鞆松永線	1970	38.2	1.9	横断歩道橋	2014	Ⅲ	2024	I	2029						■		★	●					
2223	80205405	真田歩道橋	東部建設事務所	広島県	福山市	県道福山尾道線	1986	43.7	1.9	横断歩道橋	2014	Ⅲ	2024	I	2029									●					
2224	80207602	鶴丘歩道橋	東部建設事務所	広島県	福山市	県道神辺大門線	1976	53.9	1.9	横断歩道橋	2014	Ⅲ	2024	I	2029									●					
2225	80207603	幕山歩道橋	東部建設事務所	広島県	福山市	県道神辺大門線	1977	55.4	1.9	横断歩道橋	2014	Ⅱ	2024	Ⅱ	2029									●					
2226	80207604	伊勢丘歩道橋	東部建設事務所	広島県	福山市	県道神辺大門線	1974	36.6	1.9	横断歩道橋	2014	Ⅲ	2024	Ⅲ	2029					■★				●					
2227	80324410	手城歩道橋	東部建設事務所	広島県	福山市	県道福山港線	1968	47.8	1.9	横断歩道橋	2014	Ⅱ	2024	Ⅱ	2029									●					
2228	80337908	春日歩道橋	東部建設事務所	広島県	福山市	県道坪生福山線	1979	33.3	1.9	横断歩道橋	2014	Ⅲ	2024	Ⅱ	2029									●					
2229	80339125	御幸陸橋	東部建設事務所	広島県	福山市	県道加茂福山線	1967	42.2	1.9	横断歩道橋	2014	Ⅱ	2024	Ⅱ	2029								</						

No.	橋梁番号	施設名	事務所名	所在地		路線名	架設年度	橋長 (m)	幅員 (m)	橋梁種別	1巡目点検		最新の点検結果		次回点検	令和7年度から令和10年度までの修繕計画				点検・修繕計画 ○：定期点検(予定), □:修繕着手(予定), ☆：修繕完了(予定) ●：定期点検済, ■:修繕着手済, ★：修繕完了済										備考
				県名	市町名						点検年度	健全度	点検年度	健全度		点検年度	修繕着手年度	修繕完了年度	概算工事費 (100万円)	主な修繕内容	実績 計画									
															2020						2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
2271	70315616	無名橋156-10	東部建設事務所三原支所	広島県	尾道市	県道御調久井線	2005	3.2	4.5	道路橋	2014	Ⅱ	2024	Ⅱ	2029							●								
2272	70315617	行広橋	東部建設事務所三原支所	広島県	三原市	県道御調久井線	2008	7.4	5.3	道路橋	2014	Ⅰ	2024	Ⅰ	2029							●								
2273	70315618	無名橋156-11	東部建設事務所三原支所	広島県	三原市	県道御調久井線	2008	3.1	20.2	道路橋	2014	Ⅰ	2024	Ⅰ	2029							●								
2274	70316101	無名橋161-1	東部建設事務所三原支所	広島県	三原市	県道三和大和線	不明	4.8	8	道路橋	2018	Ⅰ	2023	Ⅰ	2028							●						○		
2275	70316103	無名橋161-3	東部建設事務所三原支所	広島県	三原市</																									

No.	橋梁番号	施設名	事務所名	所在地		路線名	架設年度	橋長 (m)	幅員 (m)	橋梁種別	1巡目点検		最新の点検結果		次回点検	令和7年度から令和10年度までの修繕計画				点検・修繕計画 ○：定期点検(予定), □:修繕着手(予定), ☆：修繕完了(予定) ●：定期点検済, ■:修繕着手済, ★：修繕完了済計画								備考					
				県名	市町名						点検年度	健全度	点検年度	健全度		点検年度	修繕着手年度	修繕完了年度	概算工事費 (100万円)	主な修繕内容	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2027	2028			
2348	70336102	無名橋361-2	東部建設事務所三原支所	広島県	三原市	県道佐木島線	1988	5.5	10.6	道路橋	2014	I	2024	I	2029											●							
2349	70336103	無名橋361-3	東部建設事務所三原支所	広島県	三原市	県道佐木島線	1988	3.2	9.1	道路橋	2014	II	2024	II	2029												●						
2350	70336104	無名橋361-4	東部建設事務所三原支所	広島県	三原市	県道佐木島線	2014	3.7	10.5	道路橋	2014	I	2024	II	2029												●						
2351	70336105	無名橋361-5	東部建設事務所三原支所	広島県	三原市	県道佐木島線	2014	4.3	12.2	道路橋	2014	II	2024	I	2029												●						
2352	70336107	無名橋361-6	東部建設事務所三原支所	広島県	三原市	県道佐木島線	2014	2.2	13.4	道路橋	2014	I	2024	I	2029												●						
2353	70336108	無名橋361-7	東部建設事務所三原支所	広島県	三原市	県道佐木島線	2014	3.3	15	道路橋	2014	I	2024	I	2029												●						
2354	70336109	無名橋361-8	東部建設事務所三原支所	広島県	三原市	県道佐木島線	2014	3.5	19.8	道路橋	2014	II	2024	II	2029												●						
2355	70336110	無名橋361-9	東部建設事務所三原支所	広島県	三原市	県道佐木島線	2014	3.7	12	道路橋	2014	III	2024	II	2029												●						
2356	70336111	無名橋361-10	東部建設事務所三原支所	広島県	三原市	県道佐木島線	2014	2.2	10.1	道路橋	2014	I	2024	I	2029												●						
2357	70336112	無名橋361-11	東部建設事務所三原支所	広島県	三原市	県道佐木島線	2014	2.7	9	道路橋	2014	III	2024	II	2029												●						
2358	70336601	長崎橋	東部建設事務所三原支所	広島県	尾道市	県道西浦三庄田熊線	1989	2.8	8	道路橋	2014	II	2024	II	2029								■			★	●						
2359	70336602	東西橋	東部建設事務所三原支所	広島県	尾道市	県道西浦三庄田熊線	1985	13.8	21.5	道路橋	2014	I	2024	I	2029												●						
2360	70336603	無名橋366-1	東部建設事務所三原支所	広島県	尾道市	県道西浦三庄田熊線	2008	2.8	14.3	道路橋	2014	I	2024	I	2029												●						
2361	70336604	無名橋366-2	東部建設事務所三原支所	広島県	尾道市	県道西浦三庄田熊線	2008	2.6	17.2	道路橋	2014	II	2024	II	2029												●						
2362	70336605	無名橋366-3	東部建設事務所三原支所	広島県	尾道市	県道西浦三庄田熊線	2008	3.6	14.5	道路橋	2014	III	2024	II	2029												●						
2363	70336606	中浜橋	東部建設事務所三原支所	広島県	尾道市	県道西浦三庄田熊線	1985	13.2	16	道路橋	2014	I	2024	II	2029												●						
2364	70336607	新入川橋	東部建設事務所三原支所	広島県	尾道市	県道西浦三庄田熊線	1988	74.7	12.1	道路橋	2014	II	2024	I	2029												●						
2365	70336608	外浦橋	東部建設事務所三原支所	広島県	尾道市	県道西浦三庄田熊線	1970	4.6	6.9	道路橋	2014	I	2024	II	2029												●						
2366	70336609	無名橋366-4	東部建設事務所三原支所	広島県	尾道市	県道西浦三庄田熊線	1993	3	10	道路橋	2014	III	2024	I	2029												●						
2367	70336610	無名橋366-5	東部建設事務所三原支所	広島県	尾道市	県道西浦三庄田熊線	1993	4.2	9.9	道路橋	2014	II	2024	II	2029												●						
2368	70336611	めいじ橋	東部建設事務所三原支所	広島県	尾道市	県道西浦三庄田熊線	1993	11	13.9	道路橋	2014	I	2024	I	2029												●						
2369	70336612	無名橋366-6	東部建設事務所三原支所	広島県	尾道市	県道西浦三庄田熊線	1993	3.6	17.5	道路橋	2014	I	2024	II	2029												●						
2370	70336613	金山橋	東部建設事務所三原支所	広島県	尾道市	県道西浦三庄田熊線	1993	7.4	18.2	道路橋	2014	I	2024	II	2029												●						
2371	70336701	無名橋367-1	東部建設事務所三原支所	広島県	尾道市	県道中庄重井線	1983	2.2	11.3	道路橋	2014	I	2024	II	2029												●						
2372	70336702	無名橋367-2	東部建設事務所三原支所	広島県	尾道市	県道中庄重井線	1983	3.4	20.2	道路橋	2014	III	2024	II	2029												●						
2373	70337001	無名橋370-1	東部建設事務所三原支所	広島県	尾道市	県道高根島線	2002	8.7	11.4	道路橋	2014	I	2024	I	2029												●						
2374	70337002	無名橋370-2	東部建設事務所三原支所	広島県	尾道市	県道高根島線	2002	2.3	11.9	道路橋	2014	I	2024	I	2029												●						
2375	70337003	無名橋370-3	東部建設事務所三原支所	広島県	尾道市	県道高根島線	2002	2.6	15.1	道路橋	2014	I	2024	I	2029												●						
2376	70337004	栄高橋	東部建設事務所三原支所	広島県	尾道市	県道高根島線	2002	3.5	4.4	道路橋	2014	III	2024	I	2029												●						
2377	70337005	葭浦橋	東部建設事務所三原支所	広島県	尾道市	県道高根島線	2002	14.6	7.4	道路橋	2014	I	2024	I	2029												●						
2378	70337201	岡条橋	東部建設事務所三原支所	広島県	尾道市	県道林御寺線	2004	9.1	13.3	道路橋	2014	I	2024	I	2029												●						
2379	70337202	無名橋372-1	東部建設事務所三原支所	広島県	尾道市	県道林御寺線	1999	4	7.4	道路橋	2014	II	2024	I	2029												●						
2380	70337203	無名橋372-2	東部建設事務所三原支所	広島県	尾道市	県道林御寺線	1999	3.6	12.8	道路橋	2014	II	2024	II	2029												●						
2381	70337503	無名橋375-2	東部建設事務所三原支所	広島県	尾道市	県道吉田丸門田線	1974	4.5	5.3	道路橋	2014	I	2024	I	2029																		

No.	橋梁番号	施設名	事務所名	所在地		路線名	架設年度	橋長 (m)	幅員 (m)	橋梁種別	1巡目点検		最新の点検結果		次回点検	令和7年度から令和10年度までの修繕計画				点検・修繕計画 ○：定期点検(予定), □:修繕着手(予定), ☆：修繕完了(予定) ●：定期点検済, ■:修繕着手済, ★：修繕完了済計画								備考		
				県名	市町名						点検年度	健全度	点検年度	健全度		点検年度	修繕着手年度	修繕完了年度	概算工事費 (100万円)	主な修繕内容	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2027	2028
2425	70315403	中央橋	東部建設事務所三原支所	広島県	三原市	県道大和久井線	1990	36.3	9.5	道路橋	2018	I	2023	I	2028													○		
2426	70315404	マエタニ橋	東部建設事務所三原支所	広島県	三原市	県道大和久井線	1964	2.7	6.5	道路橋	2017	II	2022	II	2027															
2427	70315406	無名橋-3	東部建設事務所三原支所	広島県	三原市	県道大和久井線	不明	3.9	8.6	道路橋	2018	III	2023	I	2028													○		
2428	70315407	特ノ川橋	東部建設事務所三原支所	広島県	三原市	県道大和久井線	1982	4.5	12.7	道路橋	2018	I	2023	I	2028													○		
2429	70315408	西原橋	東部建設事務所三原支所	広島県	三原市	県道大和久井線	1993	8.5	10.5	道路橋	2018	I	2023	I	2028													○		
2430	70315501	無名橋-1	東部建設事務所三原支所	広島県	三原市	県道三原本郷線	不明	4.2	5.3	道路橋	2016	II	2021	II	2026													○		
2431	70315502	大西1号橋	東部建設事務所三原支所	広島県	三原市	県道三原本郷線	不明	10.5	5.2	道路橋	2018	I	2023	I	2028													○		
2432	70315503	無名橋-2	東部建設事務所三原支所	広島県	三原市	県道三原本郷線	2015	2.4	14.2	道路橋	2018	I	2023	I	2028													○		
2433	70315504	稲積橋	東部建設事務所三原支所	広島県	三原市	県道三原本郷線	1964	9.8	5.8	道路橋	2016	II	2021	II	2026													○		
2434	70315505	無名橋-3	東部建設事務所三原支所	広島県	三原市	県道三原本郷線	2000	3.6	17	道路橋	2018	I	2023	I	2028													○		
2435	70315507	真良橋	東部建設事務所三原支所	広島県	三原市	県道三原本郷線	1998	26	11	道路橋	2018	I	2023	I	2028													○		
2436	70315509	竹野端橋	東部建設事務所三原支所	広島県	三原市	県道三原本郷線	2010	10.4	34	道路橋	2018	I	2023	I	2028													○		
2437	70315801	宮前橋	東部建設事務所三原支所	広島県	尾道市	県道尾道新市線	1977	22.3	14	道路橋	2018	II	2022	II	2027													○		
2438	70315802	瀬戸下橋	東部建設事務所三原支所	広島県	尾道市	県道尾道新市線	1981	13	8.2	道路橋	2018	II	2022	II	2027													○		
2439	70315804	瀬戸橋	東部建設事務所三原支所	広島県	尾道市	県道尾道新市線	1981	11.7	8.6	道路橋	2018	II	2022	II	2027													○		
2440	70315806	木梨橋	東部建設事務所三原支所	広島県	尾道市	県道尾道新市線	1981	10.8	9.1	道路橋	2017	II	2022	I	2027													○		
2441	70315807	木梨側道橋	東部建設事務所三原支所	広島県	尾道市	県道尾道新市線	不明	10.7	3.3	道路橋	2017	I	2022	I	2027													○		
2442	70315808	無名橋-1	東部建設事務所三原支所	広島県	尾道市	県道尾道新市線	不明	3	24.3	道路橋	2018	II	2022	II	2027													○		
2443	70315811	有光橋	東部建設事務所三原支所	広島県	尾道市	県道尾道新市線	2002	8.9	4.7	道路橋	2018	I	2023	I	2028													○		
2444	70315812	小槻線1号橋	東部建設事務所三原支所	広島県	尾道市	県道尾道新市線	2002	2.5	5.8	道路橋	2018	II	2023	II	2028													○		
2445	70315813	白鳥橋	東部建設事務所三原支所	広島県	尾道市	県道尾道新市線	1966	6.7	5.1	道路橋	2018	II	2023	II	2028													○		
2446	70336201	生田橋	東部建設事務所三原支所	広島県	三原市	県道小泉本郷線	1994	18	11	道路橋	2018	I	2023	I	2028													○		
2447	70336202	無名橋-1	東部建設事務所三原支所	広島県	三原市	県道小泉本郷線	1995	6	11	道路橋	2018	I	2023	I	2028													○		
2448	70336203	無名橋-2	東部建設事務所三原支所	広島県	三原市	県道小泉本郷線	1990	4.1	11	道路橋	2018	I	2023	I	2028													○		
2449	70336205	小原小橋	東部建設事務所三原支所	広島県	三原市	県道小泉本郷線	1986	23	10.8	道路橋	2018	I	2023	I	2028													○		
2450	70336206	無名橋-4	東部建設事務所三原支所	広島県	三原市	県道小泉本郷線	1990	3.5	12.4	道路橋	2018	I	2023	I	2028													○		
2451	70336207	小原大橋	東部建設事務所三原支所	広島県	三原市	県道小泉本郷線	1985	150	10.8	道路橋	2018	II	2023	II	2028													○		
2452	70336301	世計橋	東部建設事務所三原支所	広島県	尾道市	県道栗原長江線	1969	3.8	61.2	道路橋	2018	I	2023	I	2028													○		
2453	70336501	無名橋-1	東部建設事務所三原支所	広島県	尾道市	県道戸崎下組線	1991	2	2.7	道路橋	2016	III	2021	I	2026													○		
2454	70336502	満越橋	東部建設事務所三原支所	広島県	尾道市	県道戸崎下組線	1991	4	12	道路橋	2016	I	2021	I	2026													○		
2455	70336901	追分橋	東部建設事務所三原支所	広島県	三原市	県道南方竹原線	1966	7	5.5	道路橋	2018	I	2023	II	2028													○		
2456	70336902	無名橋-1	東部建設事務所三原支所	広島県	三原市	県道南方竹原線	1980	4.7	15.2	道路橋	2018	I	2023	I	2028													○		
2457	70337608	無名橋-6	東部建設事務所三原支所	広島県	尾道市	県道立花池田線	1996	2.8	5.1	道路橋	2014	III	2024	II	2029													○		
2458	70337609	無名橋-7	東部建設事務所三原支所	広島県	尾道市	県道立花池田線	1996	3	20	道路橋	2018	II	2023	II	2028													○		
2459	70338901	犬吠橋	東部建設事務所三原支所	広島県	尾道市	県道草深古市松永線	2015	3.5	7.4	道路橋	2016	II	2021	I	2026													○		
2460	70338902	灘橋	東部建設事務所三原支所	広島県	尾道市	県道草深古市松永線	2015	3.8	11	道路橋	2016	I	2021	I	2026													○		
2461	70340602	ブカカンドウ橋	東部建設事務所三原支所	広島県	尾道市	県道宇津戸八幡線	1974	3.4	6	道路橋	2018	I	2023	I	2028													○		
2462	70340603	オオタニ橋	東部建設事務所三原支所																											

No.	橋梁番号	施設名	事務所名	所在地		路線名	架設年度	橋長 (m)	幅員 (m)	橋梁種別	1巡目点検		最新の点検結果		次回点検	令和7年度から令和10年度までの修繕計画				点検・修繕計画 ○：定期点検(予定), □:修繕着手(予定), ☆：修繕完了(予定) ●：定期点検済, ■:修繕着手済, ★：修繕完了済								備考			
				県名	市町名						点検年度	健全度	点検年度	健全度		点検年度	修繕着手年度	修繕完了年度	概算工事費 (100万円)	主な修繕内容	実績 計画										
																					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2027	2028	
2502	9030	諸原中橋	東部建設事務所三原支所	広島県	尾道市	国道184号	1975	64	11	道路橋	2015	Ⅱ	2020	Ⅲ	2025						●				★	○					
2503	9031	新鶴鳴橋	東部建設事務所三原支所	広島県	尾道市	国道184号	1990	11.4	10.5	道路橋	2015	Ⅱ	2020	Ⅱ	2025						●					○					
2504	9032	新宝来橋	東部建設事務所三原支所	広島県	尾道市	国道184号	1973	20	17.3	道路橋	2015	Ⅱ	2020	Ⅲ	2025						●	■			★	○					
2505	9033	木船橋	東部建設事務所三原支所	広島県	尾道市	国道184号	1971	23.7	19.6	道路橋	2015	Ⅱ	2021	Ⅱ	2026							●					○				
2506	9034	無名橋（本郷）	東部建設事務所三原支所	広島県	尾道市	国道184号	1993	8.4	15.3	道路橋	2015	Ⅱ	2020	Ⅱ	2025						●					○					
2507	9036	無名橋（久津）	東部建設事務所三原支所	広島県	三原市	国道185号	1980	10.2	8.1	道路橋	2015	Ⅰ	2020	Ⅰ	2025						●					○					
2508	9037	とうり橋	東部建設事務所三原支所	広島県	三原市	国道185号	1971	2	10.7	道路橋	2015	Ⅰ	2020	Ⅰ	2025						●					○					
2509	9038	賑橋	東部建設事務所三原支所	広島県	三原市	国道185号	1951	7.4	6.8	道路橋	2015	Ⅲ	2022	Ⅲ	2027									■★●				○			
2510	9039	栄橋	東部建設事務所三原支所	広島県	三原市	国道185号	1954	26	6.7	道路橋	2015	Ⅰ	2020	Ⅱ	2025						●						○				
2511	9040	うじょう橋	東部建設事務所三原支所	広島県	三原市	国道185号	1969	4	10.9	道路橋	2015	Ⅱ	2020	Ⅱ	2025						●					○					
2512	9042	あおたにいちごう橋	東部建設事務所三原支所	広島県	三原市	国道185号	1970	2.9	10	道路橋	2015	Ⅱ	2020	Ⅲ	2025						●					○					
2513	9043	小林橋	東部建設事務所三原支所	広島県	三原市	国道185号	1969	2.3	8.8	道路橋	2015	Ⅰ	2020	Ⅱ	2025						●					○					
2514	9044	宇和島橋	東部建設事務所三原支所	広島県	三原市	国道185号	1969	3	10	道路橋	2015	Ⅱ	2020	Ⅱ	2025						●					○					
2515	9045	しも橋	東部建設事務所三原支所	広島県	三原市	国道185号	1959	2	9.5	道路橋	2015	Ⅲ	2020	Ⅲ	2025						●	★				○					
2516	9046	本田橋	東部建設事務所三原支所	広島県	三原市	国道185号	1955	2.1	15	道路橋	2015	Ⅰ	2020	Ⅱ	2025						●					○					
2517	9047	久和喜橋	東部建設事務所三原支所	広島県	三原市	国道185号	1958	6.6	11.2	道路橋	2015	Ⅰ	2020	Ⅰ	2025						●					○					
2518	9048	無名橋（須波西）	東部建設事務所三原支所	広島県	三原市	国道185号	1993	3.2	12.3	道路橋	2015	Ⅲ	2020	Ⅰ	2025						●					○					
2519	9049	どい橋	東部建設事務所三原支所	広島県	三原市	国道185号	1959	2	9	道路橋	2015	Ⅱ	2020	Ⅱ	2025						●					○					
2520	904901	本谷高架橋	東部建設事務所三原支所	広島県	三原市	県道本郷大和線	1988	13.6	8.5	道路橋	2018	Ⅱ	2023	Ⅱ	2028														○		
2521	904902	無名橋49-1	東部建設事務所三原支所	広島県	三原市	県道本郷大和線	2003	7.7	24	道路橋	2018	Ⅰ	2023	Ⅰ	2028														○		
2522	904904	正広陸橋	東部建設事務所三原支所	広島県	三原市	県道本郷大和線	1991	47.8	9.1	道路橋	2015	Ⅱ	2020	Ⅰ	2025						●					○					
2523	904905	平坂橋	東部建設事務所三原支所	広島県	三原市	県道本郷大和線	2000	92.6	11	道路橋	2018	Ⅰ	2023	Ⅰ	2028														○		
2524	904909	下中橋	東部建設事務所三原支所	広島県	三原市	県道本郷大和線	1976	17.6	11.8	道路橋	2015	Ⅱ	2020	Ⅱ	2025						●					○					
2525	904910	無名橋49-6	東部建設事務所三原支所	広島県	三原市	県道本郷大和線	2001	4.8	7.1	道路橋	2015	Ⅰ	2020	Ⅱ	2025						●					○					
2526	904912	無名橋49-8	東部建設事務所三原支所	広島県	三原市	県道本郷大和線	不明	3	5.7	道路橋	2015	Ⅱ	2020	Ⅰ	2025						●					○					
2527	904913	徳良橋	東部建設事務所三原支所	広島県	三原市	県道本郷大和線	1999	15.5	9.4	道路橋	2015	Ⅰ	2020	Ⅲ	2025	2023	2025				●				■		○	☆			
2528	9050	下どい橋	東部建設事務所三原支所	広島県	三原市	国道185号	1969	4.5	9.8	道路橋	2015	Ⅰ	2020	Ⅱ	2025						●					○					
2529	9051	江口橋	東部建設事務所三原支所	広島県	三原市	国道185号	1957	3	13.6	道路橋	2015	Ⅰ	2020	Ⅱ	2025						●					○					
2530	905101	岩上橋	東部建設事務所三原支所	広島県	世羅町	県道甲山甲奴上市線	1974	10.2	4.8	道路橋	2018	Ⅰ	2023	Ⅰ	2028														○		
2531	905102	河洲橋	東部建設事務所三原支所	広島県	世羅町	県道甲山甲奴上市線	1997	14.8	10.3	道路橋	2018	Ⅰ	2023	Ⅰ	2028														○		
2532	905103	新木徳橋	東部建設事務所三原支所	広島県	世羅町	県道甲山甲奴上市線	1988	18.6	9.5	道路橋	2018	Ⅰ	2022	Ⅰ	2027														○		
2533	9052	早瀬橋	東部建設事務所三原支所	広島県	三原市	国道185号	1965	2.2	10.6	道路橋	2015	Ⅰ	2020	Ⅰ	2025						●					○					
2534	9053	無名橋（貝野）	東部建設事務所三原支所	広島県	三原市	国道185号	1969	2.6	20.3	道路橋	2015	Ⅰ	2020	Ⅰ	2025						●					○					
2535	9054	無名橋（和田沖）	東部建設事務所三原支所	広島県	三原市	国道185号	1993	3.9	20.1	道路橋	2015	Ⅰ	2020	Ⅰ	2025						●					○					
2536	905401	無名橋54-1	東部建設事務所三原支所	広島県	尾道市	県道福山尾道線	1993	2.1	14.6	道路橋	2018	Ⅰ	2022	Ⅰ	2027														○		
2537	905402	無名橋54-2	東部建設事務所三原支所</																												

No.	橋梁番号	施設名	事務所名	所在地		路線名	架設年度	橋長 (m)	幅員 (m)	橋梁種別	1巡目点検		最新の点検結果		次回点検	令和7年度から令和10年度までの修繕計画				点検・修繕計画 ○：定期点検(予定), □:修繕着手(予定), ☆：修繕完了(予定) ●：定期点検済, ■:修繕着手済, ★：修繕完了済計画								備考			
				県名	市町名						点検年度	健全度	点検年度	健全度		点検年度	修繕着手年度	修繕完了年度	概算工事費 (100万円)	主な修繕内容	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2027	2028	
2579	905635	無名橋56-13	東部建設事務所三原支所	広島県	世羅町	県道府中世羅三和線	2001	2.4	13.2	道路橋	2018	I	2023	I	2028														○		
2580	905638	無名橋56-16	東部建設事務所三原支所	広島県	世羅町	県道府中世羅三和線	2016	4.7	22.3	道路橋	2017	I	2022	I	2027																
2581	905639	政国橋	東部建設事務所三原支所	広島県	世羅町	県道府中世羅三和線	1995	16	11	道路橋	2016	I	2021	II	2026				●										○		
2582	905640	無名橋56-17	東部建設事務所三原支所	広島県	世羅町	県道府中世羅三和線	2003	4.2	10.6	道路橋	2016	III	2021	II	2026				●												
2583	905641	無名橋56-18	東部建設事務所三原支所	広島県	世羅町	県道府中世羅三和線	不明	2.6	39	道路橋	2018	II	2023	II	2028														○		
2584	905642	新鹿田橋	東部建設事務所三原支所	広島県	世羅町	県道府中世羅三和線	不明	13.5	8.2	道路橋	2018	I	2023	I	2028														○		
2585	905643	鹿田中橋	東部建設事務所三原支所	広島県	世羅町	県道府中世羅三和線	1993	13.4	8.2	道路橋	2018	I	2023	I	2028														○		
2586	905644	鹿田大橋	東部建設事務所三原支所	広島県	世羅町	県道府中世羅三和線	1991	17	8.6	道路橋	2018	I	2023	I	2028														○		
2587	905645	城ノ本橋	東部建設事務所三原支所	広島県	世羅町	県道府中世羅三和線	不明	4.4	8	道路橋	2018	I	2023	I	2028														○		
2588	905646	宮沖橋	東部建設事務所三原支所	広島県	世羅町	県道府中世羅三和線	1984	18.7	8.9	道路橋	2018	II	2022	II	2027																
2589	905647	為常橋	東部建設事務所三原支所	広島県	世羅町	県道府中世羅三和線	1984	18.1	8.3	道路橋	2018	I	2022	I	2027														○		
2590	905648	大原橋	東部建設事務所三原支所	広島県	世羅町	県道府中世羅三和線	2000	21.5	11	道路橋	2018	I	2023	I	2028														○		
2591	905649	無名橋56-19	東部建設事務所三原支所	広島県	世羅町	県道府中世羅三和線	不明	2.4	7.7	道路橋	2018	II	2023	II	2028														○		
2592	905650	論田橋	東部建設事務所三原支所	広島県	世羅町	県道府中世羅三和線	1987	17.3	10.3	道路橋	2018	II	2022	I	2027				●										○		
2593	905652	上日南橋	東部建設事務所三原支所	広島県	世羅町	県道府中世羅三和線	1998	11.9	18.4	道路橋	2018	I	2023	I	2028														○		
2594	905653	海草橋	東部建設事務所三原支所	広島県	世羅町	県道府中世羅三和線	2000	16.9	26	道路橋	2018	I	2023	I	2028														○		
2595	905654	辰ノ口橋	東部建設事務所三原支所	広島県	三次市	県道府中世羅三和線	2002	11.6	11	道路橋	2018	I	2023	I	2028														○		
2596	9057	無名橋 (萩1)	東部建設事務所三原支所	広島県	尾道市	国道3 1 7 号	1980	2.6	25	道路橋	2018	II	2022	II	2027														○		
2597	9059	無名橋 (萩3)	東部建設事務所三原支所	広島県	尾道市	国道3 1 7 号	1998	2.9	17.9	道路橋	2018	II	2022	II	2027														○		
2598	905901	無名橋59-1	東部建設事務所三原支所	広島県	三原市	県道東広島本郷忠海線	1994	2.1	8.5	道路橋	2017	III	2022	III	2027				■										○		
2599	905902	本谷橋	東部建設事務所三原支所	広島県	三原市	県道東広島本郷忠海線	1994	4.1	8.5	道路橋	2017	II	2022	I	2027														○		
2600	905903	善入寺橋	東部建設事務所三原支所	広島県	三原市	県道東広島本郷忠海線	1996	13.8	10	道路橋	2017	I	2022	I	2027														○		
2601	905904	入野地橋	東部建設事務所三原支所	広島県	三原市	県道東広島本郷忠海線	1992	23.6	11	道路橋	2018	I	2023	I	2028														○		
2602	905905	日山地橋	東部建設事務所三原支所	広島県	三原市	県道東広島本郷忠海線	1996	10	11	道路橋	2017	I	2022	I	2027														○		
2603	905907	無名橋59-3	東部建設事務所三原支所	広島県	三原市	県道東広島本郷忠海線	1996	3.7	7.5	道路橋	2017	I	2022	I	2027														○		
2604	905909	北方橋	東部建設事務所三原支所	広島県	三原市	県道東広島本郷忠海線	1968	25	5	道路橋	2017	III	2022	III	2027				■★										○		
2605	905910	無名橋59-5	東部建設事務所三原支所	広島県	三原市	県道東広島本郷忠海線	2001	3.2	5.9	道路橋	2016	I	2021	I	2026				●										○		
2606	905912	姿沖橋	東部建設事務所三原支所	広島県	三原市	県道東広島本郷忠海線	1984	20.1	11.7	道路橋	2017	II	2022	II	2027														○		
2607	905913	無名橋59-6	東部建設事務所三原支所	広島県	三原市	県道東広島本郷忠海線	2001	4.6	26	道路橋	2016	II	2021	II	2026				●										○		
2608	905914	甲原橋	東部建設事務所三原支所	広島県	三原市	県道東広島本郷忠海線	1989	10.4	27.8	道路橋	2016	I	2021	I	2026				●										○		
2609	905915	関屋橋	東部建設事務所三原支所	広島県	三原市	県道東広島本郷忠海線	1997	6.3	10	道路橋	2017	III	2022	III	2027				■★										○		
2610	905916	無名橋59-7	東部建設事務所三原支所	広島県	三原市	県道東広島本郷忠海線	2007	6.8	11.6	道路橋	2017	I	2022	I	2027														○		
2611	905918	無名橋59-9	東部建設事務所三原支所	広島県	三原市	県道東広島本郷忠海線	2007	3.1	16	道路橋	2017	I	2022	I	2027														○		
2612	905919	無名橋59-10	東部建設事務所三原支所	広島県	三原市	県道東広島本郷忠海線	2007	3.5	20	道路橋	2017	I	2022	I	2027														○		
2613	9063	郷橋	東部建設事務所三原支所	広島県	尾道市	国道3 1 7 号	2000	5.1	7	道路橋	2017	II	2022	II	2027														○		
2614	9064	郷側道橋	東部建設事務所三原支所	広島県	尾道市	国道3 1 7 号	1987	5.1	1.9	道路橋	2017	II	2022	II	2027														○	</	

No.	橋梁番号	施設名	事務所名	所在地		路線名	架設年度	橋長(m)	幅員(m)	橋梁種別	1巡目点検		最新の点検結果		次回点検	令和7年度から令和10年度までの修繕計画				点検・修繕計画 ○：定期点検(予定), □:修繕着手(予定), ☆：修繕完了(予定) ●：定期点検済, ■:修繕着手済, ★：修繕完了済計画								備考		
				県名	市町名						点検年度	健全度	点検年度	健全度		点検年度	修繕着手年度	修繕完了年度	概算工事費(100万円)	主な修繕内容	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2027	2028
2656	9108	無名橋(美生)	東部建設事務所三原支所	広島県	三原市	国道486号	不明	4	10.1	道路橋	2015	I	2020	I	2025						●				○					
2657	9109	無名橋	東部建設事務所三原支所	広島県	三原市	国道486号	1991	2.7	10.6	道路橋	2015	I	2020	I	2025						●				○					
2658	9110	宮内橋	東部建設事務所三原支所	広島県	三原市	国道486号	1992	21.2	11.5	道路橋	2015	I	2020	II	2025						●				○					
2659	9112	無名橋	東部建設事務所三原支所	広島県	三原市	国道486号	1993	6	10.3	道路橋	2015	I	2020	I	2025						●				○					
2660	9113	沖田橋	東部建設事務所三原支所	広島県	三原市	国道486号	1978	18.6	9.8	道路橋	2015	I	2020	III	2025						●			★	○					
2661	9114	山口橋	東部建設事務所三原支所	広島県	三原市	国道486号	1993	24.3	14	道路橋	2015	I	2020	II	2025						●				○					
2662	9115	無名橋(流天橋)	東部建設事務所三原支所	広島県	三原市	国道486号	1993	4.5	9.6	道路橋	2015	I	2020	II	2025						●				○					
2663	9116	無名橋	東部建設事務所三原支所	広島県	三原市	国道486号	1991	4.5	8	道路橋	2015	I	2020	I	2025						●				○					
2664	9117	沖谷橋	東部建設事務所三原支所	広島県	三原市	国道486号	1993	10.6	10.5	道路橋	2015	I	2020	I	2025						●				○					
2665	9118	無名橋(大草)	東部建設事務所三原支所	広島県	三原市	国道486号	不明	6.1	9.4	道路橋	2015	II	2020	II	2025						●				○					
2666	9119	新上中橋	東部建設事務所三原支所	広島県	三原市	国道486号	1980	15	23.5	道路橋	2015	I	2020	I	2025						●				○					
2667	9120	不明橋	東部建設事務所三原支所	広島県	三原市	国道486号	1997	2.7	17.4	道路橋	2015	I	2020	I	2025						●				○					
2668	9121	新大和橋	東部建設事務所三原支所	広島県	三原市	国道486号	1971	15	7.8	道路橋	2015	I	2020	III	2025	2023	2025	11	支承補修工	●			■		○☆					
2669	9122	近末橋	東部建設事務所三原支所	広島県	三原市	国道486号	1987	37.5	9.6	道路橋	2015	II	2020	II	2025						●				○					
2670	9123	仲沖橋	東部建設事務所三原支所	広島県	三原市	国道486号	不明	13.6	9.7	道路橋	2015	II	2020	III	2025	2019	2025	40	断面修復工, ひび割れ注入工, 支承補修工	●					○☆					
2671	9124	新棕梨橋	東部建設事務所三原支所	広島県	三原市	国道486号	1974	50	9.9	道路橋	2015	I	2020	II	2025						●				○					
2672	9125	榎梨橋	東部建設事務所三原支所	広島県	三原市	国道486号	2013	7.5	11.2	道路橋	2015	II	2020	III	2025						●				○					
2673	9126	国近橋	東部建設事務所三原支所	広島県	三原市	国道486号	2010	10.5	16	道路橋	2015	II	2020	III	2025						●			■	★	○				
2674	9127	草井橋	東部建設事務所三原支所	広島県	三原市	国道486号	2012	2.3	13.4	道路橋	2015	I	2020	I	2025						●				○					
2675	9128	境橋	東部建設事務所三原支所	広島県	三原市	国道486号	2013	10	6.8	道路橋	2015	II	2020	II	2025						●				○					
2676	9140	臥竜橋1	東部建設事務所三原支所	広島県	三原市	県道三原東城線	1972	8.8	43	道路橋	2016	II	2021	II	2026							●					○			
2677	9141	恵下谷橋(臥竜橋2)	東部建設事務所三原支所	広島県	三原市	県道三原東城線	1992	9.9	99.4	道路橋	2016	II	2021	II	2026						●					○				
2678	9142	臥竜橋3	東部建設事務所三原支所	広島県	三原市	県道三原東城線	1975	9	7.2	道路橋	2016	II	2021	II	2026						●					○				
2679	9143	臥竜橋4	東部建設事務所三原支所	広島県	三原市	県道三原東城線	1975	7	7.2	道路橋	2016	II	2021	II	2026						●					○				
2680	9144	臥竜橋5	東部建設事務所三原支所	広島県	三原市	県道三原東城線	1975	6	7.2	道路橋	2016	I	2021	I	2026						●					○				
2681	9145	臥竜橋6	東部建設事務所三原支所	広島県	三原市	県道三原東城線	1975	7.3	4.1	道路橋	2016	I	2021	I	2026						●					○				
2682	9146	臥竜橋7	東部建設事務所三原支所	広島県	三原市	県道三原東城線	1975	6.5	7.2	道路橋	2016	I	2021	I	2026						●					○				
2683	9147	臥竜橋8	東部建設事務所三原支所	広島県	三原市	県道三原東城線	1975	7.3	4.1	道路橋	2016	I	2021	I	2026						●					○				
2684	9148	臥竜橋9	東部建設事務所三原支所	広島県	三原市	県道三原東城線	1975	6	7.2	道路橋	2016	I	2021	I	2026						●					○				
2685	9149	臥竜橋10	東部建設事務所三原支所	広島県	三原市	県道三原東城線	1975	40.9	9.4	道路橋	2016	I	2021	I	2026						●					○				
2686	9150	思案橋	東部建設事務所三原支所	広島県	三原市	県道三原東城線	1995	20	11.1	道路橋	2016	I	2021	I	2026						●					○				
2687	9151	恵下谷小橋	東部建設事務所三原支所	広島県	三原市	県道三原東城線	1999	21.5	7	道路橋	2016	I	2021	I	2026						●					○				
2688	9152	恵下谷大橋	東部建設事務所三原支所	広島県	三原市	県道三原東城線	1999	66	7	道路橋	2016	I	2021	I	2026						●					○				
2689	9153	鷹見橋	東部建設事務所三原支所	広島県	三原市	県道三原東城線	1993	8.2	12.2	道路橋	2016	I	2021	I	2026						●					○				
2690	9154	加井知橋	東部建設事務所三原支所	広島県	三原市	県道三原東城線	1993	6.2	12.8	道路橋	2016	I	2021	II	2026						●					○				
2691	9155	チョウジャ橋	東部建設事務所三原支所	広島県	三原市	県道三原東城線	1967	4	12.2	道路橋	2016	II	2021	II	2026						●					○				
2692	9156	オイタテ橋	東部建設事務所三原支所																											

No.	橋梁番号	施設名	事務所名	所在地		路線名	架設年度	橋長(m)	幅員(m)	橋梁種別	1巡目点検		最新の点検結果		次回点検	令和7年度から令和10年度までの修繕計画				点検・修繕計画 ○：定期点検(予定), □:修繕着手(予定), ☆：修繕完了(予定) ●：定期点検済, ■:修繕着手済, ★：修繕完了済計画								備考		
				県名	市町名						点検年度	健全度	点検年度	健全度		点検年度	修繕着手年度	修繕完了年度	概算工事費(100万円)	主な修繕内容	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2027	2028
2733	9239	無名橋48-5	東部建設事務所三原支所	広島県	尾道市	県道府中松永線	1996	3	11.9	道路橋	2016	I	2021	I	2026										○					
2734	9240	田中2号橋	東部建設事務所三原支所	広島県	尾道市	県道府中松永線	2001	32	5.5	道路橋	2016	I	2021	I	2026										○					
2735	9250	無名橋52-1	東部建設事務所三原支所	広島県	世羅町	県道世羅甲田線	2015	4	8.8	道路橋	2016	II	2021	II	2026										○					
2736	9251	津口大橋	東部建設事務所三原支所	広島県	世羅町	県道世羅甲田線	不明	19.9	10	道路橋	2016	I	2021	I	2026										○					
2737	9252	一ツ橋	東部建設事務所三原支所	広島県	世羅町	県道世羅甲田線	1988	20.4	11	道路橋	2016	II	2021	II	2026										○					
2738	9253	松屋橋	東部建設事務所三原支所	広島県	世羅町	県道世羅甲田線	1967	6.5	6.9	道路橋	2016	II	2021	II	2026										○					
2739	9254	無名橋52-2	東部建設事務所三原支所	広島県	世羅町	県道世羅甲田線	不明	4	31	道路橋	2016	I	2021	I	2026										○					
2740	9256	永谷橋	東部建設事務所三原支所	広島県	世羅町	県道世羅甲田線	不明	11.3	8.7	道路橋	2016	I	2021	I	2026										○					
2741	9257	大首橋	東部建設事務所三原支所	広島県	世羅町	県道世羅甲田線	2005	35	7.2	道路橋	2018	II	2022	II	2027												○			
2742	9260	空港前橋（上り線）	東部建設事務所三原支所	広島県	三原市	県道広島空港線	1988	33	12	道路橋	2016	II	2021	II	2026											○				
2743	9261	空港前橋（下り線）	東部建設事務所三原支所	広島県	三原市	県道広島空港線	1991	33	14.5	道路橋	2016	II	2021	II	2026											○				
2744	9262	無名橋73-1	東部建設事務所三原支所	広島県	三原市	県道広島空港線	1992	6	23.5	道路橋	2016	I	2021	I	2026											○				
2745	9270	沢橋	東部建設事務所三原支所	広島県	尾道市	県道生口島循環線	1999	15.6	18.8	道路橋	2018	I	2022	I	2027												○			
2746	9271	城山橋	東部建設事務所三原支所	広島県	尾道市	県道生口島循環線	1987	8.6	12.6	道路橋	2016	I	2021	I	2026											○				
2747	9272	無名橋81-1	東部建設事務所三原支所	広島県	尾道市	県道生口島循環線	1999	6	7	道路橋	2016	II	2021	II	2026											○				
2748	9273	無名橋81-1側道橋	東部建設事務所三原支所	広島県	尾道市	県道生口島循環線	1999	6.8	3	道路橋	2016	III	2021	II	2026											○				
2749	9274	無名橋81-2	東部建設事務所三原支所	広島県	尾道市	県道生口島循環線	1999	10.4	12.9	道路橋	2016	II	2021	II	2026											○				
2750	9275	西沖田橋	東部建設事務所三原支所	広島県	尾道市	県道生口島循環線	1998	56.8	16.8	道路橋	2016	II	2021	II	2026											○				
2751	9276	沖田川橋	東部建設事務所三原支所	広島県	尾道市	県道生口島循環線	1997	11.3	16.8	道路橋	2016	I	2021	II	2026											○				
2752	9277	林中央橋	東部建設事務所三原支所	広島県	尾道市	県道生口島循環線	2001	47.8	5.5	道路橋	2016	I	2021	I	2026											○				
2753	9279	名荷橋	東部建設事務所三原支所	広島県	尾道市	県道生口島循環線	1994	30	13	道路橋	2016	II	2021	I	2026											○				
2754	9280	無名橋81-4	東部建設事務所三原支所	広島県	尾道市	県道生口島循環線	1991	6.2	21.9	道路橋	2016	II	2021	II	2026											○				
2755	9281	無名橋81-5	東部建設事務所三原支所	広島県	尾道市	県道生口島循環線	1991	3.7	13.3	道路橋	2016	II	2021	I	2026											○				
2756	9282	無名橋81-6	東部建設事務所三原支所	広島県	尾道市	県道生口島循環線	1991	6	12	道路橋	2016	III	2021	III	2026											○				
2757	9283	無名橋81-7	東部建設事務所三原支所	広島県	尾道市	県道生口島循環線	1989	3.5	18.4	道路橋	2017	III	2022	I	2027												○			
2758	9284	無名橋81-8	東部建設事務所三原支所	広島県	尾道市	県道生口島循環線	1999	5.3	11.5	道路橋	2017	I	2022	I	2027												○			
2759	9285	熱田橋	東部建設事務所三原支所	広島県	尾道市	県道生口島循環線	2001	6.5	17.1	道路橋	2017	II	2022	II	2027												○			
2760	9290	無名橋82-1	東部建設事務所三原支所	広島県	三原市	県道広島空港本郷線	1993	3.7	14	道路橋	2016	II	2021	II	2026											○				
2761	9291	無名橋82-2	東部建設事務所三原支所	広島県	三原市	県道広島空港本郷線	1993	2	18	道路橋	2016	II	2021	II	2026											○				
2762	9292	梨羽橋	東部建設事務所三原支所	広島県	三原市	県道広島空港本郷線	1992	60.5	9.2	道路橋	2016	II	2021	II	2026											○				
2763	9293	観音橋	東部建設事務所三原支所	広島県	三原市	県道広島空港本郷線	1993	23.8	9.2	道路橋	2016	II	2021	II	2026											○				
2764	9294	岩屋橋	東部建設事務所三原支所	広島県	三原市	県道広島空港本郷線	1993	73	9.2	道路橋	2016	I	2021	I	2026											○				
2765	9295	無名橋82-3	東部建設事務所三原支所	広島県	三原市	県道広島空港本郷線	1993	4	10.1	道路橋	2016	I	2021	I	2026											○				
2766	9296	無名橋82-4	東部建設事務所三原支所	広島県	三原市	県道広島空港本郷線	1993	6	10.5	道路橋	2016	I	2021	I	2026											○				
2767	9297	無名橋82-5	東部建設事務所三原支所	広島県	三原市	県道広島空港本郷線	1993	4	11.5	道路橋	2016	I	2021	I	2026											○				
2768	9298	船木大橋	東部建設事務所三原支所	広島県	三原市	県道広島空港本郷線	1992	97	14	道路橋	2016	II	2021	II	2026											○				
2769	9299	無名橋82-6	東部建設事務所三原支所	広島県	三原市	県道広島空港本郷線	1993	3.5	7.6	道路橋	2016	I	2021	I	2026											○				
2770	9300	切子陸橋	東部建設事務所三原支所	広島県	三原市	県道広島空港本郷線	1992	57	9.8	道路橋																				

No.	橋梁番号	施設名	事務所名	所在地		路線名	架設年度	橋長 (m)	幅員 (m)	橋梁種別	1巡目点検		最新の点検結果		次回点検	令和7年度から令和10年度までの修繕計画				点検・修繕計画 ○：定期点検(予定), □:修繕着手(予定), ☆：修繕完了(予定) ●：定期点検済, ■:修繕着手済, ★：修繕完了済計画									備考		
				県名	市町名						点検年度	健全度	点検年度	健全度		点検年度	修繕着手年度	修繕完了年度	概算工事費 (100万円)	主な修繕内容	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		2028	
2810	11004	岩田橋	北部建設事務所	広島県	三次市	国道184号	1964	6.5	8.8	道路橋	2015	Ⅱ	2020	Ⅱ	2025					●					○						
2811	11006	緑橋	北部建設事務所	広島県	三次市	国道184号	1964	18.1	8	道路橋	2015	Ⅱ	2020	Ⅱ	2025					●					○						
2812	11008	八幡橋	北部建設事務所	広島県	三次市	国道184号	1980	40	11.8	道路橋	2015	Ⅱ	2020	Ⅱ	2025					●					○						
2813	11009	十王堂橋	北部建設事務所	広島県	三次市	国道184号	1973	88.7	9.5	道路橋	2015	Ⅱ	2021	Ⅲ	2026	2024	2027	275	部分塗替工, ひび割れ注入工, 支承補修工		●				■		○		☆		
2814	11010	三良坂大橋	北部建設事務所	広島県	三次市	国道184号	1972	66.2	8.5	道路橋	2015	Ⅱ	2020	Ⅱ	2025					●					○						
2815	11011	三良坂大橋側道橋	北部建設事務所	広島県	三次市	国道184号	1998	66.2	3.5	道路橋	2015	Ⅱ	2020	Ⅰ	2025					●					○						
2816	11012	吉舎大橋	北部建設事務所	広島県	三次市	国道184号	1976	66.5	12.8	道路橋	2015	Ⅱ	2021	Ⅱ	2026						●						○				
2817	11013	岩谷橋	北部建設事務所	広島県	三次市	国道184号	1971	13	10.4	道路橋	2015	Ⅱ	2020	Ⅲ	2025					●				■	★	○□☆					
2818	11015	船山橋	北部建設事務所	広島県	三次市	国道184号	1973	25.2	9.6	道路橋	2015	Ⅱ	2021	Ⅱ	2026						●				■	★	☆	○			
2819	11016	塩之段橋	北部建設事務所	広島県	三次市	国道184号	1979	40	11.5	道路橋	2015	Ⅱ	2020	Ⅱ	2025						●						○				
2820	11017	河角橋	北部建設事務所	広島県	三次市	国道184号	1980	29	12.5	道路橋	2015	Ⅱ	2020	Ⅱ	2025						●						○				
2821	11018	松原橋	北部建設事務所	広島県	三次市	国道184号	1987	38.8	11	道路橋	2015	Ⅱ	2020	Ⅰ	2025						●						○				
2822	11019	鳴戸橋	北部建設事務所	広島県	三次市	国道184号	1983	34.4	10	道路橋	2015	Ⅰ	2020	Ⅰ	2025						●						○				
2823	11020	大懸橋	北部建設事務所	広島県	三次市	国道375号	1976	5.3	7	道路橋	2015	Ⅱ	2020	Ⅰ	2025						●						○				
2824	11021	幸城橋	北部建設事務所	広島県	三次市	国道375号	1973	7	7.7	道路橋	2015	Ⅱ	2020	Ⅰ	2025						●						○				
2825	11022	有原橋	北部建設事務所	広島県	三次市	国道375号	1989	51.4	10	道路橋	2015	Ⅱ	2020	Ⅱ	2025	2023	2026	280	部分塗替工, ひび割れ注入工, 耐震補強工						■			○		☆	
2826	11023	三若橋	北部建設事務所	広島県	三次市	国道375号	1989	61.4	11	道路橋	2015	Ⅱ	2020	Ⅱ	2025	2020	2025	295	部分塗替工, ひび割れ注入工, 耐震補強工	●■							○		☆		
2827	11024	石原橋	北部建設事務所	広島県	三次市	国道375号	1990	61.8	11	道路橋	2015	Ⅱ	2020	Ⅱ	2025					●■							○				
2828	11025	海渡橋	北部建設事務所	広島県	三次市	国道375号	1992	61	11	道路橋	2015	Ⅱ	2020	Ⅱ	2025					●■							○				
2829	11026	新五反田橋	北部建設事務所	広島県	三次市	国道375号	1985	19.5	12	道路橋	2015	Ⅱ	2020	Ⅱ	2025						●						○				
2830	11027	岩倉橋	北部建設事務所	広島県	三次市	国道375号	1981	19	11	道路橋	2015	Ⅱ	2020	Ⅰ	2025						●						○				
2831	1102701	本郷橋	北部建設事務所	広島県	三次市	県道吉舎油木線	1964	21.1	6.8	道路橋	2016	Ⅱ	2021	Ⅱ	2026							●						○			
2832	1102702	吉舎谷橋	北部建設事務所	広島県	三次市	県道吉舎油木線	1976	19.1	8.3	道路橋	2016	Ⅱ	2021	Ⅱ	2026								●					○			
2833	1102703	高丸2号橋	北部建設事務所	広島県	三次市	県道吉舎油木線	1976	3	7.3	道路橋	2014	Ⅰ	2024	Ⅰ	2029											●					
2834	1102705	大谷橋	北部建設事務所	広島県	三次市	県道吉舎油木線	1966	4.7	10	道路橋	2014	Ⅰ	2024	Ⅰ	2029											●					
2835	11028	廻神橋	北部建設事務所	広島県	三次市	国道375号	1981	22.5	14	道路橋	2015	Ⅰ	2020	Ⅰ	2025					●							○				
2836	1102801	落合橋	北部建設事務所	広島県	三次市	県道吉舎豊栄線	1976	37.5	9.3	道路橋	2016	Ⅱ	2020	Ⅱ	2025							●						○			
2837	1102802	水口橋	北部建設事務所	広島県	三次市	県道吉舎豊栄線	1963	37	7	道路橋	2016	Ⅰ	2021	Ⅱ	2026								●					○			
2838	11029	新宮谷橋	北部建設事務所	広島県	三次市	国道375号	2002	17	10.5	道路橋	2015	Ⅰ	2020	Ⅰ	2025						●						○				
2839	11031	三角橋	北部建設事務所	広島県	三次市	国道375号	2000	46.5	13.8	道路橋	2015	Ⅱ	2020	Ⅰ	2025						●						○				
2840	11032	新作木橋	北部建設事務所	広島県	三次市	国道375号	1981	41.2	10.5	道路橋	2015	Ⅱ	2020	Ⅲ	2025						●						○				
2841	11033	折敷谷橋	北部建設事務所	広島県	三次市	国道375号	2000	11.6	13.8	道路橋	2015	Ⅰ	2020	Ⅰ	2025						●				■	★	○				
2842	11034	新大津橋	北部建設事務所	広島県	三次市	国道375号	1989	28.5	10	道路橋	2015	Ⅱ	2020	Ⅰ	2025						●						○				
2843	11039	堂々橋	北部建設事務所	広島県	三次市	県道広島三次線	1988	9.3	11.1	道路橋	2016	Ⅰ	2021	Ⅱ	2026							●						○			
2844	11040	新永屋橋	北部建設事務所	広島県	三次市	県道広島三次線	1994	26	11	道路橋	2016	Ⅰ	2021	Ⅱ	2026							●						○			
2845	11041	落合橋	北部建設事務所	広島県	三次市	県道広島三次線	1967	37.2	6.8	道路橋	2016	Ⅲ	2021	Ⅲ	2026							●			■★	★		○			

[illegible]

No.	橋梁番号	施設名	事務所名	所在地		路線名	架設年度	橋長 (m)	幅員 (m)	橋梁種別	1巡目点検		最新の点検結果		次回点検	令和7年度から令和10年度までの修繕計画				点検・修繕計画 ○：定期点検(予定), □:修繕着手(予定), ☆：修繕完了(予定) ●：定期点検済, ■:修繕着手済, ★：修繕完了済										備考	
				県名	市町名						点検年度	健全度	点検年度	健全度		点検年度	修繕着手年度	修繕完了年度	概算工事費 (100万円)	主な修繕内容	実績 計画										
																					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
2964	11176	新稲荷橋	北部建設事務所	広島県	三次市	県道三和大和線	1995	18	10.3	道路橋	2018	I	2023	I	2028						●						○				
2965	11177	新観音橋	北部建設事務所	広島県	三次市	県道三和大和線	1997	14	10.3	道路橋	2018	I	2023	I	2028						●						○				
2966	11179	中郷橋	北部建設事務所	広島県	三次市	県道新市三次線	1994	7	10.3	道路橋	2017	I	2022	I	2027					●						○					
2967	1118301	紙屋1号橋	北部建設事務所	広島県	三次市	国道183号	1967	30	7.8	道路橋	2016	II	2021	II	2026										○						
2968	1118302	紙屋2号橋	北部建設事務所	広島県	三次市	国道183号	1966	20	7.8	道路橋	2016	II	2021	II	2026	2023	2025	17	ひび割れ注入工		●		■		☆	○					
2969	1118401	岡田大橋	北部建設事務所	広島県	三次市	国道184号	1975	80	11	道路橋	2015	II	2021	II	2026						●					○					
2970	1118402	来源橋	北部建設事務所	広島県	三次市	国道184号	1967	27	8	道路橋	2015	II	2020	II	2025					●					○						
2971	1118403	十王堂跨線橋	北部建設事務所	広島県	三次市	国道184号	1973	20.7	10.4	道路橋	2015	II	2022	II	2026							●				○					
2972	11217	横川橋	北部建設事務所	広島県	三次市	県道羽出庭向原線	1961	6.7	9.5	道路橋	2016	I	2021	I	2026					●						○					
2973	11218	袋地橋	北部建設事務所	広島県	三次市	県道羽出庭向原線	1988	7	9.5	道路橋	2018	I	2023	I	2028												○				
2974	11226	寿橋	北部建設事務所	広島県	三次市	国道183号	1968	176.5	10.8	道路橋	2016	I	2021	III	2026											○					
2975	11227	大迫橋	北部建設事務所	広島県	三次市	国道183号	1964	2	10.7	道路橋	2016	II	2021	II	2026					●						○					
2976	11228	ボックスカルバート	北部建設事務所	広島県	三次市	国道183号	不明	3.4	14.1	道路橋	2016	I	2021	I	2026					●						○					
2977	11229	梅ヶ坪橋	北部建設事務所	広島県	三次市	国道183号	1971	3.2	9.2	道路橋	2016	III	2021	I	2026					●						○					
2978	11230	新美波羅橋	北部建設事務所	広島県	三次市	国道184号	1969	150	8.8	道路橋	2015	II	2021	II	2026					●						○					
2979	11231	ボックスカルバート	北部建設事務所	広島県	三次市	国道184号	1975	4.3	11	道路橋	2015	II																			

No.	橋梁番号	施設名	事務所名	所在地		路線名	架設年度	橋長 (m)	幅員 (m)	橋梁種別	1巡目点検		最新の点検結果		次回点検	令和7年度から令和10年度までの修繕計画				点検・修繕計画 ○：定期点検(予定), □:修繕着手(予定), ☆：修繕完了(予定) ●：定期点検済, ■:修繕着手済, ★：修繕完了済									備考	
				県名	市町名						点検年度	健全度	点検年度	健全度		点検年度	修繕着手年度	修繕完了年度	概算工事費 (100万円)	主な修繕内容	実績 計画									
																					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		2028
3041	102029001	岩ノ城橋	北部建設事務所	広島県	安芸高田市	県道吉田豊栄線	1962	142.1	6.6	道路橋	2014	Ⅲ	2024	Ⅰ	2029								●							
3042	102029002	岩ノ城歩道橋	北部建設事務所	広島県	安芸高田市	県道吉田豊栄線	1984	142.5	3.3	道路橋	2018	Ⅲ	2023	Ⅲ	2028	2024	2026	100	部分塗替工, ひび割れ注入工, 支承補修工				●★	■		☆		○		
3043	102029003	向原陸橋	北部建設事務所	広島県	安芸高田市	県道吉田豊栄線	1964	10.5	7.4	道路橋	2018	Ⅱ	2023	Ⅱ	2028								●				○			
3044	102029006	無名橋	北部建設事務所	広島県	安芸高田市	県道吉田豊栄線	不明	2.1	7.4	道路橋	2016	Ⅱ	2021	Ⅱ	2026											○				
3045	102029008	大土橋	北部建設事務所	広島県	安芸高田市	県道吉田豊栄線	1962	7.6	6.9	道路橋	2017	Ⅰ	2022	Ⅰ	2027								●					○		
3046	102029009	門出橋	北部建設事務所	広島県	安芸高田市	県道吉田豊栄線	2001	41.2	15.8	道路橋	2018	Ⅱ	2023	Ⅱ	2028									●				○		
3047	102029010	平林橋	北部建設事務所	広島県	安芸高田市	県道吉田豊栄線	2000	41.6	15.8	道路橋	2018	Ⅰ	2023	Ⅰ	2028									●				○		
3048	102029011	無名橋	北部建設事務所	広島県	安芸高田市	県道吉田豊栄線	1993	2.2	6.6	道路橋	2018	Ⅱ	2023	Ⅱ	2028									●				○		
3049	102029012	千日橋	北部建設事務所	広島県	安芸高田市	県道吉田豊栄線	1956	12.8	6.5	道路橋	2017	Ⅱ	2022	Ⅱ	2027								●					○		
3050	102029013	出口橋	北部建設事務所	広島県	安芸高田市	県道吉田豊栄線	1959	6.7	8.1	道路橋	2017	Ⅰ	2022	Ⅱ	2027									●				○		
3051	102029014	掛山橋	北部建設事務所	広島県	安芸高田市	県道吉田豊栄線	1993	3.8	7.9	道路橋	2018	Ⅱ	2023	Ⅱ	2028									●				○		
3052	102037001	小丸子橋	北部建設事務所	広島県	安芸高田市	県道広島三次線	1968	45	8.7	道路橋	2016	Ⅲ	2021	Ⅲ	2026									★			○			
3053	102037002	新高大地橋	北部建設事務所	広島県	安芸高田市	県道広島三次線	1969	47.1	7.4	道路橋	2015	Ⅱ	2021	Ⅲ	2026												○			
3054	102037005	無名橋	北部建設事務所	広島県	安芸高田市	県道広島三次線	1998	2.8	10.5	道路橋	2015	Ⅱ	2020	Ⅱ	2025					●						○				
3055	102052002	無名橋	北部建設事務所	広島県	安芸高田市	県道世羅甲田線	1978	2.6	7.7	道路橋	2016	Ⅱ	2021	Ⅱ	2026									●			○			
3056	102052003	智徳橋	北部建設事務所	広島県	安芸高田市	県道世羅甲田線	1978	114.5	10.4	道路橋	2016	Ⅱ	2021	Ⅲ	2026									●			○			
3057	102052004	五龍橋	北部建設事務所	広島県	安芸高田市	県道世羅甲田線	1997	49.2	10.3	道路橋	2016	Ⅰ	2021	Ⅰ	2026									●			○			
3058	102064001	房後橋	北部建設事務所	広島県	安芸高田市	県道三次美土里線	1990	5.5	14.8	道路橋	2017	Ⅰ	2022	Ⅰ	2027									●				○		
3059	102064002	深渡大橋	北部建設事務所	広島県	安芸高田市	県道三次美土里線	1979	145	10.3	道路橋	2016	Ⅲ	2021	Ⅲ	2026									●						
3060	102069001	向山大橋	北部建設事務所	広島県	安芸高田市	県道千代田八千代線	1990	55	11	道路橋	2018	Ⅲ	2023	Ⅰ	2028							■	★	●★				○		
3061	102080001	無名橋01	北部建設事務所	広島県	安芸高田市	県道東広島向原線	1964	2.4	4.4	道路橋	2014	Ⅱ	2024	Ⅱ	2029										●					
3062	102080002	無名橋02	北部建設事務所	広島県	安芸高田市	県道東広島向原線	1964	3.4	4.3	道路橋	2014	Ⅱ	2024	Ⅱ	2029									●						
3063	102080003	ボックスカルバート	北部建設事務所	広島県	安芸高田市	県道東広島向原線	2002	6	18.8	道路橋	2014	Ⅰ	2024	Ⅰ	2029									●						
3064	102080004	鷹ノ巣山橋	北部建設事務所	広島県	安芸高田市	県道東広島向原線	1999	21.7	13.6	道路橋	2014	Ⅱ	2024	Ⅱ	2029									●						
3065	102080005	見坂橋	北部建設事務所	広島県	安芸高田市	県道東広島向原線	1999	20	10	道路橋	2014	Ⅰ	2024	Ⅰ	2029									●						
3066	102080006	瀬戸田橋	北部建設事務所	広島県	安芸高田市	県道東広島向原線	2000	11.7	11	道路橋	2014	Ⅱ	2024	Ⅰ	2029									●						
3067	102080007	竜王橋	北部建設事務所	広島県	安芸高田市	県道東広島向原線	1976	6.5	8.5	道路橋	2014	Ⅱ	2024	Ⅰ	2029									●						
3068	102080008	大正橋	北部建設事務所	広島県	安芸高田市	県道東広島向原線	1990	23.2	8.5	道路橋	2014	Ⅱ	2024	Ⅰ	2029									●						
3069	102080009	千田橋	北部建設事務所	広島県	安芸高田市	県道東広島向原線	1974	30.9	8.9	道路橋	2014	Ⅱ	2024	Ⅱ	2029									●						
3070	102080010	長田橋	北部建設事務所	広島県	安芸高田市	県道東広島向原線	1974	24.8	9.8	道路橋	2014	Ⅰ	2024	Ⅱ	2029									●						
3071	103109001	須美川橋	北部建設事務所	広島県	安芸高田市	県道邑南高宮線	1967	22.5	4.2	道路橋	2018	Ⅲ	2023	Ⅲ	2028										●★			○		
3072	103109002	三田橋	北部建設事務所	広島県	安芸高田市	県道邑南高宮線	1967	14	4	道路橋	2014	Ⅱ	2024	Ⅱ	2029									●						
3073	103109003	紫野橋	北部建設事務所	広島県	安芸高田市	県道邑南高宮線	不明	5.3	3.5	道路橋	2014	Ⅱ	2024	Ⅱ	2029									●						
3074	103109004	大飛橋	北部建設事務所	広島県	安芸高田市	県道邑南高宮線	1965	26	4	道路橋	2014	Ⅱ	2024	Ⅱ	2029									●						
3075	103109005	安妙寺橋	北部建設事務所	広島県	安芸高田市	県道邑南高宮線	1965	27.1	4	道路橋	2014	Ⅱ	2024	Ⅱ	2029									●						
3076	103112001	乙木橋	北部建設事務所	広島県	安芸高田市	県道三次江津線	1964	38	4.5	道路橋	2014	Ⅲ	2024	Ⅱ	2029									●						
3077	103112003	一信木橋	北部建設																											

No.	橋梁番号	施設名	事務所名	所在地		路線名	架設年度	橋長 (m)	幅員 (m)	橋梁種別	1巡目点検		最新の点検結果		次回点検	令和7年度から令和10年度までの修繕計画				点検・修繕計画 ○：定期点検(予定), □:修繕着手(予定), ☆：修繕完了(予定) ●：定期点検済, ■:修繕着手済, ★：修繕完了済							備考					
				県名	市町名						点検年度	健全度	点検年度	健全度		点検年度	修繕着手年度	修繕完了年度	概算工事費 (100万円)	主な修繕内容	2020	2021	2022	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
															実績 計画																	
3118	103322004	船木大仙橋	北部建設事務所	広島県	安芸高田市	県道北船木線	1980	48.7	8.2	道路橋	2014	Ⅱ	2024	Ⅱ	2029									●								
3119	103322005	下船木橋	北部建設事務所	広島県	安芸高田市	県道北船木線	1980	55	7	道路橋	2014	Ⅱ	2024	Ⅱ	2029									●								
3120	103323001	叶谷橋	北部建設事務所	広島県	安芸高田市	県道中北川根線	2007	6.9	6.9	道路橋	2014	Ⅲ	2024	Ⅰ	2029									●								
3121	103323002	大久保橋	北部建設事務所	広島県	安芸高田市	県道中北川根線	1987	11.3	8.4	道路橋	2014	Ⅱ	2024	Ⅰ	2029									●								
3122	103323003	新二重谷橋	北部建設事務所	広島県	安芸高田市	県道中北川根線	2005	19.5	12	道路橋	2014	Ⅰ	2024	Ⅰ	2029									●								
3123	103323004	亀谷橋	北部建設事務所	広島県	安芸高田市	県道中北川根線	2004	26.5	12	道路橋	2014	Ⅰ	2024	Ⅰ	2029									●								
3124	103323005	大仙橋	北部建設事務所	広島県	安芸高田市	県道中北川根線	2000	31.5	12	道路橋	2014	Ⅰ	2024	Ⅰ	2029									●								
3125	103323006	紫陽花橋	北部建設事務所	広島県	安芸高田市	県道中北川根線	1994	21.3	10.3	道路橋	2014	Ⅱ	2024	Ⅱ	2029									●								
3126	103323007	若鮎橋	北部建設事務所	広島県	安芸高田市	県道中北川根線	1993	42.1	10.4	道路橋	2014	Ⅰ	2024	Ⅱ	2029									●								
3127	103325001	ボックスカルバート	北部建設事務所	広島県	安芸高田市	県道船木上福田線	1996	2.5	11.1	道路橋	2014	Ⅱ	2024	Ⅰ	2029									●								
3128	103326001	雨乞大橋	北部建設事務所	広島県	安芸高田市	県道原田吉田線	2002	58	12	道路橋	2014	Ⅱ	2024	Ⅱ	2029									●								
3129	103326003	堺川橋	北部建設事務所	広島県	安芸高田市	県道原田吉田線	2002	5.1	4.1	道路橋	2014	Ⅱ	2024	Ⅱ	2029									●								
3130	103326004	清水橋	北部建設事務所	広島県	安芸高田市	県道原田吉田線	2003	13.8	12	道路橋	2014	Ⅰ	2024	Ⅰ	2029									●								
3131	103326005	山之内橋	北部建設事務所	広島県	安芸高田市	県道原田吉田線	2002	13.4	12	道路橋	2014	Ⅱ	2024	Ⅰ	2029									●								
3132																																

[illegible]

No.	橋梁番号	施設名	事務所名	所在地		路線名	架設年度	橋長 (m)	幅員 (m)	橋梁種別	1巡目点検		最新の点検結果		次回点検	令和7年度から令和10年度までの修繕計画				点検・修繕計画 ○：定期点検(予定), □:修繕着手(予定), ☆：修繕完了(予定) ●：定期点検済, ■:修繕着手済, ★：修繕完了済計画								備考		
				県名	市町名						点検年度	健全度	点検年度	健全度		点検年度	修繕着手年度	修繕完了年度	概算工事費 (100万円)	主な修繕内容	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2027	2028
3272	100342204	無名橋 (7750.0)	北部建設事務所庄原支所	広島県	庄原市	県道中領家庄原線	1950	3.1	7.5	道路橋	2014	Ⅱ	2024	Ⅱ	2029									●						
3273	100342206	葦嶺橋	北部建設事務所庄原支所	広島県	庄原市	県道中領家庄原線	1991	8.9	10.5	道路橋	2014	Ⅰ	2024	Ⅰ	2029									●						
3274	100342207	後谷橋	北部建設事務所庄原支所	広島県	庄原市	県道中領家庄原線	1910	2.4	7.1	道路橋	2014	Ⅱ	2024	Ⅱ	2029									●						
3275	100342208	永末橋	北部建設事務所庄原支所	広島県	庄原市	県道中領家庄原線	1967	6	6.8	道路橋	2017	Ⅲ	2022	Ⅰ	2027								●				○			
3276	100342209	永末橋側道橋	北部建設事務所庄原支所	広島県	庄原市	県道中領家庄原線	1977	7	2.8	道路橋	2017	Ⅰ	2022	Ⅰ	2027								●				○			
3277	100342210	新清見橋	北部建設事務所庄原支所	広島県	庄原市	県道中領家庄原線	1998	7.4	13.2	道路橋	2014	Ⅰ	2024	Ⅰ	2029									●						
3278	100342211	永江橋	北部建設事務所庄原支所	広島県	庄原市	県道中領家庄原線	1960	3.8	11.1	道路橋	2014	Ⅱ	2024	Ⅱ	2029									●						
3279	100342301	沖田橋	北部建設事務所庄原支所	広島県	庄原市	県道原谷神石線	1978	6.4	8.2	道路橋	2014	Ⅰ	2024	Ⅰ	2029									●						
3280	100342302	渡瀬橋	北部建設事務所庄原支所	広島県	庄原市	県道原谷神石線	1978	6.9	7.9	道路橋	2014	Ⅰ	2024	Ⅱ	2029									●						
3281	100342303	無名橋 (2775.0)	北部建設事務所庄原支所	広島県	庄原市	県道原谷神石線	1990	2.1	10.3	道路橋	2014	Ⅰ	2024	Ⅰ	2029									●						
3282	100342304	無名橋 (4960.0)	北部建設事務所庄原支所	広島県	庄原市	県道原谷神石線	1990	2.9	14.3	道路橋	2014	Ⅰ	2024	Ⅰ	2029									●						
3283	100342305	無名橋 (5110.0)	北部建設事務所庄原支所	広島県	庄原市	県道原谷神石線	1980	4	10.3	道路橋	2014	Ⅱ	2024	Ⅰ	2029									●						
3284	100344301	無名橋 (1825.0)	北部建設事務所庄原支所	広島県	庄原市	県道実留春田線	1960	2.4	9.4	道路橋	2014	Ⅱ	2024	Ⅱ	2029									●						
3285	100344302	無名橋 (4025.0)	北部建設事務所庄原支所	広島県	庄原市	県道実留春田線	1960	2.3	9.3	道路橋	2014	Ⅰ	2024	Ⅱ	2029									●						
3286	100344303	無名橋 (5250.0)	北部建設事務所庄原支所	広島県	庄原市	県道実留春田線	1950	2.1	7.6	道路橋	2014	Ⅱ	2024	Ⅱ	2029									●						
3287	100344401	小車橋	北部建設事務所庄原支所	広島県	庄原市	県道油木小奴可線	1960	3.5	4	道路橋	2017	Ⅲ	2022	Ⅲ	2027	2026	2026					1	断面修復工							
3288	100344402	土堂橋	北部建設事務所庄原支所	広島県	庄原市	県道油木小奴可線	1960	5.5	4	道路橋	2014	Ⅱ	2024	Ⅱ	2029									●				□☆	○	
3289	100344403	長谷橋	北部建設事務所庄原支所	広島県	庄原市	県道油木小奴可線	1962	3.4	5	道路橋	2014	Ⅱ	2024	Ⅱ	2029									●						
3290	100344404	障子滝橋	北部建設事務所庄原支所	広島県	庄原市	県道油木小奴可線	1962	2.1	4.7	道路橋	2017	Ⅲ	2022	Ⅲ	2027									●				○		
3291	100344405	上長谷橋	北部建設事務所庄原支所	広島県	庄原市	県道油木小奴可線	1962	2.9	4.6	道路橋	2014	Ⅱ	2024	Ⅱ	2029									●						
3292	100344406	上坂根橋	北部建設事務所庄原支所	広島県	庄原市	県道油木小奴可線	1960	3.6	5	道路橋	2014	Ⅱ	2024	Ⅱ	2029									●						
3293	100344407	新庄橋	北部建設事務所庄原支所	広島県	庄原市	県道油木小奴可線	1961	3.2	3.6	道路橋	2014	Ⅰ	2024	Ⅱ	2029									●						
3294	100344409	細谷橋	北部建設事務所庄原支所	広島県	庄原市	県道油木小奴可線	1992	6.8	9.7	道路橋	2014	Ⅰ	2024	Ⅰ	2029									●						
3295	100344410	四通橋	北部建設事務所庄原支所	広島県	庄原市	県道油木小奴可線	1927	6.5	6.1	道路橋	2014	Ⅱ	2024	Ⅲ	2029									●						
3296	100344411	保賀谷橋	北部建設事務所庄原支所	広島県	庄原市	県道油木小奴可線	1953	3	4.5	道路橋	2014	Ⅰ	2024	Ⅱ	2029									●						
3297	100344412	小坪橋	北部建設事務所庄原支所	広島県	庄原市	県道油木小奴可線	1967	7.2	6	道路橋	2017	Ⅲ	2022	Ⅲ	2027	2026	2026					8	断面修復工			●	★		□☆	○
3298	100344413	高尾橋	北部建設事務所庄原支所	広島県	庄原市	県道油木小奴可線	1967	2.9	4.8	道路橋	2014	Ⅱ	2024	Ⅱ	2029									●						
3299	100344414	小鳥原橋	北部建設事務所庄原支所	広島県	庄原市	県道油木小奴可線	1950	3.6	4.4	道路橋	2014	Ⅱ	2024	Ⅲ	2029									●						
3300	100344415	鉄道橋	北部建設事務所庄原支所	広島県	庄原市	県道油木小奴可線	1935	6.4	5.4	道路橋	2015	Ⅱ	2024	Ⅱ	2029									●						
3301	100344501	塩田 2 号	北部建設事務所庄原支所	広島県	庄原市	県道中迫川北線	2001	4.8	11.5	道路橋	2014	Ⅰ	2024	Ⅰ	2029									●						
3302	100344502	塩田 3 号	北部建設事務所庄原支所	広島県	庄原市	県道中迫川北線	1978	5.3	8.1	道路橋	2014	Ⅰ	2024	Ⅱ	2029									●						
3303	100344503	塩田 4 号	北部建設事務所庄原支所	広島県	庄原市	県道中迫川北線	1978	3.1	8.5	道路橋	2014	Ⅰ	2024	Ⅱ	2029									●						
3304	100344504	塩田 5 号	北部建設事務所庄原支所	広島県	庄原市	県道中迫川北線	1978	5.8	19.4	道路橋	2014	Ⅰ	2024	Ⅱ	2029									●						
3305	100344505	石がた大橋	北部建設事務所庄原支所	広島県	庄原市	県道中迫川北線	1978	3.1	9.9	道路橋	2014	Ⅱ	2024	Ⅱ	2029									●						
3306	100344506	無名橋 (3910.0)	北部建設事務所庄原支所	広島県	庄原市	県道中迫川北線	1950	4.1	9.6	道路橋	2014	Ⅱ	2024	Ⅱ	2029									●						
3307	100344513	伊予谷 2 号橋	北部建設事務所庄原支所	広島県																										

No.	橋梁番号	施設名	事務所名	所在地		路線名	架設年度	橋長 (m)	幅員 (m)	橋梁種別	1巡目点検		最新の点検結果		次回点検	令和7年度から令和10年度までの修繕計画				点検・修繕計画										備考		
											点検年度	健全度	点検年度	健全度						点検年度	○：定期点検(予定), □:修繕着手(予定), ☆：修繕完了(予定) ●：定期点検済, ■:修繕着手済, ★：修繕完了済計画											
				修繕着手年度	修繕完了年度										概算工事費 (100万円)	主な修繕内容	2020	2021	2022		2023	2024	2025	2026	2027	2028						
3349	100346707	矢の谷橋	北部建設事務所庄原支所	広島県	庄原市	県道庄原新市線	1956	3.1	7	道路橋	2014	I	2024	I	2029								●									
3350	100346708	瀧の谷橋	北部建設事務所庄原支所	広島県	庄原市	県道庄原新市線	1958	2.5	4.9	道路橋	2017	III	2022	II	2027					★		●						○				
3351	13001	新大橋	北部建設事務所庄原支所	広島県	庄原市	国道182号	1978	77	21.1	道路橋	2015	II	2020	III	2025					●				■	★	○				○		
3352	13002	五反田橋	北部建設事務所庄原支所	広島県	庄原市	国道314号	1963	42	9.7	道路橋	2016	II	2021	II	2026						●						○					
3353	13004	秋葉大橋	北部建設事務所庄原支所	広島県	庄原市	国道314号	1966	18.8	6.5	道路橋	2016	I	2021	I	2026						●						○					
3354	13006	鈎橋	北部建設事務所庄原支所	広島県	庄原市	国道183号	1961	60	7	道路橋	2015	II	2020	II	2025					●						○						
3355	13007	亀井尻橋	北部建設事務所庄原支所	広島県	庄原市	国道183号	1978	15	15	道路橋	2015	II	2020	II	2025					●						○						
3356	13008	原手橋（上り橋）	北部建設事務所庄原支所	広島県	庄原市	国道183号	1978	28.9	11.5	道路橋	2015	II	2020	I	2025					●						○						
3357	13010	貝石谷橋	北部建設事務所庄原支所	広島県	庄原市	国道183号	1987	80	12	道路橋	2016	III	2021	II	2026					■	●	★					○					
3358	130118301	宮内ランプ橋	北部建設事務所庄原支所	広島県	庄原市	国道183号(江府三次道路)	2003	166	8.5	道路橋	2016	I	2021	II	2026						●						○					
3359	130118303	高大橋	北部建設事務所庄原支所	広島県	庄原市	国道183号(江府三次道路)	2004	242.3	10.5	道路橋	2014	II	2024	I	2029									●				○				
3360	130118304	大横1号橋	北部建設事務所庄原支所	広島県	庄原市	国道183号(江府三次道路)	2004	75	11.5	道路橋	2016	I	2021	I	2026						●						○					
3361	130118305	大横2号橋	北部建設事務所庄原支所	広島県	庄原市	国道183号(江府三次道路)	2005	87	9.5	道路橋	2016	I	2021	I	2026						●						○					
3362	130118306	無名橋（15069.2）	北部建設事務所庄原支所	広島県	庄原市	国道183号	2002	4.3	9.1	道路橋	2016	I	2021	II	2026						●						○					
3363	130118307	無名橋（15508.4）	北部建設事務所庄原支所	広島県	庄原市	国道183号	2002	7.5	33	道路橋	2016	I	2021	II	2026						●						○					
3364	130118308	川西橋	北部建設事務所庄原支所	広島県	庄原市	国道183号(江府三次道路)	2001	140	9.7	道路橋	2016	I	2021	II	2026						●						○					
3365	13012	大正大橋	北部建設事務所庄原支所	広島県	庄原市	国道183号	1968	75	8	道路橋	2015	II	2020	II	2025					●						○						
3366	130131401	東城第二大橋	北部建設事務所庄原支所	広島県	庄原市	国道314号	1993	139	10.6	道路橋	2015	II	2024	II	2029	2024	2025	70	ひび割れ注入工, 耐震補強工						●■	☆						
3367	130131402	東城第一大橋	北部建設事務所庄原支所	広島県	庄原市	国道314号	1993	255	10.5	道路橋	2016	II	2021	II	2026						●			■	★		○					
3368	130131403	無名橋（15200.0）	北部建設事務所庄原支所	広島県	庄原市	国道314号	1991	5	15.3	道路橋	2016	I	2021	I	2026						●						○					
3369	130131405	無名橋（22080.0）	北部建設事務所庄原支所	広島県	庄原市	国道314号	2000	2.3	12.8	道路橋	2016	I	2021	I	2026						●						○					
3370	130131407	無名橋（25635.0）	北部建設事務所庄原支所	広島県	庄原市	国道314号	2000	3.3	43	道路橋	2016	I	2021	I	2026						●						○					
3371	130131408	奥八島跨線橋	北部建設事務所庄原支所	広島県	庄原市	国道314号	1994	167	10.8	道路橋	2014	I	2024	I	2029										●							
3372	130131409	無名橋（30975.0）	北部建設事務所庄原支所	広島県	庄原市	国道314号	1980	2.1	10.5	道路橋	2016	II	2021	II	2026						●						○					
3373	130131410	無名橋（31560.0）	北部建設事務所庄原支所	広島県	庄原市	国道314号	1980	3.6	15.2	道路橋	2016	I	2021	I	2026						●						○					
3374	130131411	美古登橋	北部建設事務所庄原支所	広島県	庄原市	国道314号	1978	98.5	10.5	道路橋	2014	II	2024	II	2029										●			○				
3375	130131412	無名橋（35290.0）	北部建設事務所庄原支所	広島県	庄原市	国道314号	1980	2.9	13.5	道路橋	2016	II	2021	II	2026						●						○					
3376	130131413	無名橋（37525.0）	北部建設事務所庄原支所	広島県	庄原市	国道314号	1980	6	13.2	道路橋	2016	II	2021	II	2026						●						○					
3377	130131414	無名橋（39770.0）	北部建設事務所庄原支所	広島県	庄原市	国道314号	1980	2.5	11.5	道路橋	2016	I	2021	I	2026						●						○					
3378	130131415	無名橋（40360.0）	北部建設事務所庄原支所	広島県	庄原市	国道314号	1980	3.8	12	道路橋	2016	I	2021	I	2026						●						○					
3379	130131416	無名橋（41575.0）	北部建設事務所庄原支所	広島県	庄原市	国道314号	1980	2.5	18.5	道路橋	2016	II	2021	II	2026						●						○					
3380	130131417	無名橋（42025.0）	北部建設事務所庄原支所	広島県	庄原市	国道314号	1980	3.1	11.8	道路橋	2016	III	2021	I	2026						●						○					
3381	13014	大富大橋	北部建設事務所庄原支所	広島県	庄原市	国道183号	1968	70	8	道路橋	2015	III	2020	II	2025					●				★		○						
3382	130143201	無名橋（73540.0）	北部建設事務所庄原支所	広島県	庄原市	国道432号	1970	5.3	15	道路橋	2015	I	2020	I	2025					●												

[illegible]

No.	橋梁番号	施設名	事務所名	所在地		路線名	架設年度	橋長 (m)	幅員 (m)	橋梁種別	1巡目点検		最新の点検結果		次回点検	令和7年度から令和10年度までの修繕計画				点検・修繕計画								備考		
											点検年度	健全度	点検年度	健全度						点検年度	〇：定期点検(予定), □:修繕着手(予定), ☆：修繕完了(予定) ●：定期点検済, ■:修繕着手済, ★：修繕完了済									
				実績											計画															
				県名	市町名																2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
3503	13054	田の平橋	北部建設事務所庄原支所	広島県	庄原市	国道432号	1977	85.8	8.2	道路橋	2015	Ⅱ	2020	Ⅲ	2025	2023	2025	16	部分塗装工, ひび割れ注入工, 支承補修工	●			■		○☆					
3504	13055	河上橋	北部建設事務所庄原支所	広島県	庄原市	国道432号	1979	80	8.7	道路橋	2015	Ⅱ	2020	Ⅰ	2025					●				○						
3505	13056	富士淵橋	北部建設事務所庄原支所	広島県	庄原市	国道432号	1991	40	9.2	道路橋	2015	Ⅱ	2020	Ⅱ	2025					●				○						
3506	13057	下山橋	北部建設事務所庄原支所	広島県	庄原市	国道432号	1992	52	9.2	道路橋	2015	Ⅱ	2020	Ⅱ	2025					●				○						
3507	13058	稲田橋	北部建設事務所庄原支所	広島県	庄原市	国道432号	1983	13	11.4	道路橋	2015	Ⅱ	2020	Ⅱ	2025					●				○						
3508	13059	三叉橋	北部建設事務所庄原支所	広島県	庄原市	国道432号	1974	17	8	道路橋	2015	Ⅱ	2020	Ⅱ	2025					●				○						
3509	13060	比和中央大橋	北部建設事務所庄原支所	広島県	庄原市	国道432号	1991	31.5	11	道路橋	2015	Ⅱ	2020	Ⅱ	2025					●				○						
3510	13061	学園前大橋	北部建設事務所庄原支所	広島県	庄原市	国道432号	1990	41.3	11	道路橋	2015	Ⅱ	2020	Ⅱ	2025					●					○					
3511	13062	新永原大橋	北部建設事務所庄原支所	広島県	庄原市	国道432号	1983	33.7	10.3	道路橋	2015	Ⅱ	2020	Ⅱ	2025					●				○						
3512	13064	新中橋	北部建設事務所庄原支所	広島県	庄原市	国道432号	1995	23.8	13.4	道路橋	2015	Ⅱ	2020	Ⅱ	2025					●				○						
3513	13065	笹谷橋	北部建設事務所庄原支所	広島県	庄原市	国道432号	1980	16.6	10.2	道路橋	2015	Ⅰ	2020	Ⅰ	2025					●				○						
3514	13066	尻無橋	北部建設事務所庄原支所	広島県	庄原市	国道432号	1986	13.2	9.4	道路橋	2015	Ⅱ	2020	Ⅱ	2025					●				○						
3515	13067	笠取橋	北部建設事務所庄原支所	広島県	庄原市	国道432号	1962	38.9	11.6	道路橋	2015	Ⅱ	2020	Ⅱ	2025					●				○						
3516	13068	堀越橋	北部建設事務所庄原支所	広島県	庄原市	国道432号	1962	27.9	6.8	道路橋	2015	Ⅱ	2020	Ⅱ	2025					●				○						
3517	13069	上市橋	北部建設事務所庄原支所	広島県	庄原市	国道432号	1967	17.9	6.3	道路橋	2015	Ⅲ	2020	Ⅰ	2025					●				○						
3518	13070	深渡橋	北部建設事務所庄原支所	広島県	庄原市	国道432号	1965	20.5	6.8	道路橋	2015	Ⅱ	2020	Ⅱ	2025					●				○						
3519	13071	王貫橋	北部建設事務所庄原支所	広島県	庄原市	国道432号	1988	34	9.4	道路橋	2015	Ⅱ	2020	Ⅱ	2025					●				○						
3520	13072	北中原橋	北部建設事務所庄原支所	広島県	庄原市	県道庄原作木線	1967	38.2	10	道路橋	2015	Ⅱ	2020	Ⅱ	2025					●				○						
3521	13073	藤根橋	北部建設事務所庄原支所	広島県	庄原市	県道庄原作木線	1979	15	9.9	道路橋	2015	Ⅱ	2020	Ⅲ	2025	2023	2025	45	支承補修工	●			■		○☆					
3522	13074	新古城橋	北部建設事務所庄原支所	広島県	庄原市	県道庄原作木線	2001	18.1	10	道路橋	2015	Ⅱ	2020	Ⅱ	2025					●				○						
3523	13075	多加意橋	北部建設事務所庄原支所	広島県	庄原市	県道庄原作木線	1993	38	10	道路橋	2015	Ⅱ	2020	Ⅱ	2025					●				○						
3524	13076	大合戦橋	北部建設事務所庄原支所	広島県	庄原市	県道庄原作木線	1979	38	10	道路橋	2015	Ⅱ	2020	Ⅱ	2025					●				○						
3525	13077	新大藩橋	北部建設事務所庄原支所	広島県	庄原市	県道三次高野線	1987	51.8	7.5	道路橋	2015	Ⅱ	2020	Ⅱ	2025					●				○						
3526	13078	横原橋	北部建設事務所庄原支所	広島県	庄原市	県道三次高野線	1990	29.6	7	道路橋	2015	Ⅱ	2020	Ⅱ	2025					●				○						
3527	13079	荒神橋	北部建設事務所庄原支所	広島県	庄原市	県道三次高野線	1987	39	7	道路橋	2015	Ⅱ	2020	Ⅱ	2025					●				○						
3528	13080	芦原橋	北部建設事務所庄原支所	広島県	庄原市	県道三次高野線	1985	10.8	7.2	道路橋	2015	Ⅱ	2020	Ⅱ	2025					●				○						
3529	13081	上芦原橋	北部建設事務所庄原支所	広島県	庄原市	県道三次高野線	1987	27.6	7.5	道路橋	2015	Ⅱ	2020	Ⅱ	2025					●				○						
3530	13082	女節橋	北部建設事務所庄原支所	広島県	庄原市	県道三次高野線	1988	26.9	7.5	道路橋	2015	Ⅱ	2020	Ⅱ	2025					●				○						
3531	13083	松谷橋	北部建設事務所庄原支所	広島県	庄原市	県道三次高野線	1983	24	8.2	道路橋	2015	Ⅰ	2020	Ⅰ	2025					●				○						
3532	13084	白川橋	北部建設事務所庄原支所	広島県	庄原市	県道三次高野線	1977	15.7	7.4	道路橋	2015	Ⅱ	2020	Ⅱ	2025					●				○						
3533	13085	中門田橋	北部建設事務所庄原支所	広島県	庄原市	県道三次高野線	1970	15.6	7.5	道路橋	2015	Ⅱ	2020	Ⅱ	2025					●				○						
3534	13087	高野大橋	北部建設事務所庄原支所	広島県	庄原市	県道三次高野線	1970	52	7.5	道路橋	2015	Ⅱ	2020	Ⅱ	2025					●				○						
3535	13100	歳の神橋	北部建設事務所庄原支所	広島県	庄原市	県道足立東城線	1983	25	7.8	道路橋	2017	Ⅱ	2022	Ⅱ	2027						●						○			
3536	13101	長者山橋	北部建設事務所庄原支所	広島県	庄原市	県道足立東城線	1963	15	5.3	道路橋	2016	Ⅱ	2021	Ⅱ	2026						●						○			
3537	13102	千鳥川橋	北部建設事務所庄原支所	広島県	庄原市	県道足立東城線	不明	10.5	5.5	道路橋	2017	Ⅱ	2022	Ⅰ	2027							●						○		
3538	13103	小室橋	北部建設事務所庄原支所	広島県	庄原市	県道足立東城線	2001	11.6	11.4	道路橋	2017	Ⅱ	2022	Ⅰ	2027						●									

No.	橋梁番号	施設名	事務所名	所在地		路線名	架設年度	橋長 (m)	幅員 (m)	橋梁種別	1巡目点検		最新の点検結果		次回点検	令和7年度から令和10年度までの修繕計画				点検・修繕計画								備考
											点検年度	健全度	点検年度	健全度						点検年度	○：定期点検(予定), □:修繕着手(予定), ☆：修繕完了(予定) ●：定期点検済, ■:修繕着手済, ★：修繕完了済計画							
				修繕着手年度	修繕完了年度										概算工事費 (100万円)	主な修繕内容	2020	2021	2022		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
3580	13161	田鋤橋（1径間目）	北部建設事務所庄原支所	広島県	庄原市	県道比婆山公園線	1976	8.5	9.8	道路橋	2018	Ⅱ	2023	Ⅱ	2028												○	
3581	13163	魚切橋	北部建設事務所庄原支所	広島県	庄原市	県道比婆山公園線	1965	24.6	9.7	道路橋	2018	Ⅱ	2023	Ⅱ	2028												○	
3582	13164	団尻橋	北部建設事務所庄原支所	広島県	庄原市	県道比婆山公園線	1975	16.6	9.3	道路橋	2018	Ⅱ	2023	Ⅱ	2028												○	
3583	13165	木次屋橋	北部建設事務所庄原支所	広島県	庄原市	県道比婆山公園森脇線	1963	12.6	4.5	道路橋	2016	Ⅱ	2021	Ⅱ	2026													
3584	13166	萩峠橋	北部建設事務所庄原支所	広島県	庄原市	県道比婆山公園森脇線	1995	19.5	10.3	道路橋	2018	Ⅰ	2023	Ⅰ	2028												○	
3585	13167	越原橋	北部建設事務所庄原支所	広島県	庄原市	県道比婆山公園森脇線	1989	19.6	10.3	道路橋	2018	Ⅰ	2023	Ⅰ	2028												○	
3586	13168	佐渡橋	北部建設事務所庄原支所	広島県	庄原市	県道比婆山公園森脇線	1989	18.6	10.6	道路橋	2018	Ⅰ	2023	Ⅰ	2028												○	
3587	13169	水谷新橋	北部建設事務所庄原支所	広島県	庄原市	県道比婆山公園森脇線	1990	33.4	10.3	道路橋	2018	Ⅰ	2023	Ⅰ	2028												○	
3588	13170	井尻谷橋	北部建設事務所庄原支所	広島県	庄原市	県道比婆山公園森脇線	1995	10.5	11.2	道路橋	2018	Ⅰ	2023	Ⅰ	2028												○	
3589	13171	久泉原橋	北部建設事務所庄原支所	広島県	庄原市	県道比婆山公園森脇線	1989	19.3	10.8	道路橋	2018	Ⅰ	2023	Ⅰ	2028												○	
3590	13172	六の原橋	北部建設事務所庄原支所	広島県	庄原市	県道比婆山県民の森線	1994	16	12.5	道路橋	2018	Ⅰ	2023	Ⅰ	2028												○	
3591	13173	五の原橋	北部建設事務所庄原支所	広島県	庄原市	県道比婆山県民の森線	1994	37	10.3	道路橋	2018	Ⅱ	2023	Ⅱ	2028												○	
3592	13174	市坊橋	北部建設事務所庄原支所	広島県	庄原市	県道比婆山県民の森線	1995	21.6	11.3	道路橋	2018	Ⅰ	2023	Ⅰ	2028												○	
3593	13175	人詰橋	北部建設事務所庄原支所	広島県	庄原市	県道比婆山県民の森線	1994	20	10.8	道路橋	2018	Ⅱ	2023	Ⅰ	2028												○	
3594	13176	平橋	北部建設事務所庄原支所	広島県	庄原市	県道比婆山県民の森線	1972	14	5.6	道路橋	2018	Ⅰ	2023	Ⅱ	2028												○	
3595	13177	落合橋	北部建設事務所庄原支所	広島県	庄原市	県道高光総領線	2002	26.5	9.3	道路橋	2017	Ⅰ	2022	Ⅰ	2027													
3596	13178	新宮本橋	北部建設事務所庄原支所	広島県	庄原市	県道中領家庄原線	1991	20.2	8.2	道路橋	2017	Ⅰ	2022	Ⅰ	2027													
3597	13179	宮ノ前橋	北部建設事務所庄原支所	広島県	庄原市	県道中領家庄原線	1994	23.4	8.7	道路橋	2017	Ⅰ	2022	Ⅰ	2027													
3598	13180	宮ノ上橋	北部建設事務所庄原支所	広島県	庄原市	県道中領家庄原線	1995	27.9	9.8	道路橋	2017	Ⅰ	2022	Ⅱ	2027													
3599	13181	五箇橋	北部建設事務所庄原支所	広島県	庄原市	県道中領家庄原線	不明	14	5.8	道路橋	2017	Ⅱ	2022	Ⅱ	2027													
3600	13182	福屋橋	北部建設事務所庄原支所	広島県	庄原市	県道中領家庄原線	1983	11	8.2	道路橋	2017	Ⅰ	2022	Ⅰ	2027													
3601	13183	前谷橋	北部建設事務所庄原支所	広島県	庄原市	県道中領家庄原線	1979	12.7	8	道路橋	2017	Ⅰ	2022	Ⅱ	2027													
3602	13184	大笹橋	北部建設事務所庄原支所	広島県	庄原市	県道原谷神石線	1991	19.8	8.2	道路橋	2017	Ⅰ	2022	Ⅰ	2027													
3603	13185	八月田 1 号橋	北部建設事務所庄原支所	広島県	庄原市	県道原谷神石線	1999	17.2	11.5	道路橋	2017	Ⅰ	2022	Ⅰ	2027													
3604	13186	八月田 2 号橋	北部建設事務所庄原支所	広島県	庄原市	県道原谷神石線	2000	17.5	11.5	道路橋	2017	Ⅰ	2022	Ⅰ	2027													
3605	13187	八月田 3 号橋	北部建設事務所庄原支所	広島県	庄原市	県道原谷神石線	2002	18.9	11	道路橋	2017	Ⅰ	2022	Ⅰ	2027													
3606	13188	宮城橋	北部建設事務所庄原支所	広島県	庄原市	県道原谷神石線	1999	27.7	11.5	道路橋	2017	Ⅰ	2022	Ⅰ	2027													
3607	13189	黒田橋	北部建設事務所庄原支所	広島県	庄原市	県道原谷神石線	2002	17.2	11.5	道路橋	2017	Ⅰ	2022	Ⅰ	2027													
3608	13190	吉原橋	北部建設事務所庄原支所	広島県	庄原市	県道原谷神石線	2003	33	11	道路橋	2017	Ⅰ	2022	Ⅰ	2027													
3609	13191	新平和橋	北部建設事務所庄原支所	広島県	庄原市	県道原谷神石線	1993	18.5	9.8	道路橋	2018	Ⅱ	2023	Ⅱ	2028												○	
3610	13192	宮郷橋（1径間目）	北部建設事務所庄原支所	広島県	庄原市	県道原谷神石線	1995	31	10.3	道路橋	2017	Ⅰ	2023	Ⅰ	2028													○
3611	13194	坂根橋	北部建設事務所庄原支所	広島県	庄原市	県道油木小奴可線	1968	10.7	4.9	道路橋	2017	Ⅱ	2022	Ⅱ	2027													
3612	13195	塩田橋	北部建設事務所庄原支所	広島県	庄原市	県道中迫川北線	1994	14.6	14	道路橋	2017	Ⅰ	2022	Ⅰ	2027													
3613	13196	伊予谷 1 号橋	北部建設事務所庄原支所	広島県	庄原市	県道中迫川北線	1998	10.4	9.7	道路橋	2017	Ⅰ	2022	Ⅰ	2027													
3614	13197	丈伝橋	北部建設事務所庄原支所	広島県	庄原市	県道中迫川北線	2000	14.3	11.5	道路橋	2017	Ⅰ	2022	Ⅰ	2027													
3615	13198	大石橋	北部建設事務所庄原支所	広島県	庄原市	県道中迫川北線	2001	22.4	11	道路橋	2017	Ⅰ	2022	Ⅰ	2027													
3616	13199	明神橋	北部建設事務所庄原支所	広島県	庄原市	県道中迫川北線	2003	17	11	道路橋	2017	Ⅰ	2022	Ⅰ	2027													
3617	13200	新合の峠橋	北部建設事務所庄原支所	広島県	庄原市	県道中迫川北線	2005	13.4	11.2	道路橋	2017	Ⅰ																

No.	橋梁番号	施設名	事務所名	所在地		路線名	架設年度	橋長(m)	幅員(m)	橋梁種別	1巡目点検		最新の点検結果		次回点検	令和7年度から令和10年度までの修繕計画				点検・修繕計画								備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
											点検年度	健全度	点検年度	健全度						点検年度	○：定期点検(予定), □:修繕着手(予定), ☆：修繕完了(予定) ●：定期点検済, ■:修繕着手済, ★：修繕完了済計画																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
				2020	2021										2022	2023	2024	2025	2026		2027	2028																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
																			修繕着手年度	修繕完了年度	概算工事費(100万円)	主な修繕内容																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
3657	13324	富田谷橋	北部建設事務所庄原支所	広島県	庄原市	国道183号	1963	2.5	7	道路橋	2016	Ⅱ	2021	Ⅱ	2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

No.	橋梁番号	施設名	事務所名	所在地		路線名	架設年 度	橋長 (m)	幅員 (m)	橋梁種別	1巡目点検		最新の点検 結果		次回点 検	令和7年度から令和10年度までの修繕計画				点検・修繕計画 ○：定期点検(予定), □:修繕着手(予定), ☆：修繕完了(予定) ●：定期点検済, ■:修繕着手済, ★：修繕完了済										備考
				県名	市町名						点検 年度	健全 度	点検 年度	健全 度	点検 年度	修繕 着手 年度	修繕 完了 年度	概算 工事費 (100万円)	主な修繕内容	実績					計画					
																				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
3734	130143234	無名橋(75316.0)	北部建設事務所庄原支所	広島県	庄原市	国道4 3 2号	1989	5.5	11	道路橋	2015	Ⅱ	2020	Ⅱ	2025					●					○					
3735	130143235	無名橋(112859.0)	北部建設事務所庄原支所	広島県	庄原市	国道4 3 2号	1991	2.8	18.6	道路橋	2015	Ⅱ	2020	Ⅱ	2025					●					○					
3736	130143236	無名橋(113172.0)	北部建設事務所庄原支所	広島県	庄原市	国道4 3 2号	1991	3.7	14.6	道路橋	2015	Ⅱ	2020	Ⅱ	2025					●					○					
3737	130143237	無名橋(120422.0)	北部建設事務所庄原支所	広島県	庄原市	国道4 3 2号	1983	6	16	道路橋	2015	Ⅱ	2020	Ⅱ	2025					●					○					
3738	130118309	ふれあい陸橋	北部建設事務所庄原支所	広島県	庄原市	国道1 8 3号	1998	72.5	2.9	横断歩道橋	2018	Ⅲ	2020	Ⅰ	2025					●					○					

別紙 構造物ごとの一覧表（トンネル）

No.	トンネル名	事務所名	路線名	所在地		建設年次	延長(m)	幅員(m)	等級	種別	2巡回診断区分		最新の点検結果	次回点検	令和7年度から令和10年度までの修繕計画				点検・修繕計画										備考		
											点検年度	健全度							〇：定期点検(予定), □:修繕着手(予定), ☆：修繕完了(予定) ●：定期点検済, ■:修繕着手済, ★：修繕完了済												
				実績									計画																		
				県名	市町名						点検年度	健全度	点検年度	健全度	点検年度	修繕着手年度	修繕完了年度	概算工事費(100万円)	主な修繕内容	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028			
1	茂陰トンネル	西部建設事務所	県道上宮町新地線	広島県	府中町	1998	267.3	10.1	D	トンネル	2021	Ⅲ	2021	Ⅲ	2026	2026	2026	2	剥落防止工		●						○□☆				
2	切串隧道	西部建設事務所	国道487号	広島県	江田島市	1960	259.6	5.5	D	トンネル	2020	Ⅲ	2020	Ⅲ	2025	2024	2025	5	線導水工	●				■	○☆						
3	二つ小島隧道	西部建設事務所	国道487号	広島県	江田島市	1960	128.4	5.5	D	トンネル	2020	Ⅱ	2020	Ⅱ	2025					●					○						
4	栗平隧道	西部建設事務所	国道487号	広島県	江田島市	1960	49	5.9	D	トンネル	2020	Ⅲ	2020	Ⅲ	2025	2024	2025	1	剥落防止工	●				■	○☆						
5	水浦隧道	西部建設事務所	国道487号	広島県	江田島市	1960	74.5	5.8	D	トンネル	2021	Ⅱ	2021	Ⅱ	2026						●						○				
6	一つ小島隧道	西部建設事務所	国道487号	広島県	江田島市	1960	106.5	5.5	D	トンネル	2021	Ⅲ	2021	Ⅲ	2026	2024	2025	4	線導水工		●				■	☆	○				
7	高須隧道	西部建設事務所	国道487号	広島県	江田島市	1960	64	5.6	D	トンネル	2020	Ⅲ	2020	Ⅲ	2025	2024	2025	26	裏込注入工	●				■	○☆						
8	中郷隧道	西部建設事務所	国道487号	広島県	江田島市	1944	64.1	6.9	D	トンネル	2021	Ⅲ	2021	Ⅲ	2026	2024	2025	4	剥落防止工		●			■	☆	○					
9	御殿山隧道	西部建設事務所	国道487号	広島県	江田島市	1944	283	6.8	D	トンネル	2022	Ⅱ	2022	Ⅱ	2027								●				○				
10	秋月トンネル	西部建設事務所	県道鷺部小用線	広島県	江田島市	1981	1005	8.5	B	トンネル	2020	Ⅲ	2020	Ⅲ	2025	2024	2025	13	線導水工	●				■	○☆						
11	栗屋トンネル	北部建設事務所	県道吉田邑南線	広島県	安芸高田市	1987	1041	7.8	B	トンネル	2022	Ⅱ	2022	Ⅱ	2027								●				○				
12	大伏トンネル	北部建設事務所	県道吉田邑南線	広島県	安芸高田市	1987	80	6.9	D	トンネル	2022	Ⅱ	2022	Ⅱ	2027								●				○				
13	塩瀬トンネル	北部建設事務所	県道金屋壬生線	広島県	安芸高田市	2001	298	9.5	D	トンネル	2022	Ⅱ	2022	Ⅱ	2027								●				○				
14	熊野トンネル	西部建設事務所	県道矢野安浦線	広島県	熊野町	1990	1238.5	6.5	A	トンネル	2019	Ⅱ	2024	Ⅱ	2029									●							
15	熊野黒瀬トンネル	西部建設事務所	県道矢野安浦線	広島県	熊野町	2014	1167	10.8	B	トンネル	2019	Ⅱ	2024	Ⅱ	2029									●							
16	上二河トンネル	西部建設事務所呉支所	県道呉平谷線	広島県	呉市	1999	550	6.0	C	トンネル	2020	Ⅱ	2020	Ⅱ	2025						●					○					
17	二河峡隧道	西部建設事務所呉支所	県道呉平谷線	広島県	呉市	1960	22.4	6.3	D	トンネル	2020	Ⅱ	2020	Ⅱ	2025						●					○					
18	焼山隧道	西部建設事務所呉支所	県道呉平谷線	広島県	呉市	1960	38.6	6.7	D	トンネル	2019	Ⅱ	2020	Ⅱ	2025						●					○					
19	宇和木トンネル	西部建設事務所呉支所	県道音戸倉橋線	広島県	呉市	1995	820	8.9	C	トンネル	2021	Ⅲ	2021	Ⅲ	2026							●■			■★		○				
20	桂浜隧道	西部建設事務所呉支所	県道音戸倉橋線	広島県	呉市	1959	128	5.5	D	トンネル	2021	Ⅲ	2021	Ⅲ	2026								●				○				
21	渡子トンネル	西部建設事務所呉支所	県道音戸倉橋線	広島県	呉市	1977	90.5	7.5	D	トンネル	2021	Ⅱ	2021	Ⅱ	2026								●				○				
22	日附トンネル	西部建設事務所呉支所	県道音戸倉橋線	広島県	呉市	1937	35	10.1	D	トンネル	2021	Ⅲ	2021	Ⅲ	2026								●				○				
23	地藏峠隧道	西部建設事務所呉支所	県道下蒲刈川尻線	広島県	呉市	1966	125	6.1	D	トンネル	2021	Ⅲ	2021	Ⅲ	2026								●■			■★		○			
24	牛ヶ首トンネル	西部建設事務所呉支所	県道下蒲刈川尻線	広島県	呉市	1991	126.5	6.5	C	トンネル	2019	Ⅱ	2022	Ⅱ	2027									●				○			
25	田戸トンネル	西部建設事務所呉支所	県道上蒲刈島循環線	広島県	呉市	2002	223	7.0	D	トンネル	2022	Ⅱ	2022	Ⅱ	2027									●				○			
26	原トンネル	西部建設事務所呉支所	県道上蒲刈島循環線	広島県	呉市	2000	303	7.0	D	トンネル	2022	Ⅱ	2022	Ⅱ	2027									●				○			
27	野坂トンネル	西部建設事務所呉支所	県道大崎下島循環線	広島県	呉市	1975	68.6	6.0	D	トンネル	2022	Ⅱ	2022	Ⅱ	2027									●				○			
28	二級峡トンネル	西部建設事務所呉支所	国道375号	広島県	呉市	1994	533	9.5	C	トンネル	2020	Ⅱ	2020	Ⅱ	2025						●					○					
29	芳洲隧道	西部建設事務所呉支所	国道375号	広島県	呉市	1942	33	7.6	D	トンネル	2020	Ⅱ	2020	Ⅱ	2025						●					○					
30	日の浦トンネル	西部建設事務所呉支所	県道川尻安浦線	広島県	呉市	1988	355.5	7.6	D	トンネル	2022	Ⅱ	2022	Ⅱ	2027													○			
31	大浦トンネル	西部建設事務所呉支所	県道豊浜蒲刈線	広島県	呉市	2007	784	10.3	C	トンネル	2019	Ⅲ	2024	Ⅱ	2029							■★									
32	警固屋トンネル	西部建設事務所呉支所	国道487号	広島県	呉市	2006	271	6.0	C	トンネル	2019	Ⅱ	2024	I	2029										●						
33	音戸トンネル	西部建設事務所呉支所	国道487号	広島県	呉市	2008	489	6.0	C	トンネル	2019	Ⅲ	2024	Ⅱ	2029								■★			●					
34	黄幡トンネル	西部建設事務所呉支所	国道487号	広島県	呉市	2010	104	6.0	D	トンネル	2019	Ⅱ	2024	I	2029										●						
35	若宮トンネル	西部建設事務所呉支所	国道487号	広島県	呉市	2001	361	8.5	C	トンネル	2019	Ⅲ	2024	I	2029									■★	●						
36	新焼山トンネル	西部建設事務所呉支所	国道487号	広島県	呉市	2006	476	6.0	C	トンネル	2019	Ⅱ	2024	Ⅱ	2029										●						

No.	トンネル名	事務所名	路線名	所在地		建設年次	延長(m)	幅員(m)	等級	種別	2巡回診断区分		最新の点検結果		次回点検	令和7年度から令和10年度までの修繕計画				点検・修繕計画 ○：定期点検(予定), □:修繕着手(予定), ☆：修繕完了(予定) ●：定期点検済, ■:修繕着手済, ★：修繕完了済										備考	
				県名	市町名						点検年度	健全度	点検年度	健全度		点検年度	修繕着手年度	修繕完了年度	概算工事費(100万円)	主な修繕内容	実績					計画					
																					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
72	宮山トンネル	西部建設事務所安芸太田支所	国道191号	広島県	安芸太田町	1980	92	9.3	D	トンネル	2020	Ⅲ	2020	Ⅲ	2025					●			■	★	○						
73	観音トンネル	西部建設事務所安芸太田支所	国道191号	広島県	安芸太田町	1981	37	9.4	D	トンネル	2020	Ⅱ	2020	Ⅱ	2025					●					○						
74	安野トンネル	西部建設事務所安芸太田支所	国道191号	広島県	安芸太田町	1976	461	7.5	D	トンネル	2020	Ⅲ	2020	Ⅲ	2025	2026	2026	2	剥落防止工	●			■	★	○		□☆				
75	中三坂トンネル	西部建設事務所安芸太田支所	国道261号	広島県	北広島町	1993	355	9.0	D	トンネル	2021	Ⅲ	2021	Ⅲ	2026	2026	2026	0.5	剥落防止工		●		■★				○□☆				
76	百々山トンネル	西部建設事務所安芸太田支所	国道433号	広島県	安芸太田町	1964	70	8.4	D	トンネル	2021	Ⅱ	2021	Ⅱ	2026						●					○					
77	柴木トンネル	西部建設事務所安芸太田支所	県道三段峡線	広島県	安芸太田町	1965	92	4.2	D	トンネル	2023	Ⅱ	2023	Ⅱ	2028								●					○			
78	上トンネル	西部建設事務所安芸太田支所	県道吉和戸河内線	広島県	安芸太田町	1938	22.4	4.9	D	トンネル	2022	Ⅱ	2022	Ⅱ	2027							●						○			
79	中トンネル	西部建設事務所安芸太田支所	県道吉和戸河内線	広島県	安芸太田町	1938	30.1	4.8	D	トンネル	2023	Ⅱ	2023	Ⅱ	2028								●						○		
80	下トンネル	西部建設事務所安芸太田支所	県道吉和戸河内線	広島県	安芸太田町	1938	21.7	4.8	D	トンネル	2023	Ⅱ	2023	Ⅱ	2028								●						○		
81	井仁トンネル	西部建設事務所安芸太田支所	県道上関賀簡賀停車場線	広島県	安芸太田町	1959	181.5	3.8	D	トンネル	2023	Ⅱ	2023	Ⅱ	2028								●						○		
82	砂々瀬トンネル	西部建設事務所安芸太田支所	県道中筒賀下線	広島県	安芸太田町	1943	31	3.3	D	トンネル	2023	Ⅲ	2023	Ⅲ	2028	2026	2026	1	剥落防止工				●				□☆		○		
83	八幡トンネル	西部建設事務所安芸太田支所	県道八幡雲耕線	広島県	北広島町	1963	369	6.3	D	トンネル	2023	Ⅱ	2023	Ⅱ	2028								●						○		
84	溝口トンネル	西部建設事務所安芸太田支所	県道溝口加計線	広島県	北広島町	1950	298.7	4.2	D	トンネル	2023	Ⅱ	2023	Ⅱ	2028								●						○		
85	発坂トンネル	西部建設事務所安芸太田支所	国道191号	広島県	安芸太田町	2007	1017	10.8	B	トンネル	2020	Ⅱ	2020	Ⅱ	2025					●					○						
86	新善右衛門トンネル	西部建設事務所安芸太田支所	県道弁財天加計線	広島県	安芸太田町	2024	148	7.0	D	トンネル	-	-	-	-	2026											○					
87	猿鳴隧道	東部建設事務所	県道加茂油木線	広島県	福山市	1969	77	3.5	D	トンネル	2023	Ⅱ	2023	Ⅱ	2028								●						○		
88	新七曲トンネル	東部建設事務所	県道加茂油木線	広島県	福山市	1996	640	8.5	C	トンネル	2023	Ⅱ	2023	Ⅱ	2028								●						○		
89	八田原トンネル	東部建設事務所	県道府中世羅三和線	広島県	府中市	1985	377	6.8	D	トンネル	2023	Ⅱ	2023	Ⅱ	2028								●						○		
90	塚丸トンネル	東部建設事務所	県道府中世羅三和線	広島県	府中市	1986	168	6.9	D	トンネル	2023	Ⅲ	2023	Ⅲ	2028								●						○		
91	六郎木トンネル	東部建設事務所	県道府中世羅三和線	広島県	府中市	1985	197	6.9	D	トンネル	2023	Ⅱ	2023	Ⅱ	2028								●						○		
92	久佐トンネル	東部建設事務所	県道府中世羅三和線	広島県	府中市	1985	273	6.9	D	トンネル	2023	Ⅱ	2023	Ⅱ	2028								●						○		
93	石原トンネル(上り)	東部建設事務所	県道加茂福山線	広島県	福山市	2001	355	11.0	C	トンネル	2022	Ⅱ	2022	Ⅱ	2027							●						○			
94	石原トンネル(下り)	東部建設事務所	県道加茂福山線	広島県	福山市	2001	354	9.5	C	トンネル	2022	Ⅱ	2022	Ⅱ	2027							●						○			
95	室浜隧道	東部建設事務所	県道後山公園洗谷線	広島県	福山市	1974	105	7.6	D	トンネル	2022	Ⅱ	2022	Ⅱ	2027							●						○			
96	阿伏見隧道	東部建設事務所	県道鞆松永線	広島県	福山市	1966	253.1	6.8	D	トンネル	2022	Ⅱ	2022	Ⅱ	2027							●						○			
97	神龍湖トンネル	東部建設事務所	県道三原東城線	広島県	神石高原町	1992	533	7.8	C	トンネル	2021	Ⅲ	2021	Ⅲ	2026	2026	2026	3	剥落防止工		●		■★				○□☆				
98	剣トンネル	東部建設事務所	県道三原東城線	広島県	神石高原町	1994	159	7.8	D	トンネル	2021	Ⅲ	2021	Ⅲ	2026						●		■★				○				
99	相渡トンネル	東部建設事務所	県道三原東城線	広島県	神石高原町	1994	261	7.8	D	トンネル	2021	Ⅱ	2021	Ⅱ	2026						●						○				
100	大滝トンネル	東部建設事務所	県道三原東城線	広島県	神石高原町	1992	83	8.5	D	トンネル	2021	Ⅱ	2021	Ⅱ	2026						●						○				
101	呉ヶ峠隧道	東部建設事務所	県道三原東城線	広島県	神石高原町	1979	73	7.5	D	トンネル	2021	Ⅲ	2021	Ⅲ	2026						●						○				
102	松崎トンネル	東部建設事務所	国道432号	広島県	府中市	1994	455	8.5	C	トンネル	2020	Ⅲ	2020	Ⅲ	2025					●			■★		○						
103	矢多田トンネル	東部建設事務所	国道432号	広島県	府中市	1994	172	8.5	D	トンネル	2020	Ⅲ	2020	Ⅲ	2025					●			■★		○						
104	長者原トンネル	東部建設事務所	県道吉舎油木線	広島県	神石高原町	1927	64.1	4.0	D	トンネル	2022	Ⅱ	2022	Ⅱ	2027							●						○			
105	手入トンネル	東部建設事務所	国道182号	広島県	神石高原町	1988	318	8.5	D	トンネル	2020	Ⅲ	2020	Ⅲ	2025	2026	2026	2	剥落防止工	●			■	★	○		□☆				
106	高岩トンネル	東部建設事務所	国道182号	広島県	神石高原町	1989	130	8.0	D	トンネル	2020	Ⅲ	2020	Ⅲ	2025					●			■	★	○						
107	田川瀬トンネル	東部建設事務所	国道182号	広島県	神石高原町	1983	186	8.6	D	トンネル	2020	Ⅲ	2020	Ⅲ	2025	2026	2026	2	剥落防止工	●		</									

No.	トンネル名	事務所名	路線名	所在地		建設年次	延長(m)	幅員(m)	等級	種別	2巡回診断区分		最新の点検結果		次回点検	令和7年度から令和10年度までの修繕計画				点検・修繕計画										備考
											点検年度	健全度	点検年度	健全度		修繕着手年度	修繕完了年度	概算工事費(100万円)	主な修繕内容	実績					計画					
				2020	2021										2022					2023	2024	2025	2026	2027	2028					
143	鳴瀬清流トンネル	北部建設事務所	国道375号	広島県	三次市	2022	829	10.3	C	トンネル	－	－	2024	Ⅱ	2029						●									
144	亀谷トンネル	北部建設事務所庄原支所	国道432号	広島県	庄原市	1989	84	7.8	D	トンネル	2021	Ⅱ	2021	Ⅱ	2026									○						
145	王居峠トンネル	北部建設事務所庄原支所	国道432号	広島県	庄原市	1997	345	10.0	D	トンネル	2021	Ⅲ	2021	Ⅲ	2026						●	■	★			○				
146	下山トンネル	北部建設事務所庄原支所	国道432号	広島県	庄原市	1992	174	7.8	D	トンネル	2020	Ⅱ	2020	Ⅱ	2025						●				○					
147	須川トンネル	北部建設事務所庄原支所	国道432号	広島県	庄原市	1977	281	7.7	D	トンネル	2021	Ⅲ	2021	Ⅲ	2026							●	■	★			○			
148	田の平トンネル	北部建設事務所庄原支所	国道432号	広島県	庄原市	1978	393	7.1	D	トンネル	2021	Ⅲ	2021	Ⅲ	2026							●	■	★			○			
149	栗石トンネル	北部建設事務所庄原支所	国道432号	広島県	庄原市	1973	661	7.8	C	トンネル	2021	Ⅲ	2021	Ⅲ	2026							●	■	★			○			
150	帝釈トンネル	北部建設事務所庄原支所	県道庄原東城線	広島県	庄原市	1995	206	8.5	D	トンネル	2022	Ⅱ	2022	Ⅱ	2027								●					○		
151	帝釈峡トンネル	北部建設事務所庄原支所	県道三原東城線	広島県	庄原市	1987	129	9.2	D	トンネル	2022	Ⅱ	2022	Ⅱ	2027								●					○		
152	神龍トンネル	北部建設事務所庄原支所	県道三原東城線	広島県	庄原市	1983	108.5	9.3	D	トンネル	2022	Ⅱ	2022	Ⅱ	2027								●					○		
153	畑トンネル	北部建設事務所庄原支所	国道182号	広島県	庄原市	1975	87.6	7.3	D	トンネル	2020	Ⅱ	2020	Ⅰ	2025										○					
154	西城トンネル	北部建設事務所庄原支所	国道183号	広島県	庄原市	1989	220	8.5	D	トンネル	2020	Ⅱ	2020	Ⅱ	2025										○					
155	小島原トンネル	北部建設事務所庄原支所	国道183号	広島県	庄原市	1994	170	8.5	D	トンネル	2020	Ⅱ	2020	Ⅱ	2025										○					
156	梶谷トンネル	北部建設事務所庄原支所	国道314号	広島県	庄原市	1982	120	8.7	D	トンネル	2019	Ⅱ	2024	Ⅱ	2029									●						
157	皿谷トンネル	北部建設事務所庄原支所	国道314号	広島県	庄原市	1982	88	8.6	D	トンネル	2020	Ⅱ	2020	Ⅱ	2025										○					
158	東城トンネル	北部建設事務所庄原支所	国道314号	広島県	庄原市	1993	635.8	8.5	C	トンネル	2019	Ⅱ	2024	Ⅱ	2029									●						
159	七ヶ所山トンネル	北部建設事務所庄原支所	国道314号	広島県	庄原市	1987	276.8	8.8	D	トンネル	2019	Ⅲ	2024	Ⅱ	2029									●						
160	丑之河トンネル	北部建設事務所庄原支所	県道新市七曲西城線	広島県	庄原市	2001	715	6.0	C	トンネル	2022	Ⅱ	2022	Ⅱ	2027												○			
161	川西トンネル	北部建設事務所庄原支所	国道183号(江府三次道路)	広島県	庄原市	2006	274	9.5	D	トンネル	2019	Ⅰ	2024	Ⅰ	2029									●						
162	七谷ロックシェッド	北部建設事務所	県道甲田作木線	広島県	安芸高田市	1973	72	6.5	D	シェッド	2022	Ⅲ	2022	Ⅲ	2027									●				○		
163	弥栄洞門（1－2）	西部建設事務所廿日市支所	国道186号	広島県	大竹市	1999	26	9.6	D	シェッド	2021	Ⅱ	2021	Ⅱ	2026									●				○		
164	弥栄洞門（2－3）	西部建設事務所廿日市支所	国道186号	広島県	大竹市	2003	40	9.6	D	シェッド	2021	Ⅱ	2021	Ⅱ	2026									●				○		
165	栗栖洞門	西部建設事務所廿日市支所	国道186号	広島県	廿日市市	1999	51	8.7	D	シェッド	2021	Ⅱ	2021	Ⅱ	2026									●				○		
166	弥栄洞門（3－4）	西部建設事務所廿日市支所	国道186号	広島県	大竹市	2007	17	9.6	D	シェッド	2021	Ⅱ	2021	Ⅱ	2026									●				○		
167	本三坂トンネル	西部建設事務所安芸太田支所	県道浜田八重可部線	広島県	北広島町	1933	183	8.4	D	シェッド	2022	Ⅲ	2022	Ⅲ	2027	2023	2026	350	当て板補修、塗装塗替工				●	■			☆	○		
168	八神洞門	西部建設事務所安芸太田支所	国道186号	広島県	北広島町	1992	170	7.5	D	シェッド	2021	Ⅱ	2021	Ⅱ	2026									●				○		
169	王泊防雪トンネル	西部建設事務所安芸太田支所	国道186号	広島県	北広島町	1979	160	7.0	D	シェッド	2021	Ⅲ	2021	Ⅲ	2026									●	★			○		
170	滝山洞門（上）	西部建設事務所安芸太田支所	国道186号	広島県	北広島町	1984	241	7.0	D	シェッド	2021	Ⅱ	2021	Ⅱ	2026									●				○		
171	滝山洞門（下）	西部建設事務所安芸太田支所	国道186号	広島県	北広島町	1984	79	7.0	D	シェッド	2021	Ⅱ	2021	Ⅱ	2026									●				○		
172	下山防雪トンネル	西部建設事務所安芸太田支所	国道186号	広島県	北広島町	1975	92	7.5	D	シェッド	2021	Ⅲ	2021	Ⅲ	2026	2020	2028	400	塗装塗替工	■	●						○		☆	
173	黒滝洞門	西部建設事務所安芸太田支所	国道186号	広島県	安芸太田町	1990	45	7.0	D	シェッド	2021	Ⅱ	2021	Ⅱ	2026									●				○		
174	後平洞門	西部建設事務所安芸太田支所	国道186号	広島県	安芸太田町	1990	100	7.1	D	シェッド	2021	Ⅱ	2021	Ⅱ	2026									●				○		
175	八幡防雪トンネル（上）	西部建設事務所安芸太田支所	県道八幡雲耕線	広島県	北広島町	1963	17	6.5	D	シェッド	2023	Ⅲ	2023	Ⅲ	2028	2025	2027	280	当て板補修、塗装塗替工					●			□		☆	○
176	八幡防雪トンネル（下）	西部建設事務所安芸太田支所	県道八幡雲耕線	広島県	北広島町	1963	60	6.5	D	シェッド	2023	Ⅲ	2023	Ⅲ	2028	2023	2026	170	当て板補修、塗装塗替工					●■			☆		○	
177	津浪洞門	西部建設事務所安芸太田支所	国道191号	広島県	安芸太田町	2003	245	10.5	D	シェッド	2020	Ⅱ	2020	Ⅱ	2025									●				○		
178	杉ノ泊防雪トンネル	西部建設事務所安芸太田支所	県道弁財天加計線	広島県	安芸太田町	不明	130	7	D	シェッド	2021	Ⅱ	2021	Ⅱ	2026									●				○		
179	南雨洞門	北部建設事務所	県道三次高野線	広島県	三次市	2003	79.5	6.8	D	シェッド	2022	Ⅱ	2022	Ⅱ	2027										●			○		
180	君田洞門	北部建設事務所	県道三次高野線	広島県	三次市	1979	50	6.8	D	シェッド	2022	Ⅱ	2022	Ⅱ	2027										●			○		
181	第二南雨洞門	北部建設事務所	県道三次高野線	広島県	三次市	2005	54	6.8	D	シェッド	2022	Ⅱ	2022	Ⅱ	2027										●			○		
182	名倉洞門	北部建設事務所庄原支所	国道182号	広島県	庄原市	1976	42	7.0	D	シェッド	2020	Ⅱ	2020	Ⅱ	2025									●			○			
183	久代洞門	北部建設事務所庄原支所	国道182号	広島県	庄原市	2007	69	7.0	D	シェッド	2020	Ⅱ	2020	Ⅱ	2025									●			○			

別紙 構造物ごとの一覧表（門型標識等）

No.	施設名	事務所名	路線名	所在地		建設年次	幅員(m)	最新の点検結果		次回点検	令和7年度から令和10年度までの修繕計画				点検・修繕計画								備考
								点検年度	健全度						○：定期点検(予定), □:修繕着手(予定), ☆：修繕完了(予定) ●：定期点検済, ■:修繕着手済, ★：修繕完了済								
				県名	市町名					2020					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	M0025	西部建設事務所	矢野安浦線	広島県	熊野町	1990	24.0	2024	Ⅱ	2029						●							
2	M0026	西部建設事務所	矢野安浦線	広島県	熊野町	1990	28.0	2024	Ⅱ	2029						●							
3	M0001	西部建設事務所呉支所	県道瀬野呉線	広島県	呉市	1984	7.3	2020	Ⅱ	2025					●			○					
4	M0021	西部建設事務所廿日市支所	県道大竹湯来線	広島県	大竹市	2003	12.0	2020	Ⅱ	2025					●			○					
5	M0003	西部建設事務所安芸太田支所	国道191号	広島県	安芸太田町	1987	10.9	2020	I	2025					●			○					
6	M0005	西部建設事務所安芸太田支所	国道191号	広島県	安芸太田町	1997	8.6	2020	Ⅱ	2025					●			○					
7	M0013	西部建設事務所安芸太田支所	県道安佐豊平芸北線	広島県	北広島町	1998	10.5	2020	Ⅱ	2025					●			○					
8	M0007	西部建設事務所東広島支所	国道375号	広島県	東広島市	1990	7.5	2020	Ⅱ	2025					●			○					
9	M0014	西部建設事務所東広島支所	県道広島空港線	広島県	東広島市	1992	14.8	2020	Ⅱ	2025					●			○					
10	M0022	西部建設事務所東広島支所	国道375号	広島県	東広島市	不明	16.4	2020	Ⅱ	2025					●			○					
11	M0023	東部建設事務所	国道182号	広島県	福山市	不明	28.0	2020	Ⅲ	2025					●	■	★	○					
12	M0008	東部建設事務所三原支所	国道185号	広島県	三原市	1994	7.3	2020	Ⅱ	2025					●			○					
13	M0010	東部建設事務所三原支所	国道184号	広島県	世羅町	1990	8.6	2020	Ⅱ	2025					●			○					
14	M0011	東部建設事務所三原支所	国道184号	広島県	世羅町	1990	8.6	2020	Ⅱ	2025					●			○					
15	M0015	東部建設事務所三原支所	県道広島空港線	広島県	三原市	1992	14.8	2020	Ⅱ	2025					●			○					
16	M0016	東部建設事務所三原支所	国道184号	広島県	尾道市	不明	13.0	2020	Ⅱ	2025					●			○					
17	M0017	東部建設事務所三原支所	国道2号	広島県	尾道市	1972	14.3	2020	Ⅱ	2025					●			○					
18	M0019	東部建設事務所三原支所	国道184号	広島県	尾道市	不明	13.0	2020	Ⅱ	2025					●			○					
19	M0012	北部建設事務所	国道183号	広島県	三次市	1990	9.8	2020	Ⅱ	2025					●			○					
20	M0020	北部建設事務所	国道183号	広島県	三次市	1994	19.0	2020	Ⅲ	2025					●	■	★	○					
21	M0024	北部建設事務所	国道183号	広島県	三次市	不明	19.0	2020	Ⅱ	2025					●			○					
